

Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на поканата за поднесување на понуди за доделување на договор за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел 1. Информации за понудувачот

1.1. Име на понудувачот: __ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Валандово__

1.2. Контакт информации:

- Адреса: __Маршал Тито бр ББ Валандово__
- Телефон: __077 558 037__
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: __Роберт Исиров__

1.3. Одговорно лице:


__Аристотел Исиров__

1.4. Даночен број: __4003006105207__

Дел 2. Финансиска понуда

2.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за: **ДЕЛ 1 / 2 / 3 (соодветно да се пополни)**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, за за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** __15396500 [со бројки] (__ петнаесет милиони тистотини деведесет и шест илјади и петстотини денари __) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува __2771370__ денари.

2.2 Ги прифаќаеме начинот на плаќање и рокот на реализација на предметот на набавка утврдени во тендерската документација.

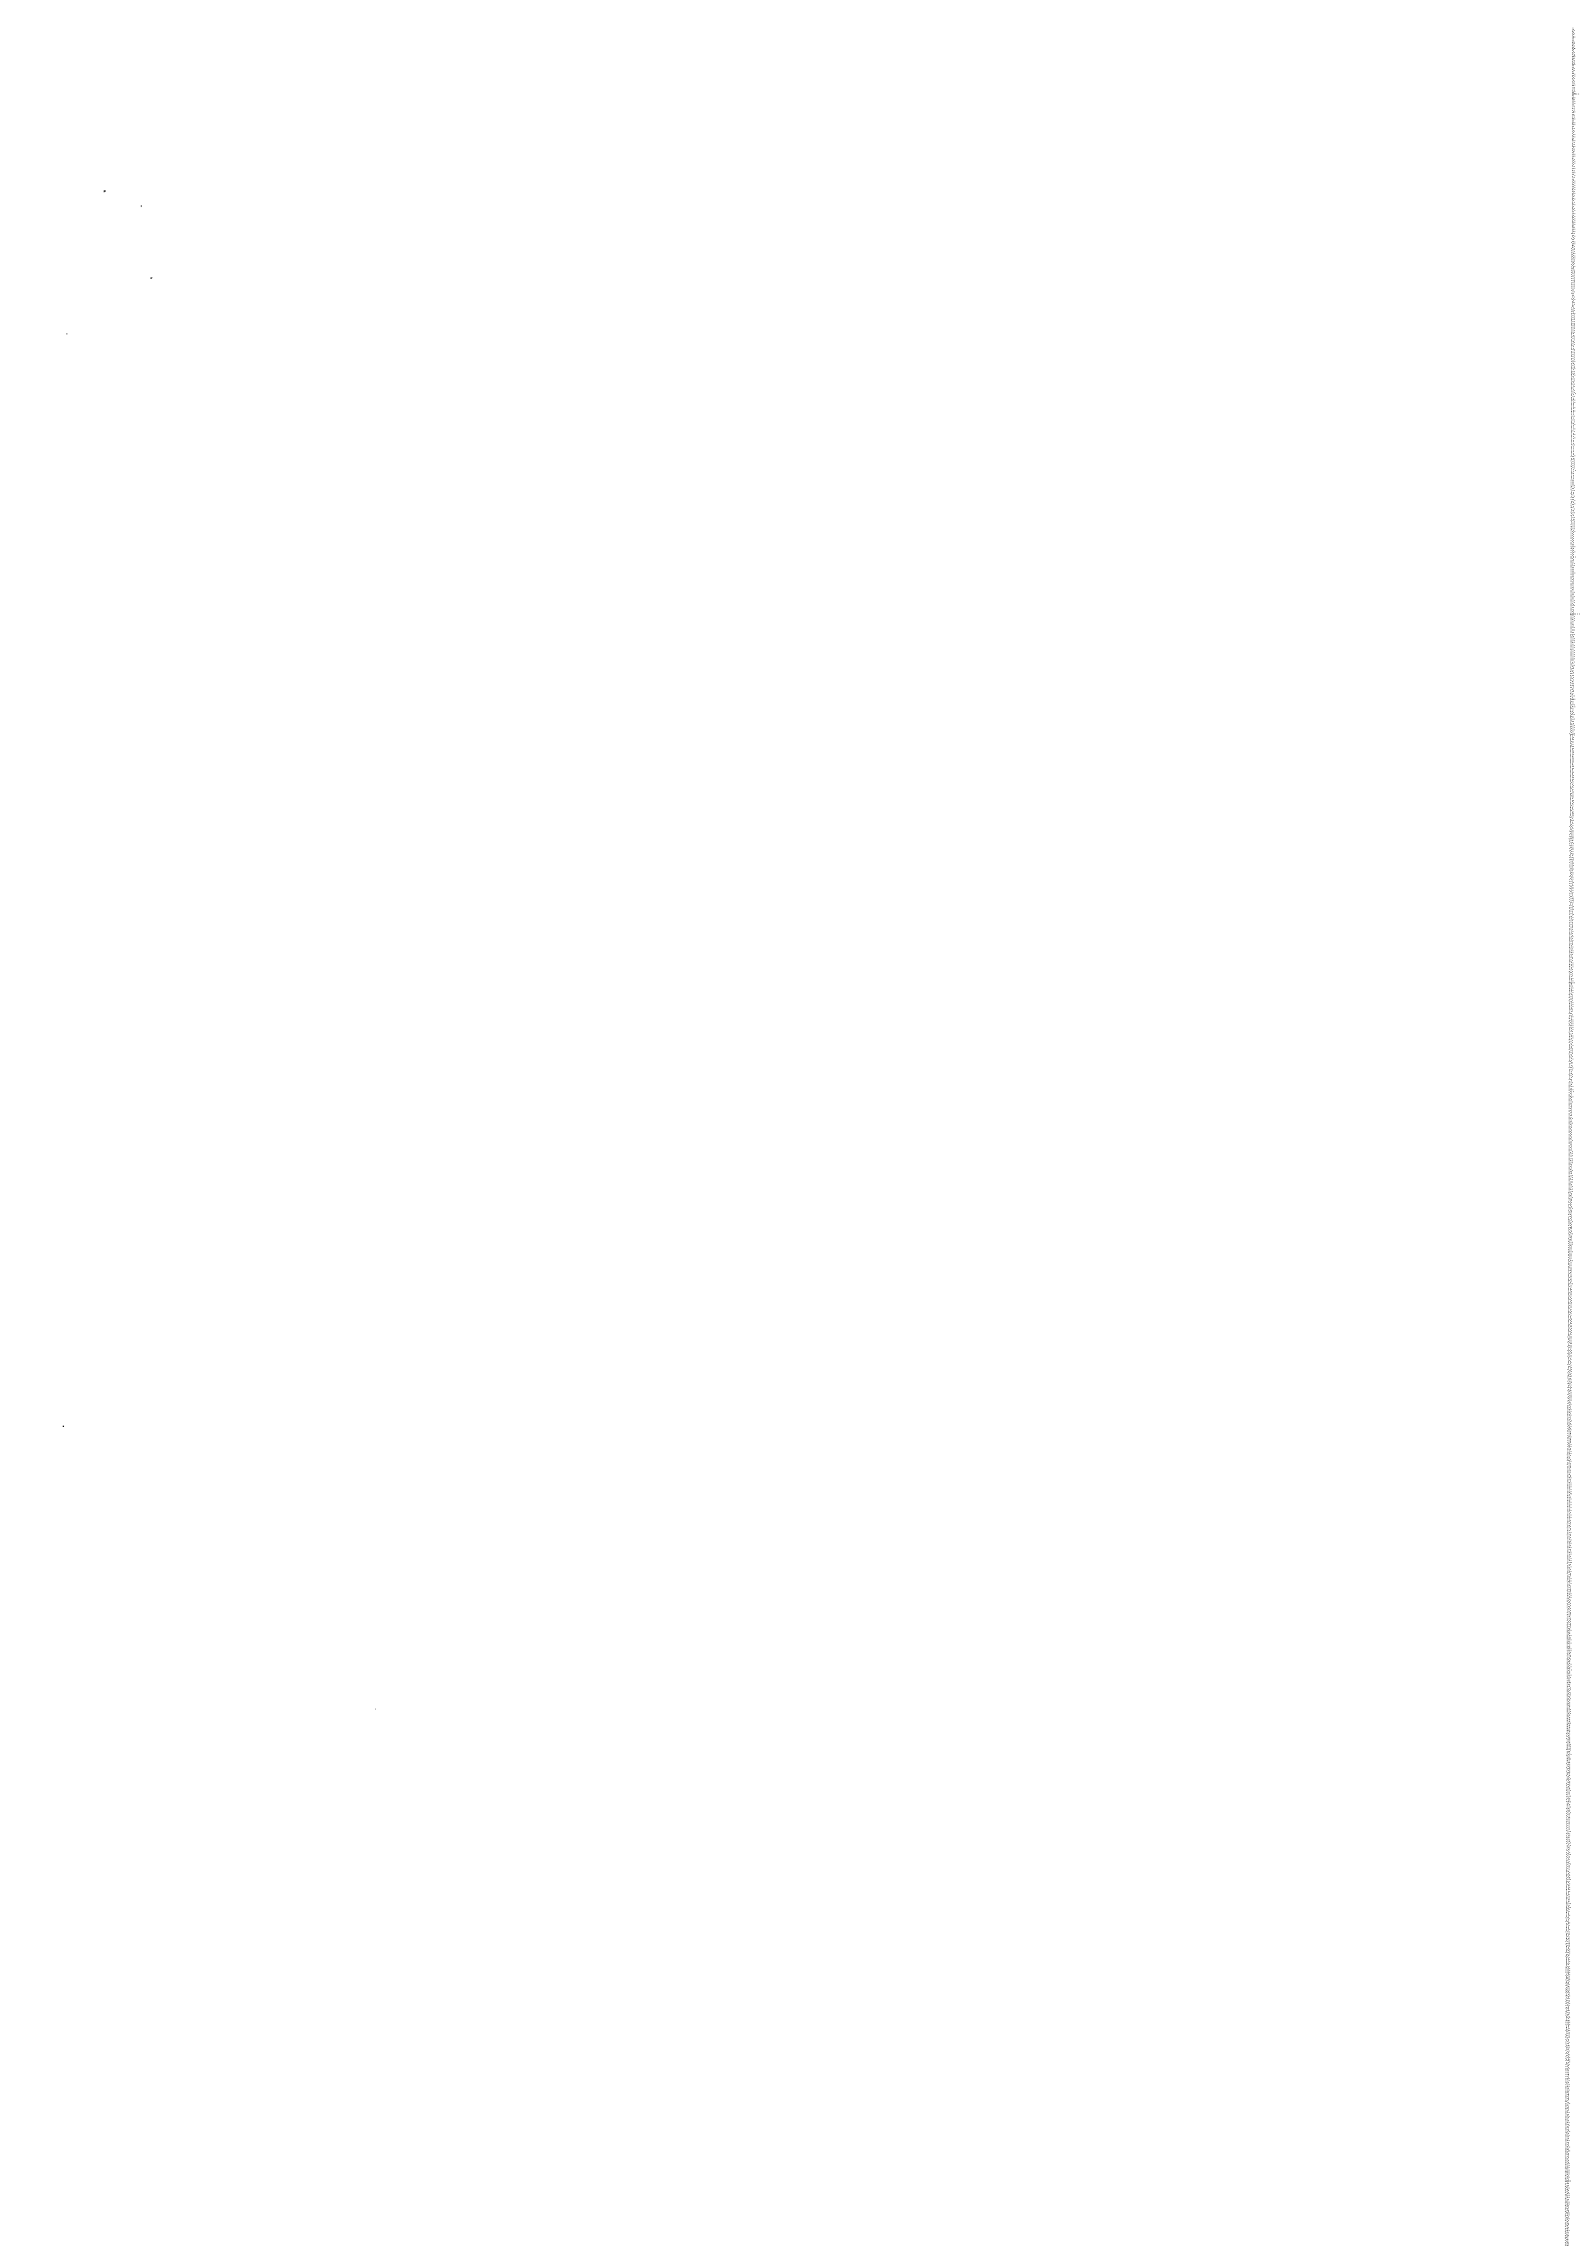

Дел 3. Рок на важност на понудата: 30 дена

На преговорите што ќе ги закаже договорниот орган, понудувачот ќе го претставува лицето:
_____ Роберт Исиров _____, тел _____ 077 558 037 _____.

Дел 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

ПРИЛОГ: (Документите што се приложуваат кон понудата)


Со финансиската понуда задолжително се доставуваат и:

- документи за регистрирана дејност
- изјава за сериозност на понудата

--	--

Makedonski
Telekom CA,
Aristotel Isirov

Digitally signed by
Makedonski Telekom
CA, Aristotel Isirov
Date: 2020.04.09
09:21:07 +02'00'

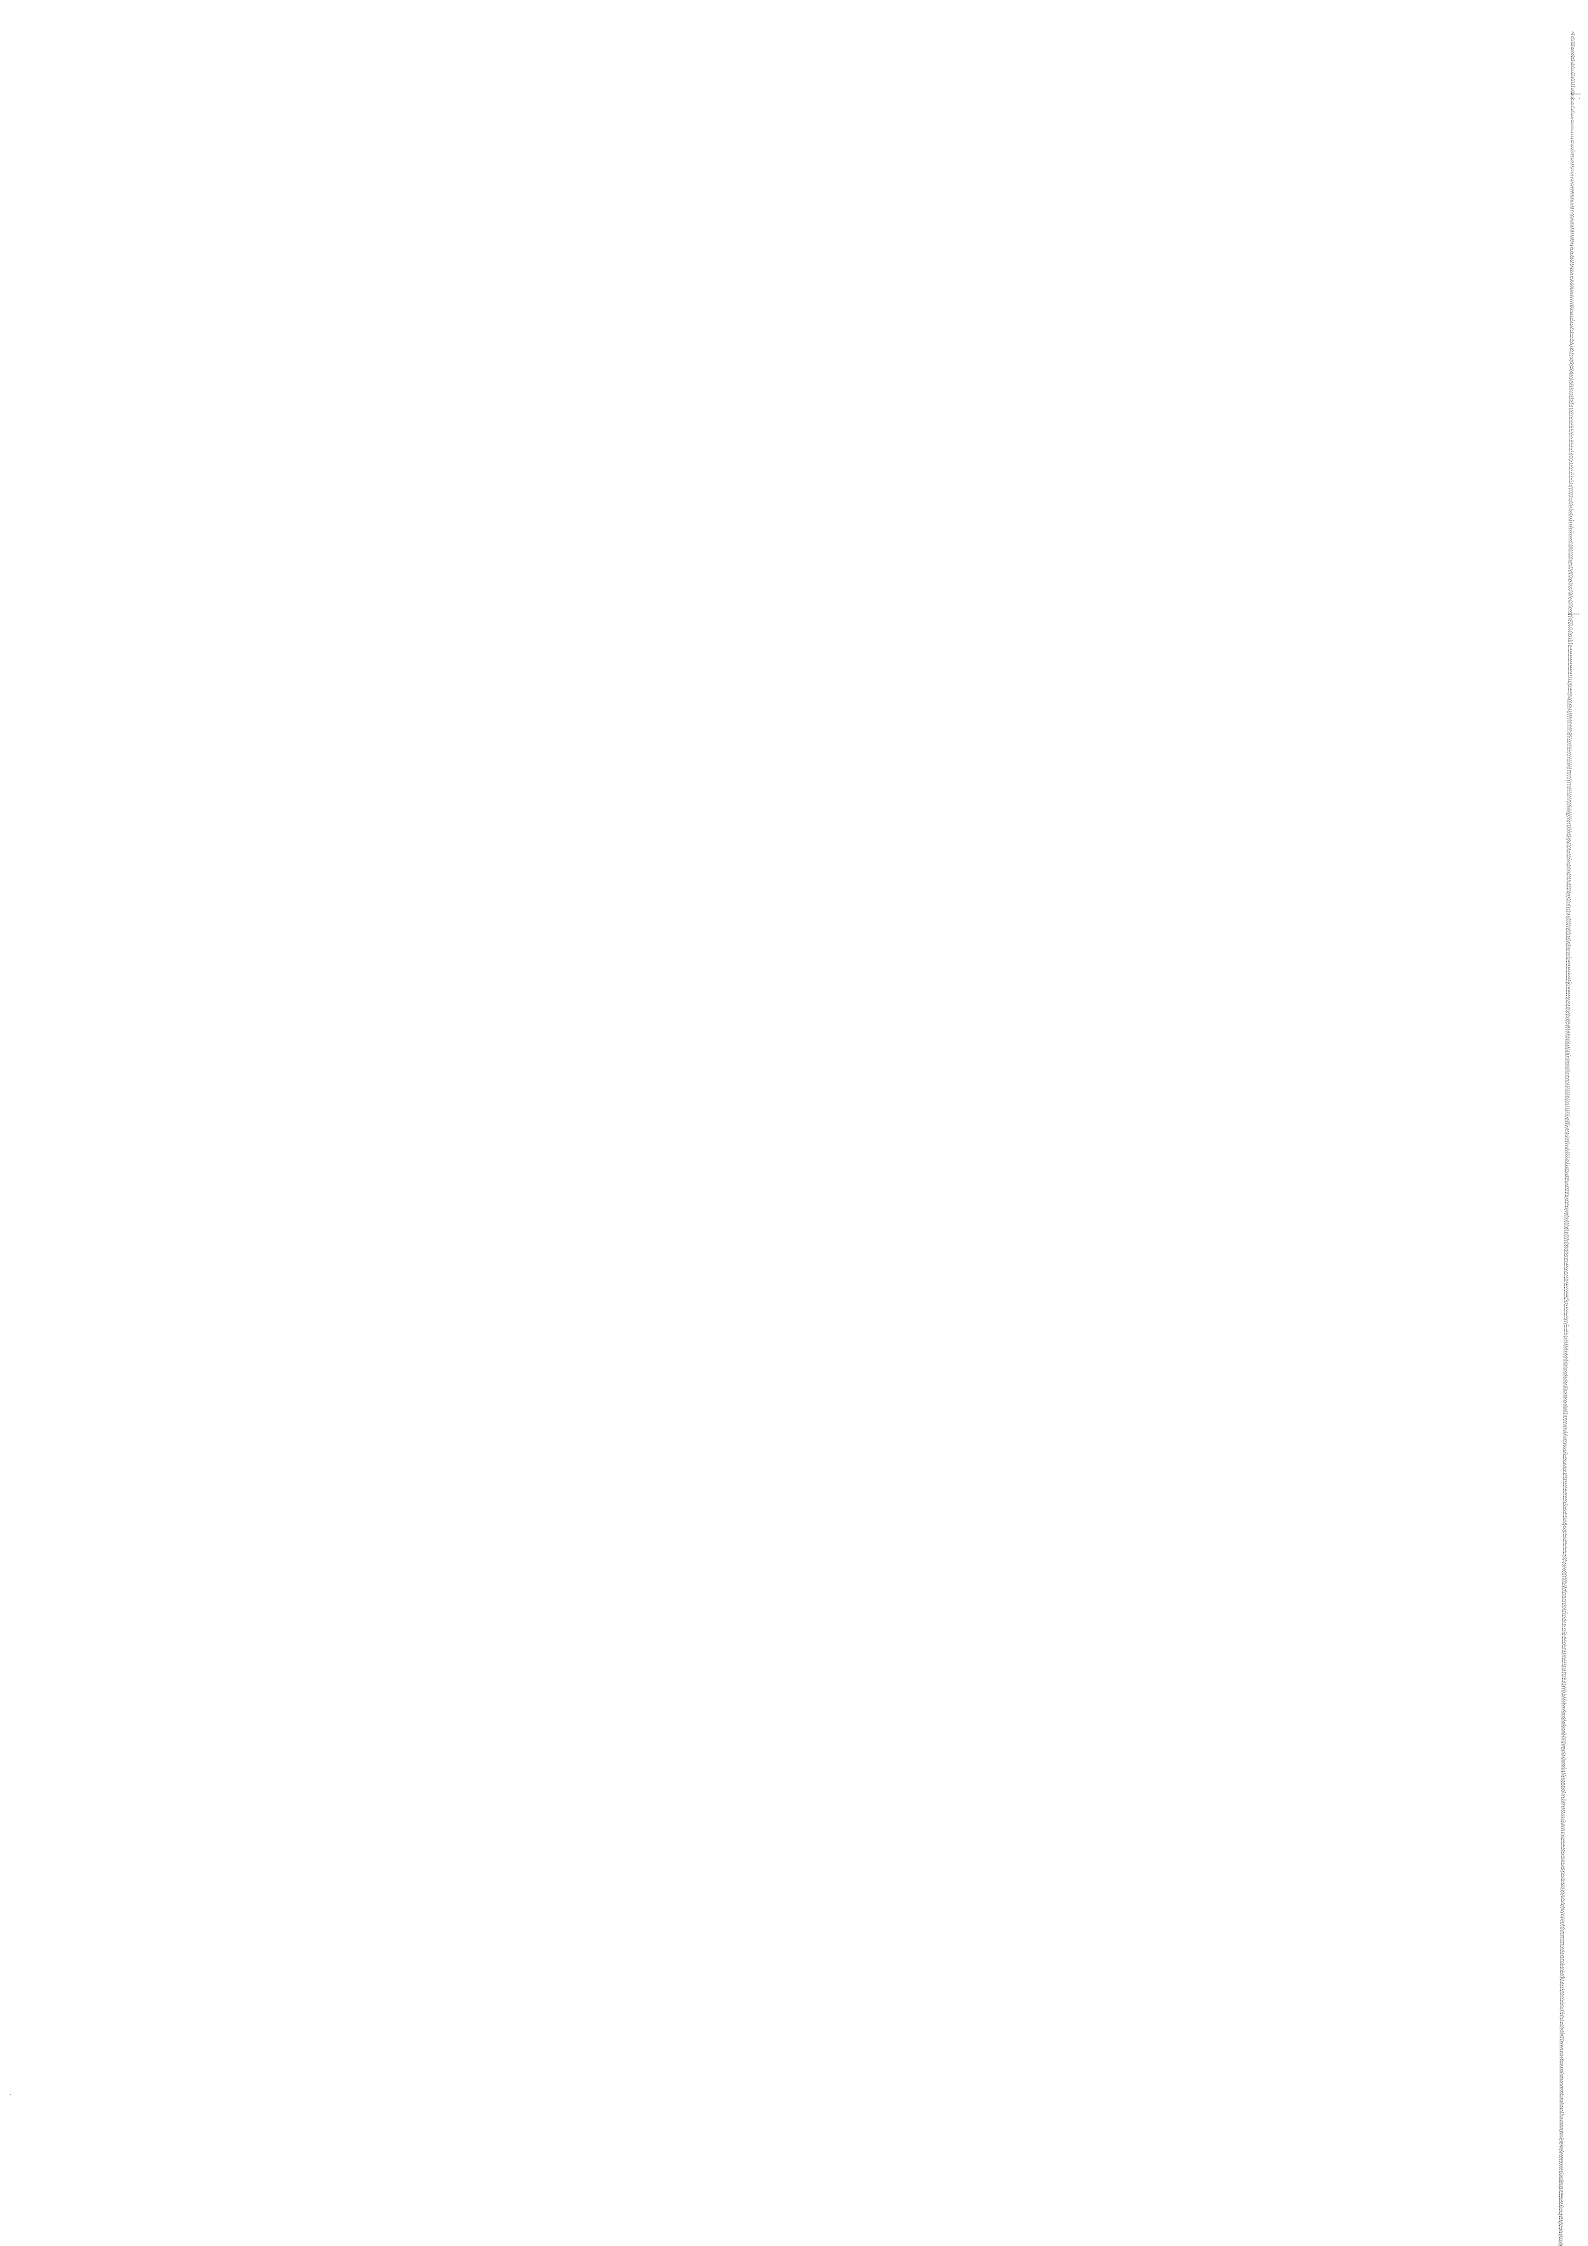

ПРИЛОГ 3 - Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот ___Аристотел Исиров___ [име и презиме], врз основа на член 101 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот _ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Валандово_, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 101 став 7 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум


___9,04,2020___

Овластено лице

___Аристотел Исиров___

Makedonski
Telekom CA,
Aristotel Isirov

Digitally signed by
Makedonski Telekom
CA, Aristotel Isirov
Date: 2020.04.09
09:20:05 +02'00'

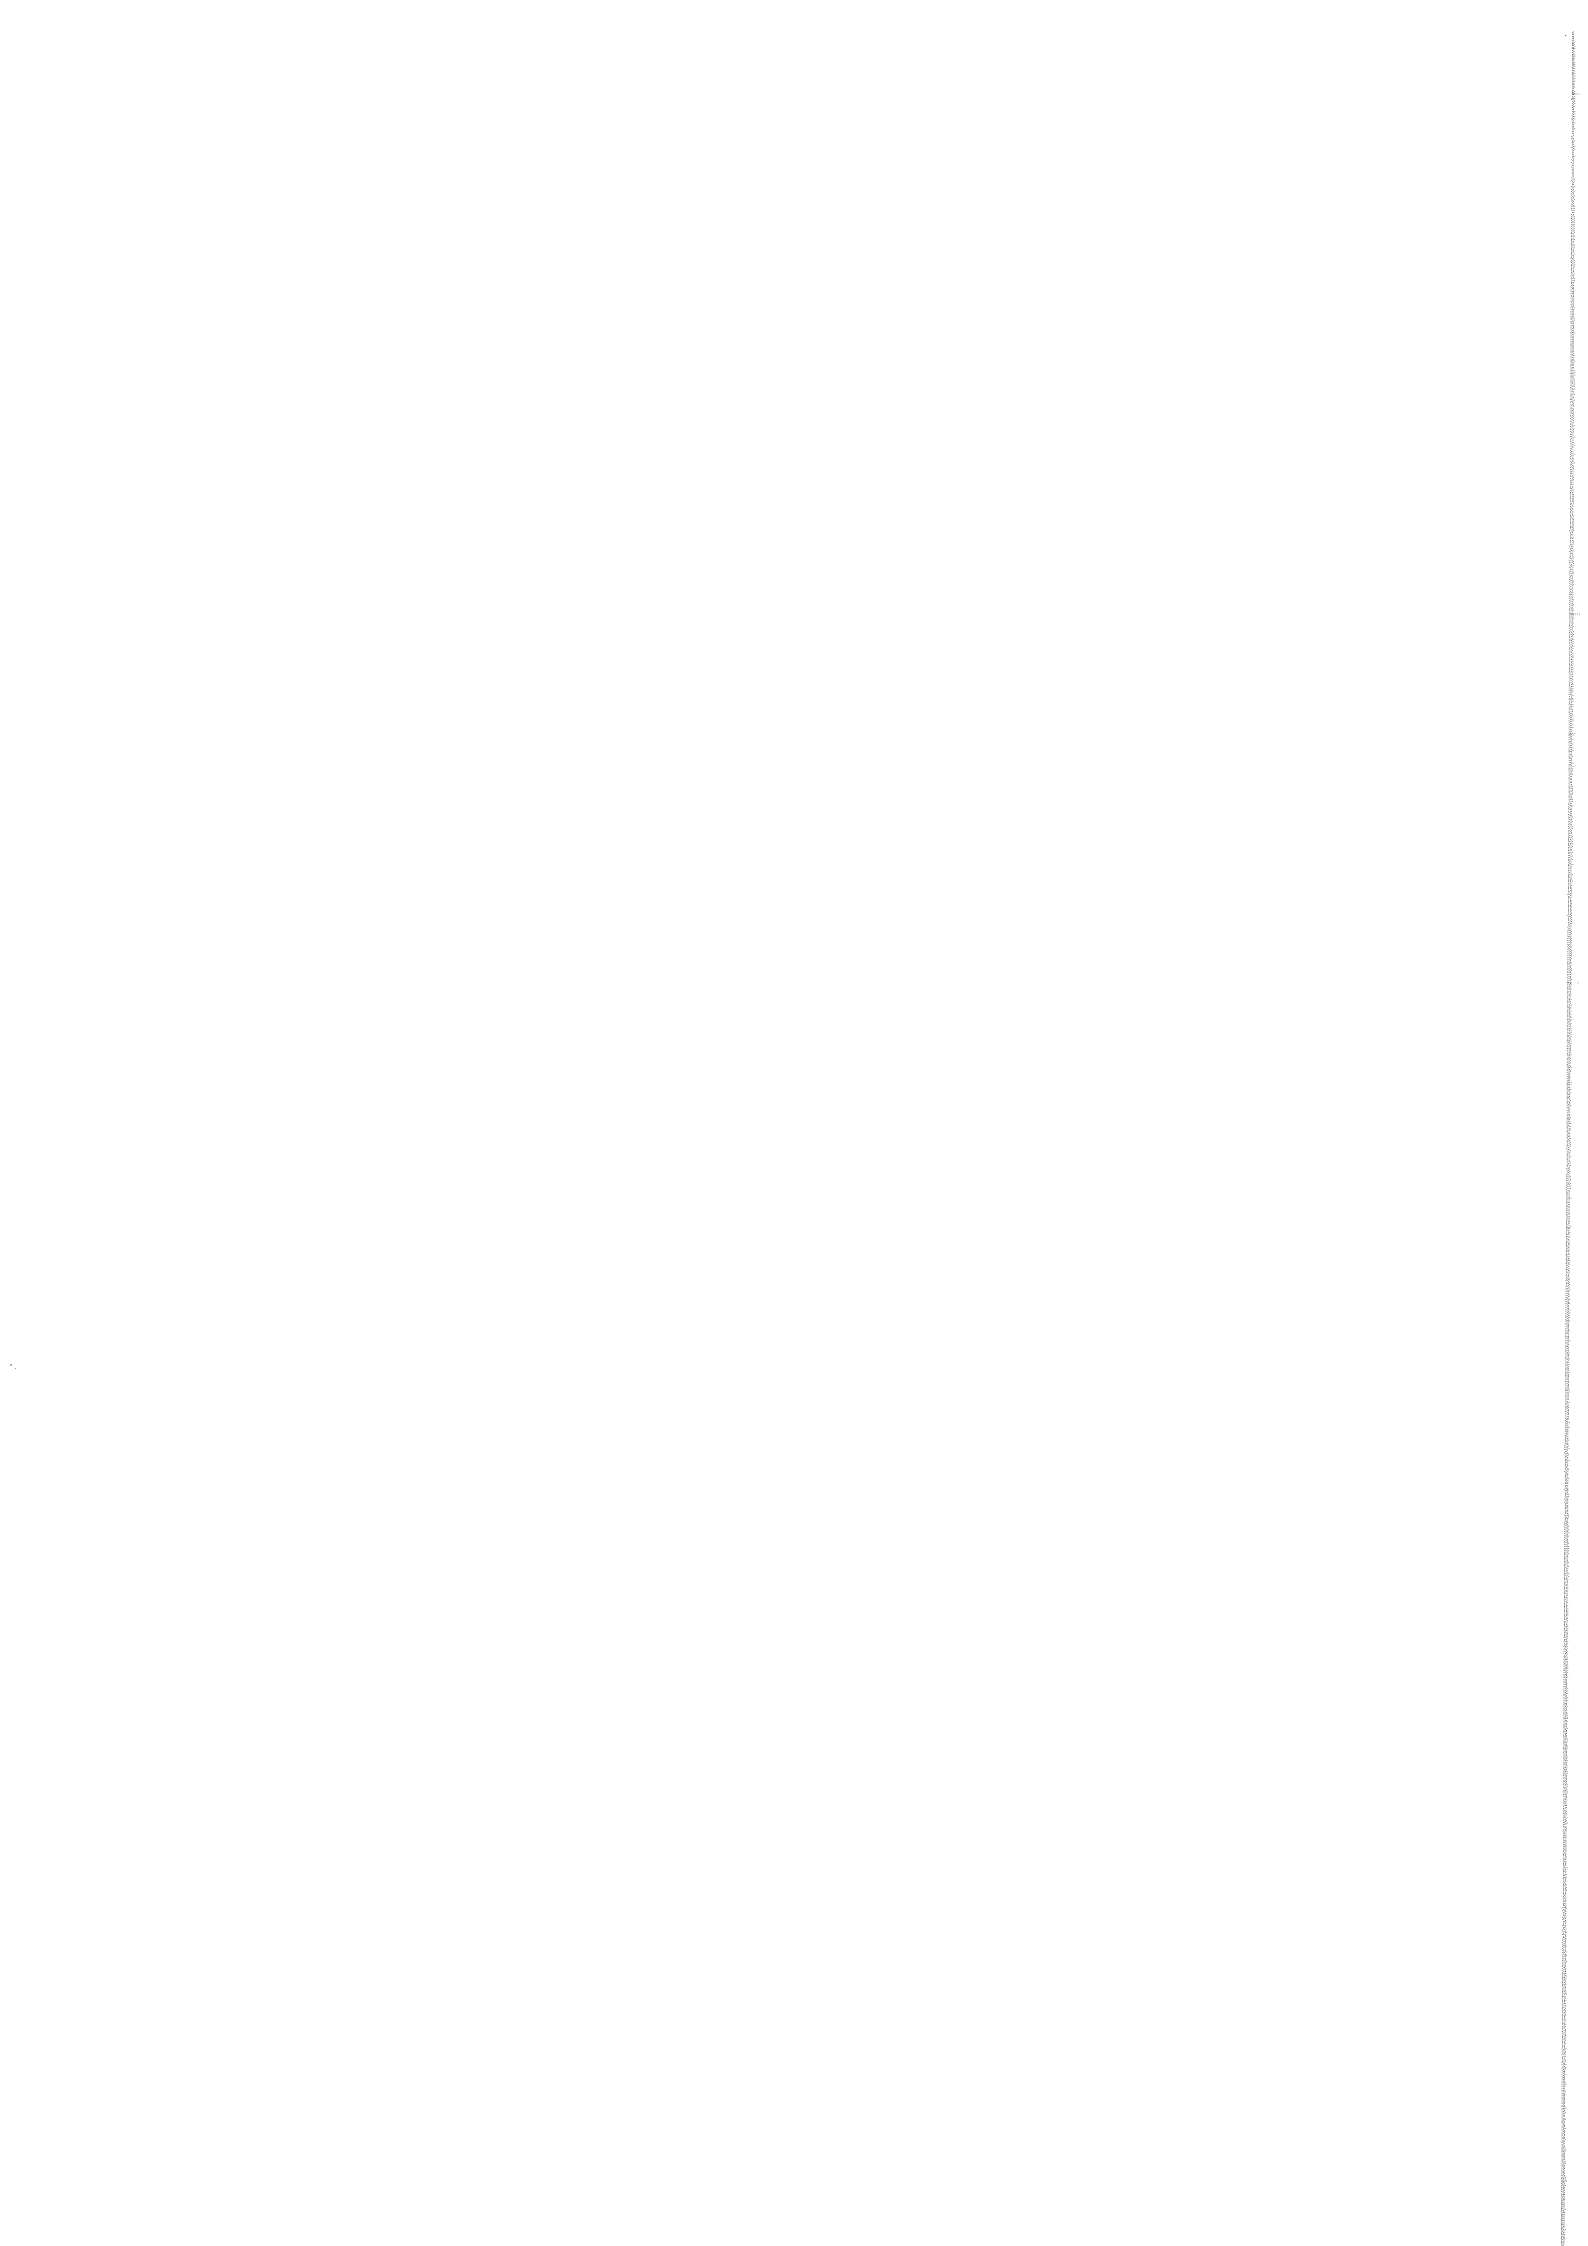

Број: 0809-50/152520200000139
Датум и време: 7.4.2020 г. 10:55:04

Makedonski Telekom CA,
Aristotel Isirov
Digitally signed by Makedonski Telekom CA, Aristotel Isirov
Date: 2020.04.09 09:59:57 +02'00'

ПОТВРДА
за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6101577
Назив:	Друштво за производство градежништво трговија и услуги ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ увоз-извоз Валандово
Седиште:	МАРШАЛ ТИТО 66 ВАЛАНДОВО, ВАЛАНДОВО

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	43.99 - Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема


Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.


Изготвил:





Овластено лице:



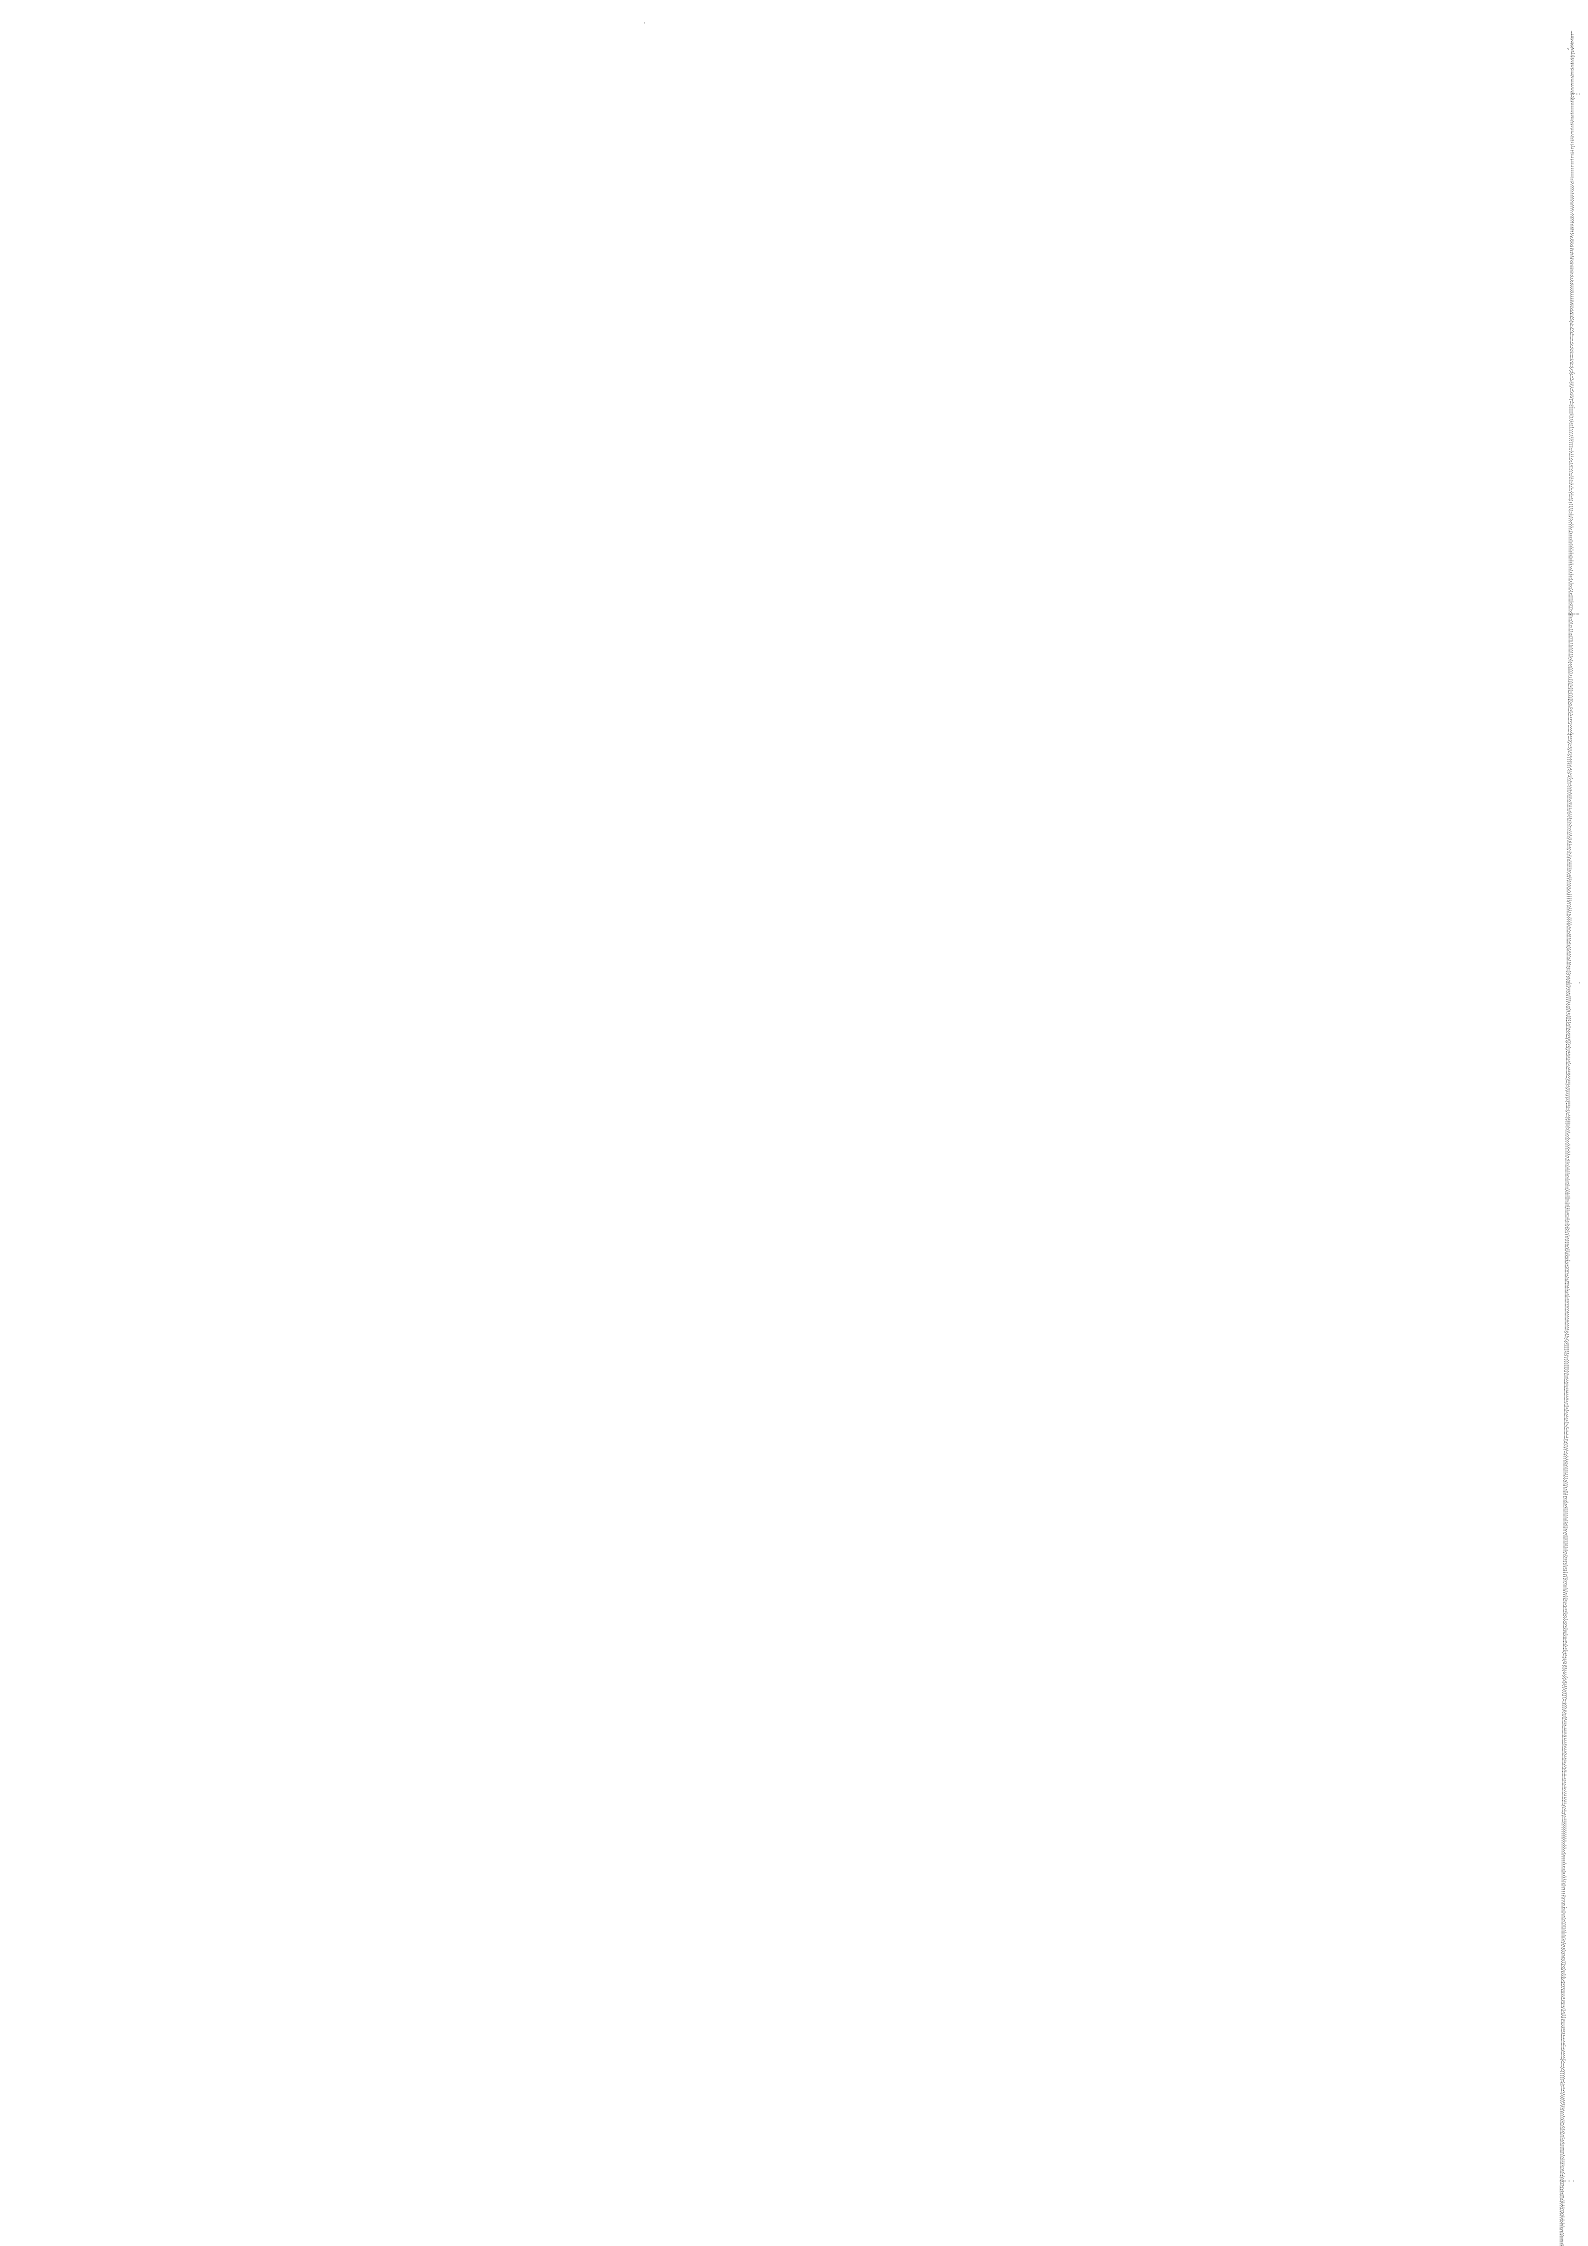

- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм
- Изработени од еколошки зидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм, надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43U(W/m2K) RAL 9002/9002.

• Внатрешни кабини сендвич панел PUR зид најмалку 40мм.

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
 - Цементни (Betolur) табии 20мм
 - ПВЦ под
 - Комплетна инсталација
 - 3 LED осветлувања x 18w
 - 1 Прекинувач
 - 2 Монофазни напредни приклучоци
 - Разводна ПВЦ табла за монтажа на зид со минимум 3 автомобилски осигурачи
 - Доводна IP табла
- Толер со 4 кабин и тоа:**

- 3 Вд- кабин опремени со толетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
 - 3 Миралници
 - 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
 - 1 туш кабина комплет со батерија и ситот потребен врзен материјал
 - Довод
 - Олов
 - ПВЦ цевки
 - Електричен Бојлер 80л
 - Конвекторски панел за загревање 2KW
- или еквивалентни
- Конструкција:** Челично жетезо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009
- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект минимум 3мм

- **Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект** – (веле со туш кабин и тоалети - ПИИ 2) – клуч на рака со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контрмерите да се отркени со:

- Кровна конструкција (елноводен кров) или во зависност од модуларната поставеност

Кровни ребрасти панел (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0.4мм надворешно 0.4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0.43 U(W/m2K) RAL 9002/9002

- 1 ПВЦ - везна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“
- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саке“
- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм.

Изработени од еколошки зидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм, надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43U(W/m2K) RAL 9002/9002.

• Внатрешни кабини сендвич панел PUR зид најмалку 40мм

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
 - Цементни (Betolur) табии 20мм
 - ПВЦ под
 - 3 LED осветлувања x 18w
 - 1 Прекинувач
 - 2 Монофазни напредни приклучоци
 - Разводна ПВЦ табла за монтажа на зид со минимум 3 автомобилски осигурачи
 - Доводна IP табла
- Толер со 4 кабин и тоа:**

- 2 Вд- кабин опремени со толетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
 - 3 Миралници
 - 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
 - 2 туш кабин комплет со батерија и ситот потребен врзен материјал
 - Довод
 - Олов
 - ПВЦ цевки
 - Електричен Бојлер 80л
 - Конвекторски панел за загревање 2KW
- или еквивалентни

- **Конструкција:** Челично жетезо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009
- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажн објект минимум 3мм

- **Изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект** – (медицински персонал) – клуч на рака со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“
- 1 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1400мм

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002.

Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Бетонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 2 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Климатизација-инвертер сплит систем 2,5KW

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажаен објект 3мм

- **Изработка трансपोर्ट и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модулари монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност - Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 2 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“ комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2/900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков

ПРИЛОГ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Согласно одлуките на Влада на Република Северна Македонија за мерки и препораки за заштита и превенција од Коронавирус COVID-19, а поради зголемување на бројот на заболени лица се јавува потреба од предвидување на нови болнички капацитети за згрижување на заболени лица. Министерството за здравство има потреба од набавка – прибирање на понуди за **Монтажни контејнери за употреба на здравствениот систем**, кои ќе се поставуваат во непосредна близина на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби при Универзитетскиот Клинички комплекс „Мајка Тереза“ во Скопје и во согласност со Извадок од Најрт-законикот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година. („Точка 10“). За таа цел, планирана е лесна, брза и монтажа изградба на медицински капацитети – болничко сместување со просторија за медицински персонал и згрижување со медицински третман на заболени лица од Коронавирус COVID-19.

Локацијата на која е предвидено поставување на модулите за монтажаен објект – контејнери, претходно на подлогата е поставено шпунџак и истата е нивелирана со тампон.

На локацијата ќе биде обезбеден приклучок на водоводна и канализациона мрежа и приклучок кон електро дистрибутивната мрежа заради потребите од снабдување со електрична енергија.

Со поставувањето на модулариите монтажаен објекти – контејнери се предвидува да се добие обезбеден простор за:

- (канцелариски) – за потребите на медицински персонал;
- сместувачки капацитет – болнички кревети;
- тоалети со туш кабини;
- ходник; и
- „топла врска“

Во прилог е даден: графички цртеж со просторно решение и диспозиција на модулите.

Технички карактеристики:

ДЕЛ 1.

- **Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажаен објект** – (вече со туш кабини – тоалети-ТИП 1.) - клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) или во зависност од модуларната поставеност
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“
- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саке“.

ПРИЛОГ 3 - Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, дополнителниот _____Аристотел Исиров _____ [име и презиме], врз основа на член 101 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот „ДБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Веландово“, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 101 став 7 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чija сметка сум овластен да ја давам оваа изјава.

Место и датум _____

Овластено лице _____

_____, 9.04.2020 _____

_____, Аристотел Исиров _____

- 13 ПВЦ - еднокрилни прозори со термоман стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PVC) најмалку 40мм кон заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лине" и наворешно фасадно "лине". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм наворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмалку 0.43 W/(m·K) RAL 9002/9002.

Поп:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм, 100мм x 20мм x 3мм, 80мм x 50мм x 3мм, 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Ветолур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 12 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Раводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурани
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009.

• Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм
Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2550мм/ должина 41000мм - директно/апативно. Поставаеност на коридорот и поврзување со објектите е далечно во склади прилог на техничките спецификации.

***Начин на испорака за ДЕЛ 1 – во рок од 5-10 календарски дена од потпишување на договор.**
Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба.

ДЕЛ 1.

Ред. Бр.	ОПИС	Единична цена (денари)	Количина/ Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- ТИП 1	420500	4	1682000	302760	1984760
2	Монтажен објект - ТИП 2	420500	2	841000	151380	992380
3	Монтажен објект медицински персонал	190000	3	570000	102600	672600

4	Топла врска-коридор 41м	1070000	1070000	1	1070000	192600	1262600
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ							
							4912340

ДЕЛ 2.

1. Изработка, транспорт и монтаж на монтажен објект – (сместувачки) – клуч на рака-димензи: должина 6000 мм – ширина 7200 мм и висина 2600 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да бидат опремени со:

Кровна конструкција (двоен кров) ±100мм

- Кровни ребрasti панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- Олуци
- 1 ПВЦ- врата без праг 1050 мм – 2050мм исполна панел „сакс“
- 2 ПВЦ – двокрилни со термоман стакло, 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 1400мм-1400мм

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-4 0мм-3мм
- Цементни (Бетонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 ЛЕД светла x 18w
- 1 Преклучувач
- 6 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок – клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурани
- Доводна IP табла
- Инвертер сплит ситем за климатизација – 3,5 KW

или еквивалентни

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премакнато со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или „еквивалент“, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтаж објект најмалку 3мм

Дел 3. Рок на важност на понудата: 30 дена

На преговорите што ќе ги закаже договорниот орган, понудувачот ќе го претставува лице: **Роберт Исиров**, тел. **077 558 037**.

Дел 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

ПРИЛОГ: (Документите што се приложуваат кон понудата)

Со финансиската понуда задолжително се доставуваат и:

- документи за регистрирана дејност
- изјава за сериозност на понудата

ПРИЛОГ 2

Образец на понуда

(внесорнодух на понудувачот)

Врз основа на поканата за поднесување на понуди за должување на договор за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со поставка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итноост** и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел 1. Информации за понудувачот

1.1 Име на понудувачот: БТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Валањово _____

1.2 Контакт информации:

- Адреса: Марица Тито бр БВ Валањово _____
- Телефон: 077 558 037 _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: Роберт Исиров _____

1.3 Одговорно лице:

_____ Аристотел Исиров _____

1.4 Даночен број: 4003006105207 _____

Дел 2. Финансиска понуда

2.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за: **ДЕП 1 / 2 / 3 (соодветно да се пополни)**, вклучувајќи ги сите прошоци и попусты, без ДДВ, за да јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со поставка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итноост** 15396500 *Јако бр/к/л/* (_____ летнасмет милиони тисотини деведесет и шест илјади и петстотини денари _____) *Јако бр/к/л/* денари.
Вкупниот износ на ДДВ внесува 2771370 денари.

2.2 Ги прифаќаме начинот на плаќање и рокот на реализација на предметот на набавка утврдени во тендерската документација.

2. **Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – ходник за поврзување на објектите** оформени од модуларни монтажни – контејнери – димензии: должина 42000 мм – ширина 2400мм и висина 2550 мм- апроксимативно (надворешна димензија) или „еквивалентно“

Контејнерите да бидат одречени со:

Кровна конструкција Кровни ребрести панели (PUR) панелни најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полуреѓанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m2K) RAL 9002/9002;

- 1 ПВЦ – дугла врата без праг 90 мм – 2050мм исполна термопан стапско 4+16+4
- 1 ПВЦ – со термопан стапско 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1400мм

Изработени од еколошки зидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лиме" и надворешно фасадно "лиме". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4 мм, тежина на полуреѓанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m2K) RAL 9002/9002

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-4 0мм-3мм
- Цементни (Ветонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 14 ЛЕД светла x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- Развојна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимално 3 автоматски осигурања
- Доводна ПР табла

Конструкција:

Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструиран S 235JR или „еквивалент“ согласно МКС EN10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

3. **Изработка транспорт и монтажа на топла врска кодидол** за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот куќа на раќа.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR)** панели на малку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 2 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“ комплет со оков и можност за заклучување
 - 1 двокрилна ПВЦ врата – 2/900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков
 - 13 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм;

Изработени од еколошки чисти ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимално 3 автоматски осигурани
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железно антикорозивно споксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2550мм/ должина 18000мм- апроксимативно. Постаვენост на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации.

- **Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект** – (вече со TUV кабини – тоалети- TYP I) - клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремен со:

- Кровна конструкција (едноволен кров) или во зависност од модуларната постаვენост
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“

Економскиот оператор понудата електронски потпишана треба да ја достави на следната менаџерска адреса: valia.andonova@zdravstvo.gov.mk, најдоцна пристигнати до 09.04.2020 година до 10:00 часот.

5.1. Секој економски оператор, може да учествува за еден или повеќе делови од постапката за јавна набавка.

набавка или дока дека припата на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

3. Критериум за избор на најповолна понуда

Договорот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи **ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЛНАТА ПОНУДА ВРЗ ОСНОВА НА ЦЕНАТА.**

3.1 Цена на понудата

3.1.1 Во цената на понудата треба да се земат ги сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во денари.

3.2 Корекција на цени

3.2.1 При реализација на договорот за јавна набавка не се предвидува корекција на цените, односно цените исказани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото време траење на договорот за јавна набавка.

4. Начин и рок на плаќање, рок на испорака и важноста на понудата

4.1 Се предвидува следниов начин на плаќање:

- Плаќањето ќе се изврши по претходно изготвен записник за примопредавање од лицата задолжени за реализација на договорот назначени од Министерството за правда и доставена фактура по испорака, монтажа и извршено примопредавање.

4.2 Рок за реализирање на набавката

Договорниот орган со носителот на набавката ќе склучи договор за предметната набавка со носителот на набавката со времетраење до целосно реализација на договорот согласно начин на испорака наведена во техничката спецификација.

4.3 Период на важноста на понудата

Понудите треба да важат најмалку 30 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите, за чие времетраење понудата со сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудата што важи за покривок период од предвидениот, договорниот орган ја отфрла како неприфатлива понуда. Доколку договорниот орган процени за потребно, може да побара од понудувачот продолжување на периодот на важноста на понудата.

5. Начин на доставување на понудата

- 4 ПВЦ - врати 700м-2050мм исполна панел „саке“;
- 1 ПВЦ - енокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм

Изработени од еколошки зградни ПАНЕЛИ (PVC) од најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат згучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4mm, надворешно најмалку 0.4mm, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.431(W/m2K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабини сендвич панел PVC стил најмалку 40mm;

Под

- Челична конструкција 100mm x 40mm x 3mm, 100mm x 20mm x 3mm, 80mm x 50mm x 3mm, 50mm-40mm-3mm
- Цементни (Бетонур) таблаи 20mm
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 3 LED осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурач
- Доволна IP табла

Толет со 4 кабин и тоа:

- 3 Вч- кабини опремени со толетни јамки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мрилинци
- 3 Батериски чепми комплет со врзен материјал
- 1 туш кабина комплет со батерија и ситот потребен врзен материјал
- Довод
- Оввод
- ПВЦ цевки
- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW

или еквиваленти

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премакван со 4 слоја боја,

конструктивен S235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажа објект минимум 3mm

***Начин на испорака за ДЕЛ 2 – во рок од 10-20 календарски дена од потпишување на договор. Давените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба**

ДЕЛ 2.

Ред. Бр.	ОПИС	Единична цена (денари)	Колчичина/Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- сместувачка	585000	12	7020000	1263600	8283600
2	Монтажен објект ходник - 42 м	1050000	1	1050000	189000	1239000
3	Монтажен објект медицински персонал	190000	1	190000	34200	224200
4	Топла врска- коридор 18м	369000	1	369000	66420	435420
5	Монтажен објект- ТИП I	420500	4	1682000	302760	1984760
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						12166980

ДЕЛ 3.

- Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модулари монтажни – контејнери и ЈЗУ УК за Инфективни и фебрилни состојби, по принципот клуч на рака.

Топлата врска да биде опремена со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларијата поставеност
 - Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м², топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
 - 2 ПВЦ душли врати 2x 9000mm x 2050mm исполна термоман стакло 4x16x4 *комплет со оков и можност за заклучување
 - 1 двокрилна ПВЦ врата – 2 x 900/2050 мм исполна со термоман стакло 4x16x4 комплет со потребен оков и можност за заклучување
 - 8 ПВЦ - еднокрилни прозори со термоман стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм

Изработени од еколошки видни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина

потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност.

1.3 Предметот на договорот е делив на три дела:

ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);

ДЕЛ 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „свивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)

ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

1.3.1 Понудите кои ќе содржат рок на изведба кои ќе содржат поголем рок за изведба нема да бидат земени во предвид поради нивоа на постапката (безбедноста и здравјето на граѓаните).

1.4 Договорниот орган ќе склучи договор за предметната набавка со носителот на набавката со времетраење до завршување на пандемијата Ковид 19 во Република Северна Македонија.

1.5 Техничка спецификација на набавката: **монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност.**

1.6 Договорот за јавна набавка ќе се подели со примена на постапка со преговарање без претходно објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка Г) од Законот за јавните набавки.

1.7 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки донесените подзаконски акти.

2. Елементи на понуда

2.1 Понудата треба да е составена од следниве елементи:

- Образец на понуда (Прилог 2),
- Документ за регистрирана дејност,
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),

2.2 Критериуми за утврдување на способност

2.2.1. Економскиот оператор треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.3 Начин на докажување на способноста на понувачот

2.3.1 За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна

**ПОСТАПКА СО
ПРЕГОВАРАЊЕ БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС ЗА**

за јавна набавка на

**Монтажни контејнери за потреби на здравствениот систем
со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност**

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- Под
 - Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
 - Цементни (Ветолур) табли 20мм
 - ПВЦ под
 - Комплетна инсталација
 - 20 Неонски осветлувања x 18w
 - 2 Прекинувач
 - 5 Монофазни надградни приклучоци
 - 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурани
 - Доводна IP табла
- Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно MKS EN 10025-2:2009
- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 3000мм / висина 2550мм/ должина 340000мм - апроксимативно. Детална поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации. Изведувањот е должен на направа разработка на скицата и работилнички цртежи.


***Начин на испорака за ДЕЛ 3 – во рок од 10-20 календарски дена од потпишувањето на договорот. Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба**

ДЕЛ 3.

Ред. Бр.	ОПИС	Единична цена (денари)	Количина парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Топла врска – коридор 34 м	922500	1	922500	166050	1088550
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						1088550

Скопје, април 2020 година

1. Општи информации во врска со договорниот орган и предметот на набавка
- 1.1 Договорен орган е Министерството за здравство, со адреса ул. „50-та Дивизија“ бр.14, телефон за контакт +389 2 311 2 500, контакт лице Евожин Ложанкоски.
- 1.2 Предмет на договорот за јавна набавка е јавна набавка на **Монтажни контејнери** за

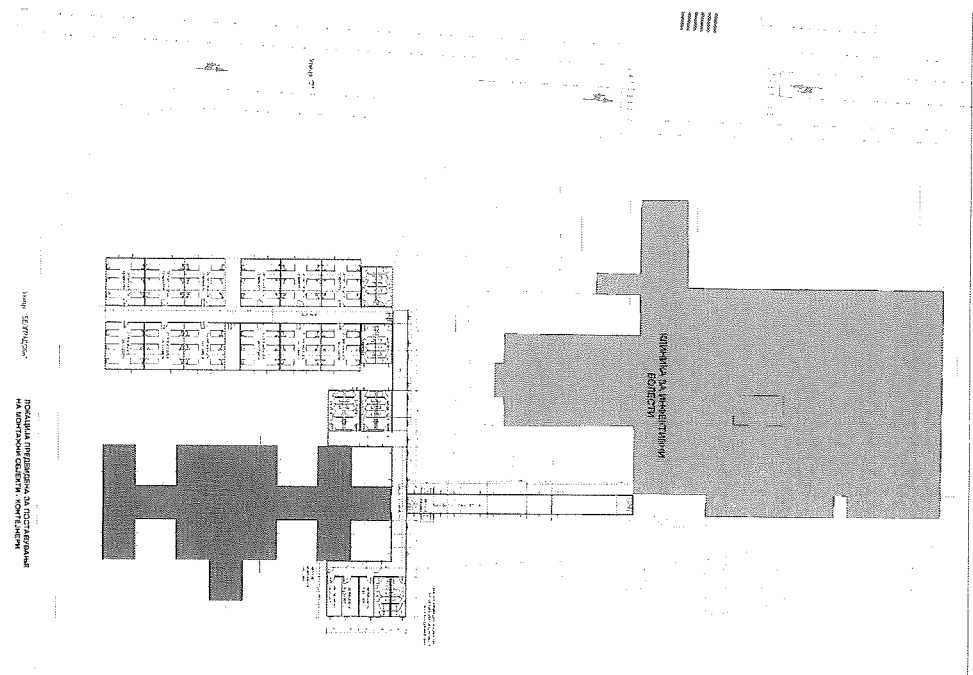

ДО: ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Веландово

ПРЕДМЕТ: Покана за поднесување понуда за јавна набавка на монтажни контејнери со поставка со преговаранье без објавување оглас од причини од крајна итноста

Почитувани,

Министерство за здравство, со адреса на ул. 50 Дивизија бр.14, и електронска пошта kontakt@zdravstvo.gov.mk, има потреба од јавна набавка на **монтажни контејнери со поставка со преговаранье без објавување оглас од причини од крајна итноста**. За таа цел, Министерство за здравство спроведува поставка со преговаранье без објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) од Законот за јавните набавки. Ве молиме да ни доставите првична понуда електронски потпишана за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка во согласност со придожената техничка спецификација најдоцна до 09.04.2020 година до 10:00 часот следната меил адреса: vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk.

Ве молиме при илготување на Вашата понуда да ги користите оригиналните образци кои се составен дел на тендерската документација.

Молиме, во понудата да навелете и лице кое во име на понудувачот ќе учествува во преговорите за реализација на набавката (име и презиме, контакт телефон).

Однапред благодариме на соработката.

Одговорно лице
Министер
Д-р Венко Филмиче
