



Врз основа на член 77 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/19) и член 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) Министерот за здравство ја донесе следната одлука:

ОДЛУКА за јавна набавка

1. Се утврдува потреба за доделување на договор за јавна набавка на монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија, а во согласност со Извадок од Нацрт-записникот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година, („Точка 10“).

ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);

ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)

ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

2. За задоволување на потребата од точка 1 на оваа одлука се утврдуваат 16.900.000,00 денари без ДДВ. Средствата се обезбедени од Буџетот на Министерство за здравство, сметка 19001 00434 637 10, програма 1К и донациска сметка 19001 00434 785 К2. Доколку согласно Точката 10 од Извадок од Нацрт-записникот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година се реализира средствата ќе бидат обезбедени од донациската сметка.

3. Договорот за јавна набавка да се додели со спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) и член 55 став 6 од Законот за јавни набавки.

4. Постапката е деллива на делови.

5. Постапката да заврши со склучување на договор за јавна набавка.

6. За целосна реализација на постапката на доделување на договор за јавна набавка се формира комисија за јавна набавка во состав од:



Република Северна Македонија
Министерство за здравство

Љупчо Балковски – претседател;
Вања Андонова – член;
Сандра Веловска – член;
Дамјан Христов – заменик претседател;
Елена Иванова – заменик член;
Јован Грповски – заменик член;

7. За реализирање на оваа постапка ќе се ангажира надворешно лице Мирјана Македонска кое ќе го следи процесот на спроведување на постапката како претставник од Проектот Одржлив инклузивен рамномерен регионален развој.
8. За реализација на договорот по извршената јавна набавка се задолжуваат лицата Ана Ивановска и Стефанија Стоичковска.
9. Се задолжува комисијата од точка 6 да ја спроведе постапката согласно со одредбите од член 79 од Законот за јавните набавки.
10. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно одлуките на Влада на Република Северна Македонија за мерки и препораки за заштита и превенција од Коронавирус COVID-19, а поради зголемување на бројот на заболени лица се јавува потреба од предвидување на нови болнички капацитети за згрижување на заболените лица. Министерството за здравство има потреба од набавка – прибирање на понуди за монтажни објекти – контејнери, кои ќе се поставуваат во непосредна близина на ЈЗУ Универзитеска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби при Универзитетскиот Клинички комплекс „Мајка Тереза“ во Скопје. За таа цел, планирана е лесна, брза и монтажна изградба на медицински капацитети – болничко сместување со просторија за медицински персонал и за згрижување на пациенти со медицински третман на заболени од Коронавирус COVID-19.

Постапката е делива по делови кои се составени од веќе наведените елементи согласно итните потреби за ставање во функција на монтажната болница, а поради итната потреба од зголемување на болничките капацитети за лекување на пациенти кои се заболени со Коронавирус COVID -19.

Министер
Доц. Д-р Венко Филипче



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Бр. 23-3039/4

09.04.2020 година

Врз основа на член 77 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/19) и член 55 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) Министерот за здравство ја донесе следната одлука:

О Д Л У К А за изменување и дополнување на Одлуката за јавна набавка бр.23-3093/2 од 07.04.2020

1. Се утврдува потреба за доделување на договор за јавна набавка на монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија, а во согласност со Извадок од Нацрт-записникот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година, („Точка 10“).

ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);

ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)

ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

2. За задоволување на потребата од точка 1 на оваа одлука се утврдуваат 16.900.000,00 денари без ДДВ. Средствата се обезбедени од Буџетот на Министерство за здравство, сметка 19001 00434 637 10, програма 1К и донациска сметка 19001 00434 785 К2. Доколку согласно Точката 10 од Извадок од Нацрт-записникот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година се реализира средствата ќе бидат обезбедени од донациската сметка.

3. Договорот за јавна набавка да се додели со спроведување на постапка со преговарање без објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) и член 55 став 6 од Законот за јавни набавки.

4. Постапката е делива на делови.

5. Постапката да заврши со склучување на договор за јавна набавка.

6. За целосна реализација на постапката на доделување на договор за јавна набавка се формира комисија за јавна набавка во состав од:



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Љупчо Балковски – претседател;
Вања Андонова – член;
Сандра Веловска – член;
Дамјан Христов – заменик претседател;
Елена Иванова – заменик член;
Јован Грповски – заменик член;

7. За реализирање на оваа постапка ќе се ангажира надворешно лице Мирјана Македонска кое ќе го следи процесот на спроведување на постапката како претставник од Амбасада на Швајцарија/SDC.
8. За реализација на договорот по извршената јавна набавка се задолжуваат лицата Ана Ивановска и Стефанија Стоичковска.
9. Се задолжува комисијата од точка 6 да ја спроведе постапката согласно со одредбите од член 79 од Законот за јавните набавки.
10. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Согласно одлуките на Влада на Република Северна Македонија за мерки и препораки за заштита и превенција од Коронавирус COVID-19, а поради зголемување на бројот на заболени лица се јавува потреба од предвидување на нови болнички капацитети за згрижување на заболените лица. Министерството за здравство има потреба од набавка – прибирање на понуди за монтажни објекти – контејнери, кои ќе се поставуваат во непосредна близина на ЈЗУ Универзитеска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби при Универзитетскиот Клинички комплекс „Мајка Тереза“ во Скопје. За таа цел, планирана е лесна, брза и монтажна изградба на медицински капацитети – болничко сместување со просторија за медицински персонал и за згрижување на пациенти со медицински третман на заболени од Коронавирус COVID-19.

Постапката е делива по делови кои се составени од веќе наведените елементи согласно итните потреби за ставање во функција на монтажната болница, а поради итната потреба од зголемување на болничките капацитети за лекување на пациенти кои се заболени со Коронавирус COVID-19.





Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Бр.-Nr. 23-3039/3

ДО: _____

07.04. 20 20 год.-viti
СКОПЈЕ - ШКУП

ПРЕДМЕТ: Покана за поднесување понуда за јавна набавка на **монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност**

Почитувани,

Министерство за здравство, со адреса на ул. 50 Дивизија бр.14, и електронска пошта kontakt@zdravstvo.gov.mk, има потреба од јавна набавка на **монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност**. За таа цел, Министерство за здравство спроведува постапка со преговарање без објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) од Законот за јавните набавки. Ве молиме да ни доставите првична понуда електронски потпишана за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка во согласност со приложената техничка спецификација најдоцна до 09.04.2020 година до 10:00 часот следната меил адреса: vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk.

Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите оригиналните обрасци кои се составен дел на тендерската документација.

Молиме, во понудата да наведете и лице кое во име на понудувачот ќе учествува во преговорите за реализација на набавката (име и презиме, контакт телефон).

Однапред благодариме на соработката.

Одговорно лице
Министер
Доц. Д-р Венко Филипче



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

ДО: _____

ПРЕДМЕТ: Покана за поднесување понуда за јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

Почитувани,

Министерство за здравство, со адреса на ул. 50 Дивизија бр.14, и електронска пошта kontakt@zdravstvo.gov.mk, има потреба од јавна набавка на **монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност**. За таа цел, Министерство за здравство спроведува постапка со преговарање без објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) од Законот за јавните набавки. Ве молиме да ни доставите првична понуда електронски потпишана за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка во согласност со приложената техничка спецификација најдоцна до 09.04.2020 година до 10:00 часот следната меил адреса: vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk.

Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите оригиналните обрасци кои се составен дел на тендерската документација.

Молиме, во понудата да наведете и лице кое во име на понудувачот ќе учествува во преговорите за реализација на набавката (име и презиме, контакт телефон).

Однапред благодариме на соработката.

Одговорно лице
Министер
Доц. Д-р Венко Филипче



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

**ПОСТАПКА СО
ПРЕГОВАРАЊЕ БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС ЗА**

за јавна набавка на

**Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем
со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност**

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Скопје, април 2020 година



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

1. Општи информации во врска со договорниот орган и предметот на набавка

1.1 Договорен орган е Министерство за здравство, со адреса ул. „50-та Дивизија“ бр.14, телефон за контакт +389 2 311 2 500, контакт лице Божин Ложанкоски.

1.2 Предмет на договорот за јавна набавка е јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност.**

1.3 Предметот на договорот е делив на три дела:

ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);

ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)

ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

1.3.1 Понудите кои ќе содржат рок на изведба кои ќе содржат поголем рок за изведба нема да бидат земени во предвид поради итноста на постапката (безбедноста и здравјето на граѓаните).

1.4 Договорниот орган ќе склучи договор за предметната набавка со носителот на набавката со времетраење до завршување на пандемијата Ковид 19 во Република Северна Македонија.

1.5 Техничка спецификација на набавката: **монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност.**

1.6 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со преговарање без претходно објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) од Законот за јавните набавки.

1.7 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки и донесените подзаконски акти.

2. Елементи на понуда

2.1 Понудата треба да е составена од следниве елементи:

- Образец на понуда (Прилог 2),
- Документ за регистрирана дејност,
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

2.2 Критериуми за утврдување на способност

2.2.1. Економскиот оператор треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.3 Начин на докажување на способноста на понудувачот

2.3.1 За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

3. Критериум за избор на најповолна понуда

Договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи **економски најповолната понуда врз основа на цената.**

3.1 Цена на понудата

3.1.1 Во цената на понудата треба да се засметани сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во денари.

3.2 Корекција на цени

3.2.1 При реализација на договорот за јавна набавка не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

4. Начин и рок на плаќање, рок на испорака и важност на понуди

4.1 Се предвидува следниов начин на плаќање:

- Плаќањето ќе се изврши по претходно изготвен записник за примопредавање од лицата задолжени за реализација на договорот назначени од Министерство за здравство и доставена фактура по испорака, монтажа и извршено примопредавање.

4.2 Рок за реализирање на набавката



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Договорниот орган со носителот на набавката ќе склучи договор за предметната набавка со носителот на набавката со времетраење до целосно реализација на договорот согласно начин на испораката наведена во техничката спецификација.

4.3 Период на важност на понудата

Понудите треба да важат најмалку 30 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите, за чие времетраење понудата со сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудата што важи за пократок период од предвидениот, договорниот орган ја отфрла како неприфатлива понуда. Доколку договорниот орган процени за потребно, може да побара од понудувачот продолжување на периодот на важност на понудата.

5. Начин на доставување на понудата

Економскиот оператор понудата електронски потпишана треба да ја достави на следната меил адреса: vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk, најдоцна пристигнати до **09.04.2020** година до **10:00 часот**.

5.1. Секој економски оператор, може да учествува за еден или повеќе делови од постапката за јавна набавка.



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

ПРИЛОГ 2

Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на поканата за поднесување на понуди за доделување на договор за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел 1. Информации за понудувачот

1.1. Име на понудувачот: _____

1.2. Контакт информации:

- Адреса: _____
- Телефон: _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: _____

1.3. Одговорно лице: _____

1.4. Даночен број: _____

Дел 2. Финансиска понуда

2.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за: **ДЕЛ 1 / 2 / 3 (соодветно да се пополни)**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, за за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** _____ *[со бројки]*
(_____) *[со букви]* денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува _____ денари.



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

2.2 Ги прифаќаме начинот на плаќање и рокот на реализација на предметот на набавка утврдени во тендерската документација.

Дел 3. Рок на важност на понудата: 30 дена

На преговорите што ќе ги закаже договорниот орган, понудувачот ќе го претставува лицето: _____, тел _____.

Дел 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

ПРИЛОГ: (Документите што се приложуваат кон понудата)

➤ Со финансиската понуда задолжително се доставуваат и:

- документи за регистрирана дејност
- изјава за сериозност на понудата



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

ПРИЛОГ 3 - Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ [име и презиме], врз основа на член 101 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 101 став 7 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Овластено лице



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

ПРИЛОГ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Согласно одлуките на Влада на Република Северна Македонија за мерки и препораки за заштита и превенција од Коронавирус COVID-19, а поради зголемување на бројот на заболени лица се јавува потреба од предвидување на нови болнички капацитети за згрижување на заболените лица. Министерството за здравство има потреба од набавка – прибирање на понуди за **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем**, кои ќе се поставуваат во непосредна близина на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби при Универзитетскиот Клинички комплекс „Мајка Тереза“ во Скопје и во согласност со Извадок од Нацрт-записникот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година, („Точка 10“). За таа цел, планирана е лесна, брза и монтажна изградба на медицински капацитети – болничко сместување со просторија за медицински персонал и згрижување со медицински третман на заболени лица од Коронавирус COVID-19.

Локацијата на која е предвидено поставување на модулите за монтажен објект - контејнери, претходно на подлогата е поставено шљунак и истата е нивелирана со тампон.

На локацијата ќе биде обезбеден приклучок на водоводна и канализациона мрежа и приклучок кон електро дистрибутивната мрежа заради потребите од снабдување со електрична енергија.

Со поставувањето на модулните монтажни објекти – контејнери се предвидува да се добие обезбеден простор за:

- (канцелариски) – за потребите на медицински персонал;
- сместувачки капацитет – болнички кревети;
- тоалети со туш кабини;
- ходник; и
- „топла врска“

Во прилог е даден: графички цртеж со просторно решение и диспозиција на модулите.

Технички карактеристики:

ДЕЛ 1.

1. **Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (вече со туш кабини – тоалети- ТИП 1)** - клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) или во зависност од модуларната поставеност
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м3, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m2K) RAL 9002/9002



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“
- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саке“;
- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабини сендвич панел PUR сид најмалку 40мм;

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betonyr) табли 20мм
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 3 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Тоалет со 4 кабин и тоа:

- 3 Вц- кабини опремени со тоалетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мијалници
- 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
- 1 туш кабина комплет со батерија и сиот потребен врзен материјал
- Довод
- Одвод
- ПВЦ цевки
- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW

или еквивалентни

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект минимум 3мм



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

2. **Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект** – (веќе со туш кабини – тоалети - **ТИП 2**) – клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) или во зависност од модуларната поставеност

Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 4 ПВЦ - врати 700м-2050мм исполна панел „саќе“;
- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм;

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабини сендвич панел PUR сид намалку 40мм

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betonyr) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 3 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Тоалет со 4 кабини и тоа:

- 2 Вц- кабини опремени со тоалетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мијалници
- 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
- 2 туш кабини комплет со батерија и сиот потребен врзен материјал
- Довод
- Одвод
- ПВЦ цевки
- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

или еквивалентни

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтаж објект минимум 3мм

3. **Изработка, транспорт и монтажа на монтаж објект – (медицински персонал)** – клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 1 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1400мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betonyr) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 2 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Климатизација- инвертер сплит систем 2,5KW

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтаж објект 3мм



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

4. **Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модулари монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност - Кровни ребрасти панели (PUR) панели на малку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 2 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“ комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2/900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков
- 13 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 12 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009;

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм
- Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2550мм/ должина 41000мм - апроксимативно. Поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации.



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

***Начин на испорака за ДЕЛ 1 – во рок од 5-10 календарски дена од потпишување на договор.** Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба.

ДЕЛ 1.

Ред. Бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количин а/ Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- ТИП 1		4			
2	Монтажен објект - ТИП 2		2			
3	Монтажен објект медицински		3			
4	Топла врска-коридор 41м		1			
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						

ДЕЛ 2.

1. Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (сместувачки) – клуч на рака-димензии: должина 6000 мм – ширина 7200 мм и висина 2600 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“

Контејнерите да бидат опремени со:

Кровна конструкција (двоводен кров) ± 100 мм

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- Олуци
- 1 ПВЦ - врата без праг 1050 мм – 2050мм исполна панел „саке“
- 2 ПВЦ – двокрилни со термопан стакло, 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 1400мм-1400мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-4 0мм-3мм
- Цементни (Betonyр) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 ЛЕД светла x 18w
- 1 Прекинувач
- 6 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Инвертер сплит ситем за климатизација – 3,5 KW

или еквивалентни

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или „еквивалент“, согласно МКС EN10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

2. Изработка, транспорт и монтажа на монтажнен објект – ходник за поврзување на објектите оформени од модулари монтажни – контејнери – димензии: должина 42000 мм – ширина 2400мм и висина 2550 мм- апроксимативно (надворешна димензија) или „еквивалентно“

Контејнерите да бидат опремени со:

Кровна конструкција Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- 1 ПВЦ – дупла врата без праг 90 мм – 2050мм исполна термопан стакло 4+16+4
- 1 ПВЦ – со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1400мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4 мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-4 0мм-3мм
- Цементни (Betonyr) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 14 ЛЕД светла x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција:

Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или „еквивалент“, согласно MKC EN10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

3. Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор за поврзување на објектите оформени од модулари монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модулариноста поставеност **Кровни ребрасти панели** (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- 2 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“ комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2/900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков
- 13 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм;

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2550мм/ должина 18000мм-апроксимативно. Поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации.

5. **Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажнен објект** – (вече со туш кабини – тоалети- **ТИП 1**) - клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) или во зависност од модуларната поставеност
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саќе“;
- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабини сендвич панел PUR сид најмалку 40мм;

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

- Цементни (Betonyr) табли 20мм
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 3 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Тоалет со 4 кабин и тоа:

- 3 Вц- кабин опремени со толетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мијалници
- 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
- 1 туш кабина комплет со батерија и сиот потребен врзен материјал
- Довод
- Одвод
- ПВЦ цевки
- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW

или еквивалентни

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект минимум 3мм

***Начин на испорака за ДЕЛ 2 – во рок од 10-20 календарски дена од потпишување на договор. Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба**

ДЕЛ 2.

Ред. Бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количин а/Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект-сместувачки		12			



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

2	Монтажен објект ходник - 42 м		1			
3	Монтажен објект медицински		1			
4	Топла врска-коридор 18м		1			
5	Монтажен објект- ТИП 1		4			
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						

ДЕЛ 3.

- 1. Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модулари монтажни – контејнери и ЈЗУ УК за Инфективни и фебрилни состојби, по принципот клуч на рака.

Топлата врска да биде опремена со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модулари поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 2 ПВЦ дупли врати 2x 900mm x 2050mm исполна термопан стакло 4x16x4 “комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2 x 900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков и можност за заклучување
- 8 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- Под
- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 20 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 5 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 3000мм / висина 2550мм/ должина 34000мм - апроксимативно. Детална поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации. Изведувачот е должен на направи разработка на скицата и работилнички цртежи.

***Начин на испорака за ДЕЛ 3 – во рок од 10-20 календарски дена од потпишување на договор. Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба**

ДЕЛ 3.

Ред. Бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количина на парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Топла врска – коридор 34 м		1			
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ






Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

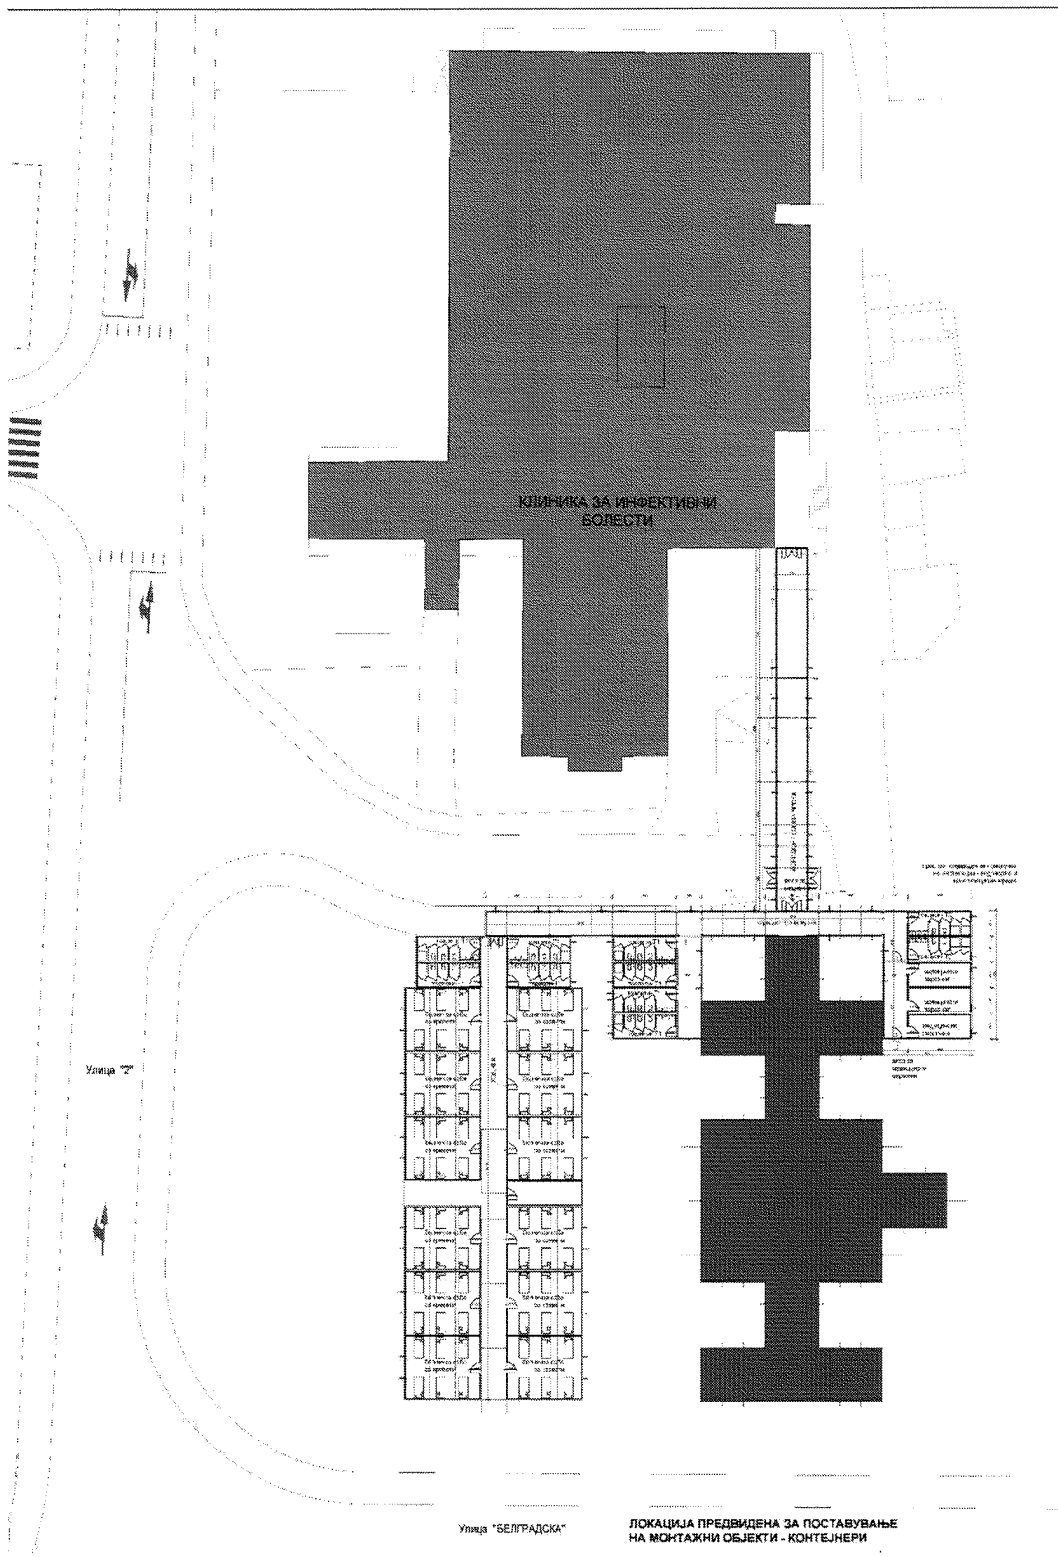

Бр.-Нр. 09-04-2020 23-3039/5

09-04-2020 Записник од отворањето на понудите
СКОПЈЕ - ШКУР

Договорен орган: Министерство за здравство на РСМ

Предмет на договорот: Набавка на Монтажни контејнери за потребите на Здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настанатата епидемија, а во согласност со Извадок од Нацрт записникот од триесет и шестата седница на Владата на РСМ

Број на постапка 23-3039

Вид на постапка: Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

Краен рок за доставување на понуда:

1. Датум, време и место на отворањето на понудата: 09/04/2020
2. Членови на комисијата за јавна набавка:
 - – претседател Љупчо Балковски
 - – член Вања Андонова
 - – член Сандра Веловска
3. Надворешно лице Мирјана Македонска – претставник на Амбасадата на Швајцарија
4. Вкупен број на примени понуди: 5 (пет)
5. Број на задоцнети понуди, нивни измени, замени или повлекувања: 1 (една)

Опис	Понудувач
Назив на понудувачот	Кен панел монтинг довел Скопје
Датум на прием на понуда	08/04/2020 23:48
Понудата е примена во рок	Да
Повлекување на понуда	Не
Рок на важност на понудата	30 дена
Валута на понудата	Денари
Изјава за сериозност на понудата	Да
Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 1	4.387.410,17
Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 2	10.549.340,67
Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 3	1.611.300,00

Опис	Понудувач
Назив на понудувачот	ЈБТ Проинженеринг Валандово
Датум на прием на понуда	09/04/2020 09:22
Понудата е примена во рок	Да
Повлекување на понуда	Не
Рок на важност на понудата	30 дена
Валута на понудата	Денари
Изјава за сериозност на понудата	Да
Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 1	4.258.875,00
Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 2	11.485.125,00
Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 3	922.500,00

Опис	Понудувач
Назив на понудувачот	ДПТУ Брако доо Велес
Датум на прием на понуда	09/04/2020 09:45
Понудата е примена во рок	Да
Повлекување на понуда	Не
Рок на важност на понудата	30 дена
Валута на понудата	Денари
Изјава за сериозност на понудата	Да
Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 1	2.910.451,00.
Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 2	8.248.240,00
Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 3	987.200,00

Опис	Понудувач
Назив на понудувачот	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово
Датум на прием на понуда	09/04/2020 09:23 09/04/2020 10:03 дополнителни документи
Понудата е примена во рок	Да
Повлекување на понуда	Не
Рок на важност на понудата	30 дена
Валута на понудата	Денари
Изјава за сериозност на понудата	Да

Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 1	
Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 2	
Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 3	
Дадена е вкупна цена без ддв за сите делови	15.396.500,00

Опис	Понудувач
Назив на понудувачот	МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје
Датум на прием на понуда	09/04/2020 09:55
Понудата е примена во рок	Да
Повлекување на понуда	Не
Рок на важност на понудата	30 дена
Валута на понудата	Денари
Изјава за сериозност на понудата	Да
Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 1	10.620.000,00
Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 2	31.554.000,00
Вкупна цена (без ДДВ)ДЕЛ 3	3.600.000,00

Записникот е изработен на 09/04/2020 часот.

Потпис на членовите на комисијата за јавна набавка:

претседател Љупчо Балковски

член Вања Андонова

член Сандра Веловска

Мирјана Македонска – претставник на Амбасадата на Швајцарија

Одговор по поставени прашања од економски оператори во врска со Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

From : Вања Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Wed, Apr 08, 2020 10:42 PM

Subject : Одговор по поставени прашања од економски оператори во врска со Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

Всс : contact@jbt-ait.com, contact@kenpanel.mk, sonjakrstic@yahoo.com, blagoj@brako.com.mk, Elena Petrovska <elena.petrovska@zdravstvo.gov.mk>, Jovan Grnovski <jovan.grnovski.piu@zdravstvo.gov.mk>, Сандра Беловска <sandra.velovska@zdravstvo.gov.mk>, Damjan Hristov <damjan.hristov@zdravstvo.gov.mk>, Ljupco Balkoski <ljupco.balkoski@zdravstvo.gov.mk>

Почитувани,

По поставени прашања од еден од економските оператори, во продолжение ви го испраќам следното:

Прашање 1. Дали во „образецот на понуда - прилог 2 од тендерската документација“ може да се претстават цените за секој дел поединечно или мора да биде како целина за сите 3 дела


Одговор: Во образецот на понуда - прилог 2 од Тендерската документација, се претставува вкупната цена на понудата вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, со бројки и букви, во денари.

Прашање 2. Дали во прилог на понудата може да се испратат понуди за секој дел поединечно.

Одговор: Понудите за секој дел поединечно, се пополнуваат соодветно во обрасците дадени во Прилог - Технички спецификации од Тендерската документација.

со почит,

Вања Андонова, д-р
Кабинет на Министер во Министерството за здравство
ул.50-та Дивизија 14, 1000 Скопје
тел: 023112500 лок:225
www.moh.gov.mk

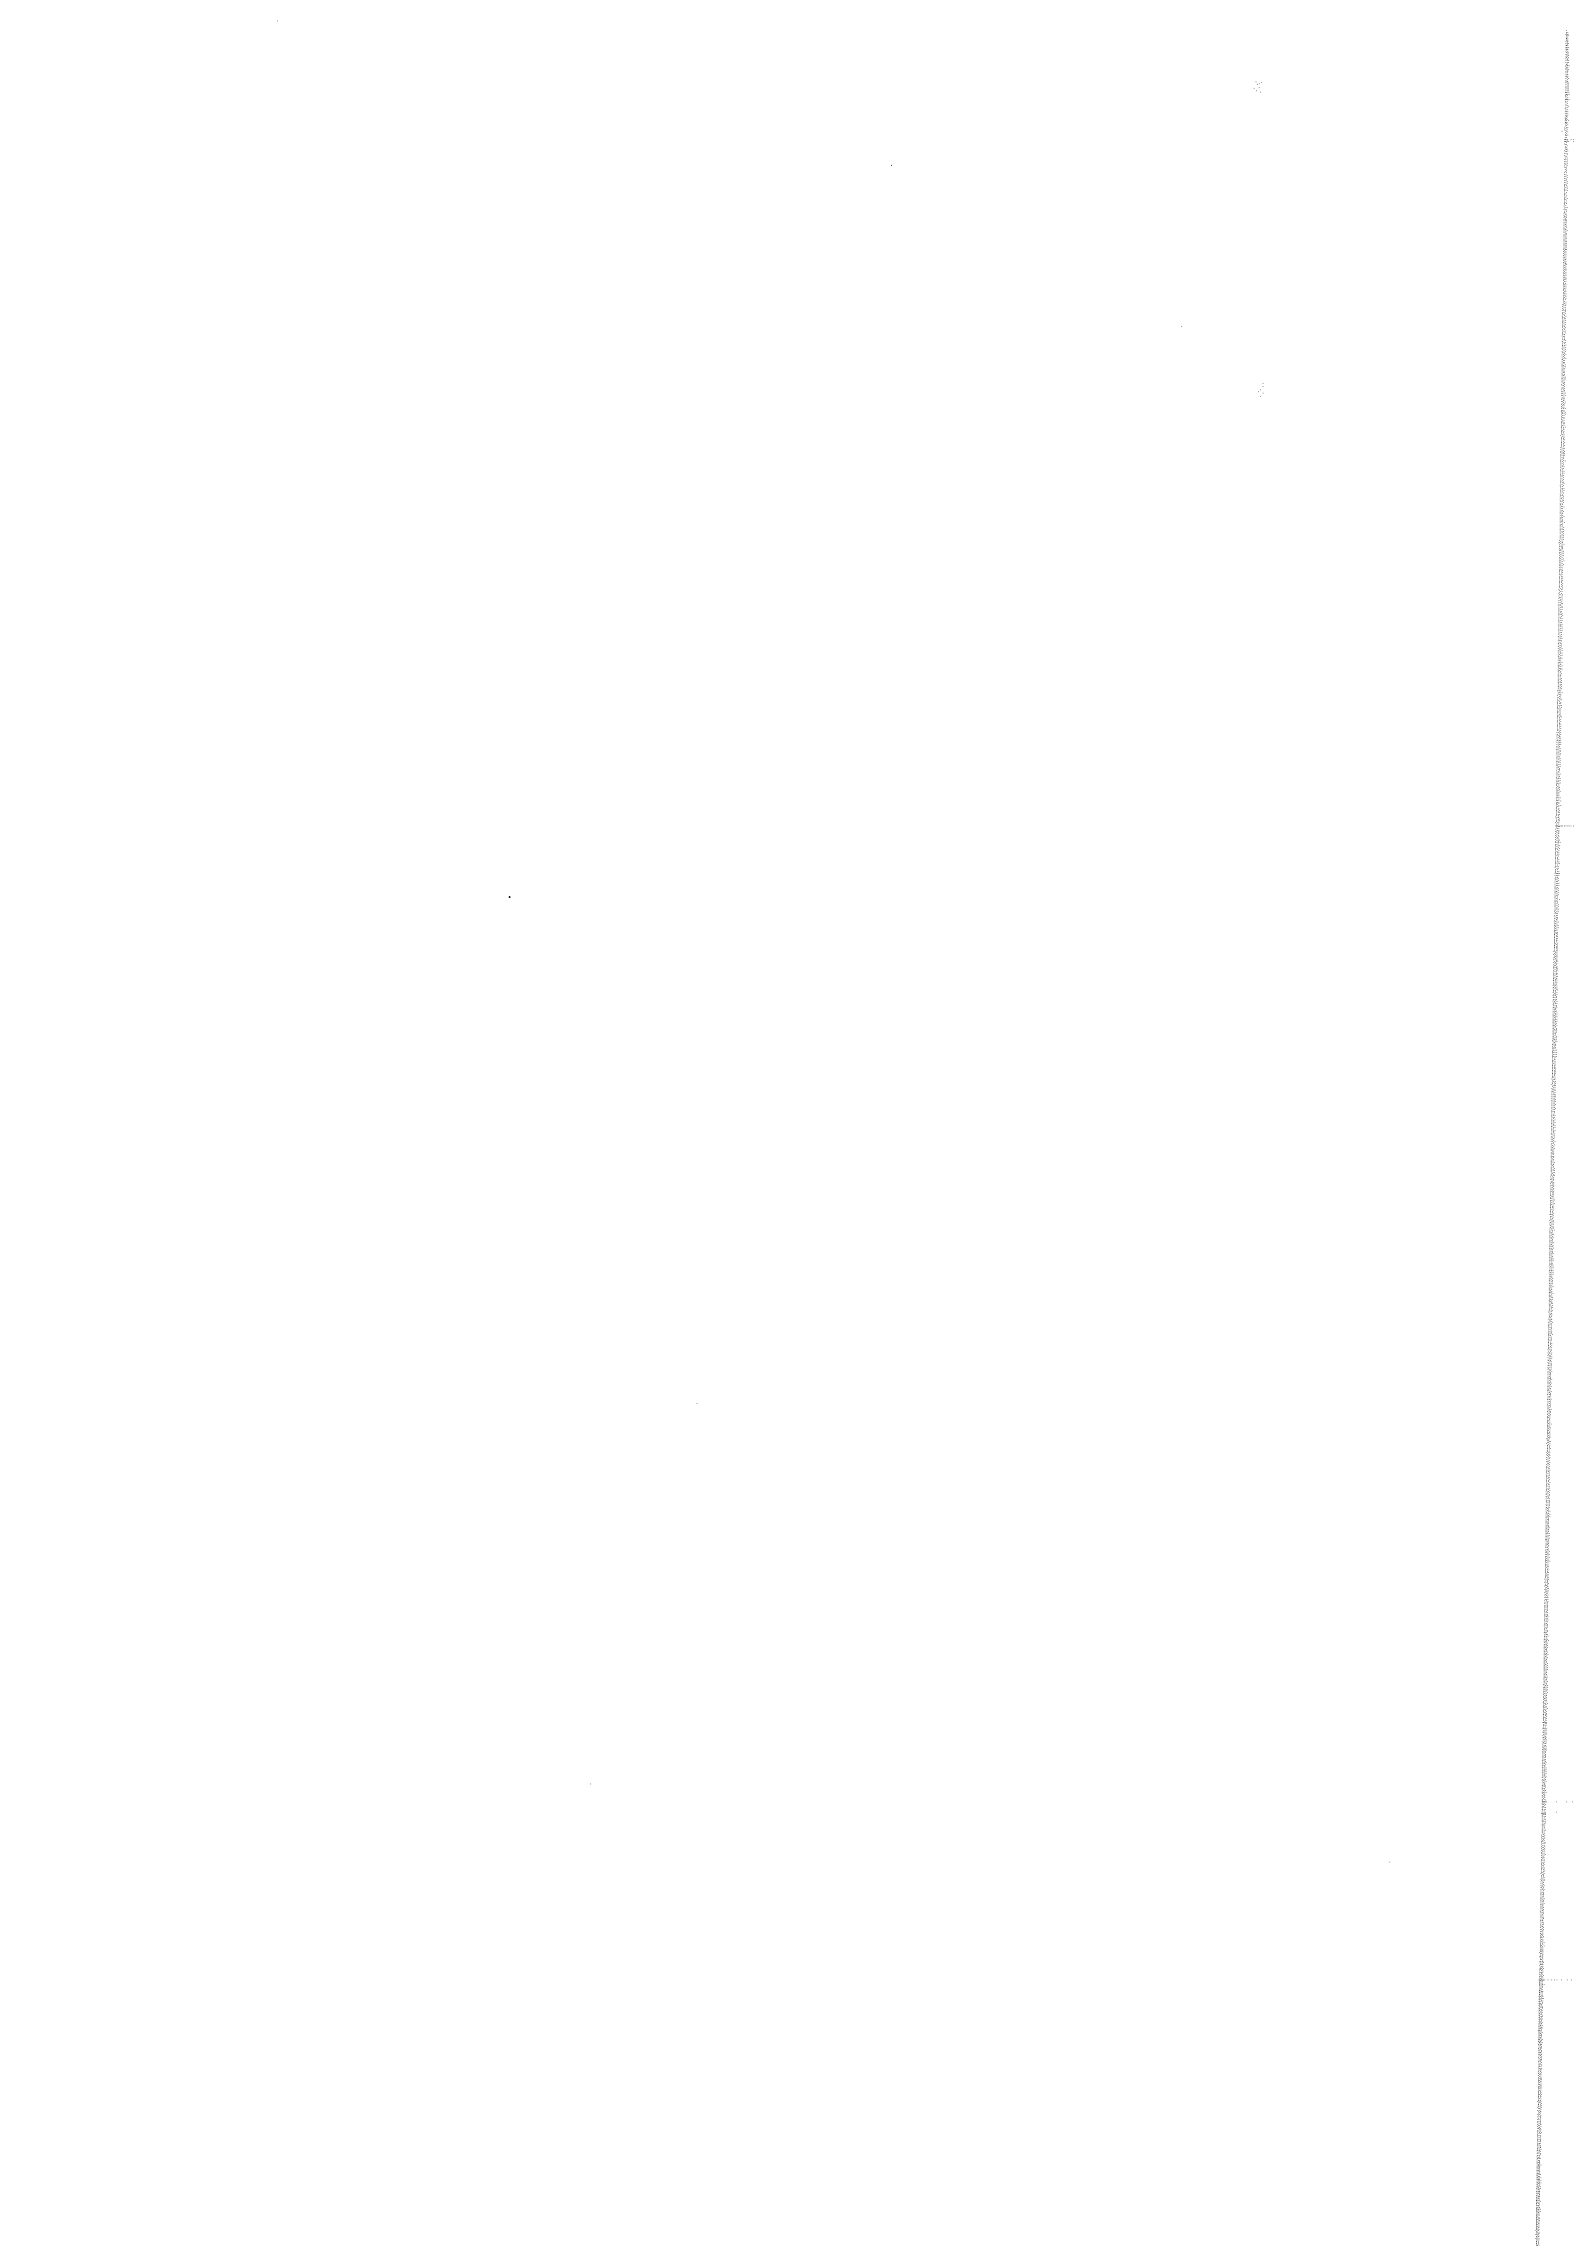

Re: Прашање Итно

From : Vlatko Serafimovski <vlatko_serafimovski@hotmail.com>

Subject : Re: Прашање Итно

To : Вања Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Почитувани,

Ве молам за одговор

1. Дали во „образецот на понуда - прилог 2 од тендерската документација“ може да се претстават цените за секој дел поединечно или мора да биде како целина за сите 3 дела, Го прашуваме ова бидејќи сме во можност да аплицираме за сите 3 дела.
2. Дали во прилог на понудата може да се испратат понуди за секој дел поединечно.

Би благодарам.

Со почит


VLATKO SERAFIMOVSKI
Sales manager
Ken Panel Monting Dooel
Gornovranovska 186 b
Aerodrom, 1000 Skopje, MK
GSM: ++ 389/78 301 868
++ 389/78 360 713

Web: www.kenpanel.mk

Fan Page: <https://www.facebook.com/pages/Ken-Panel/536501109749019?ref=hl>

Wed, Apr 08, 2020 09:56 PM

1 attachment

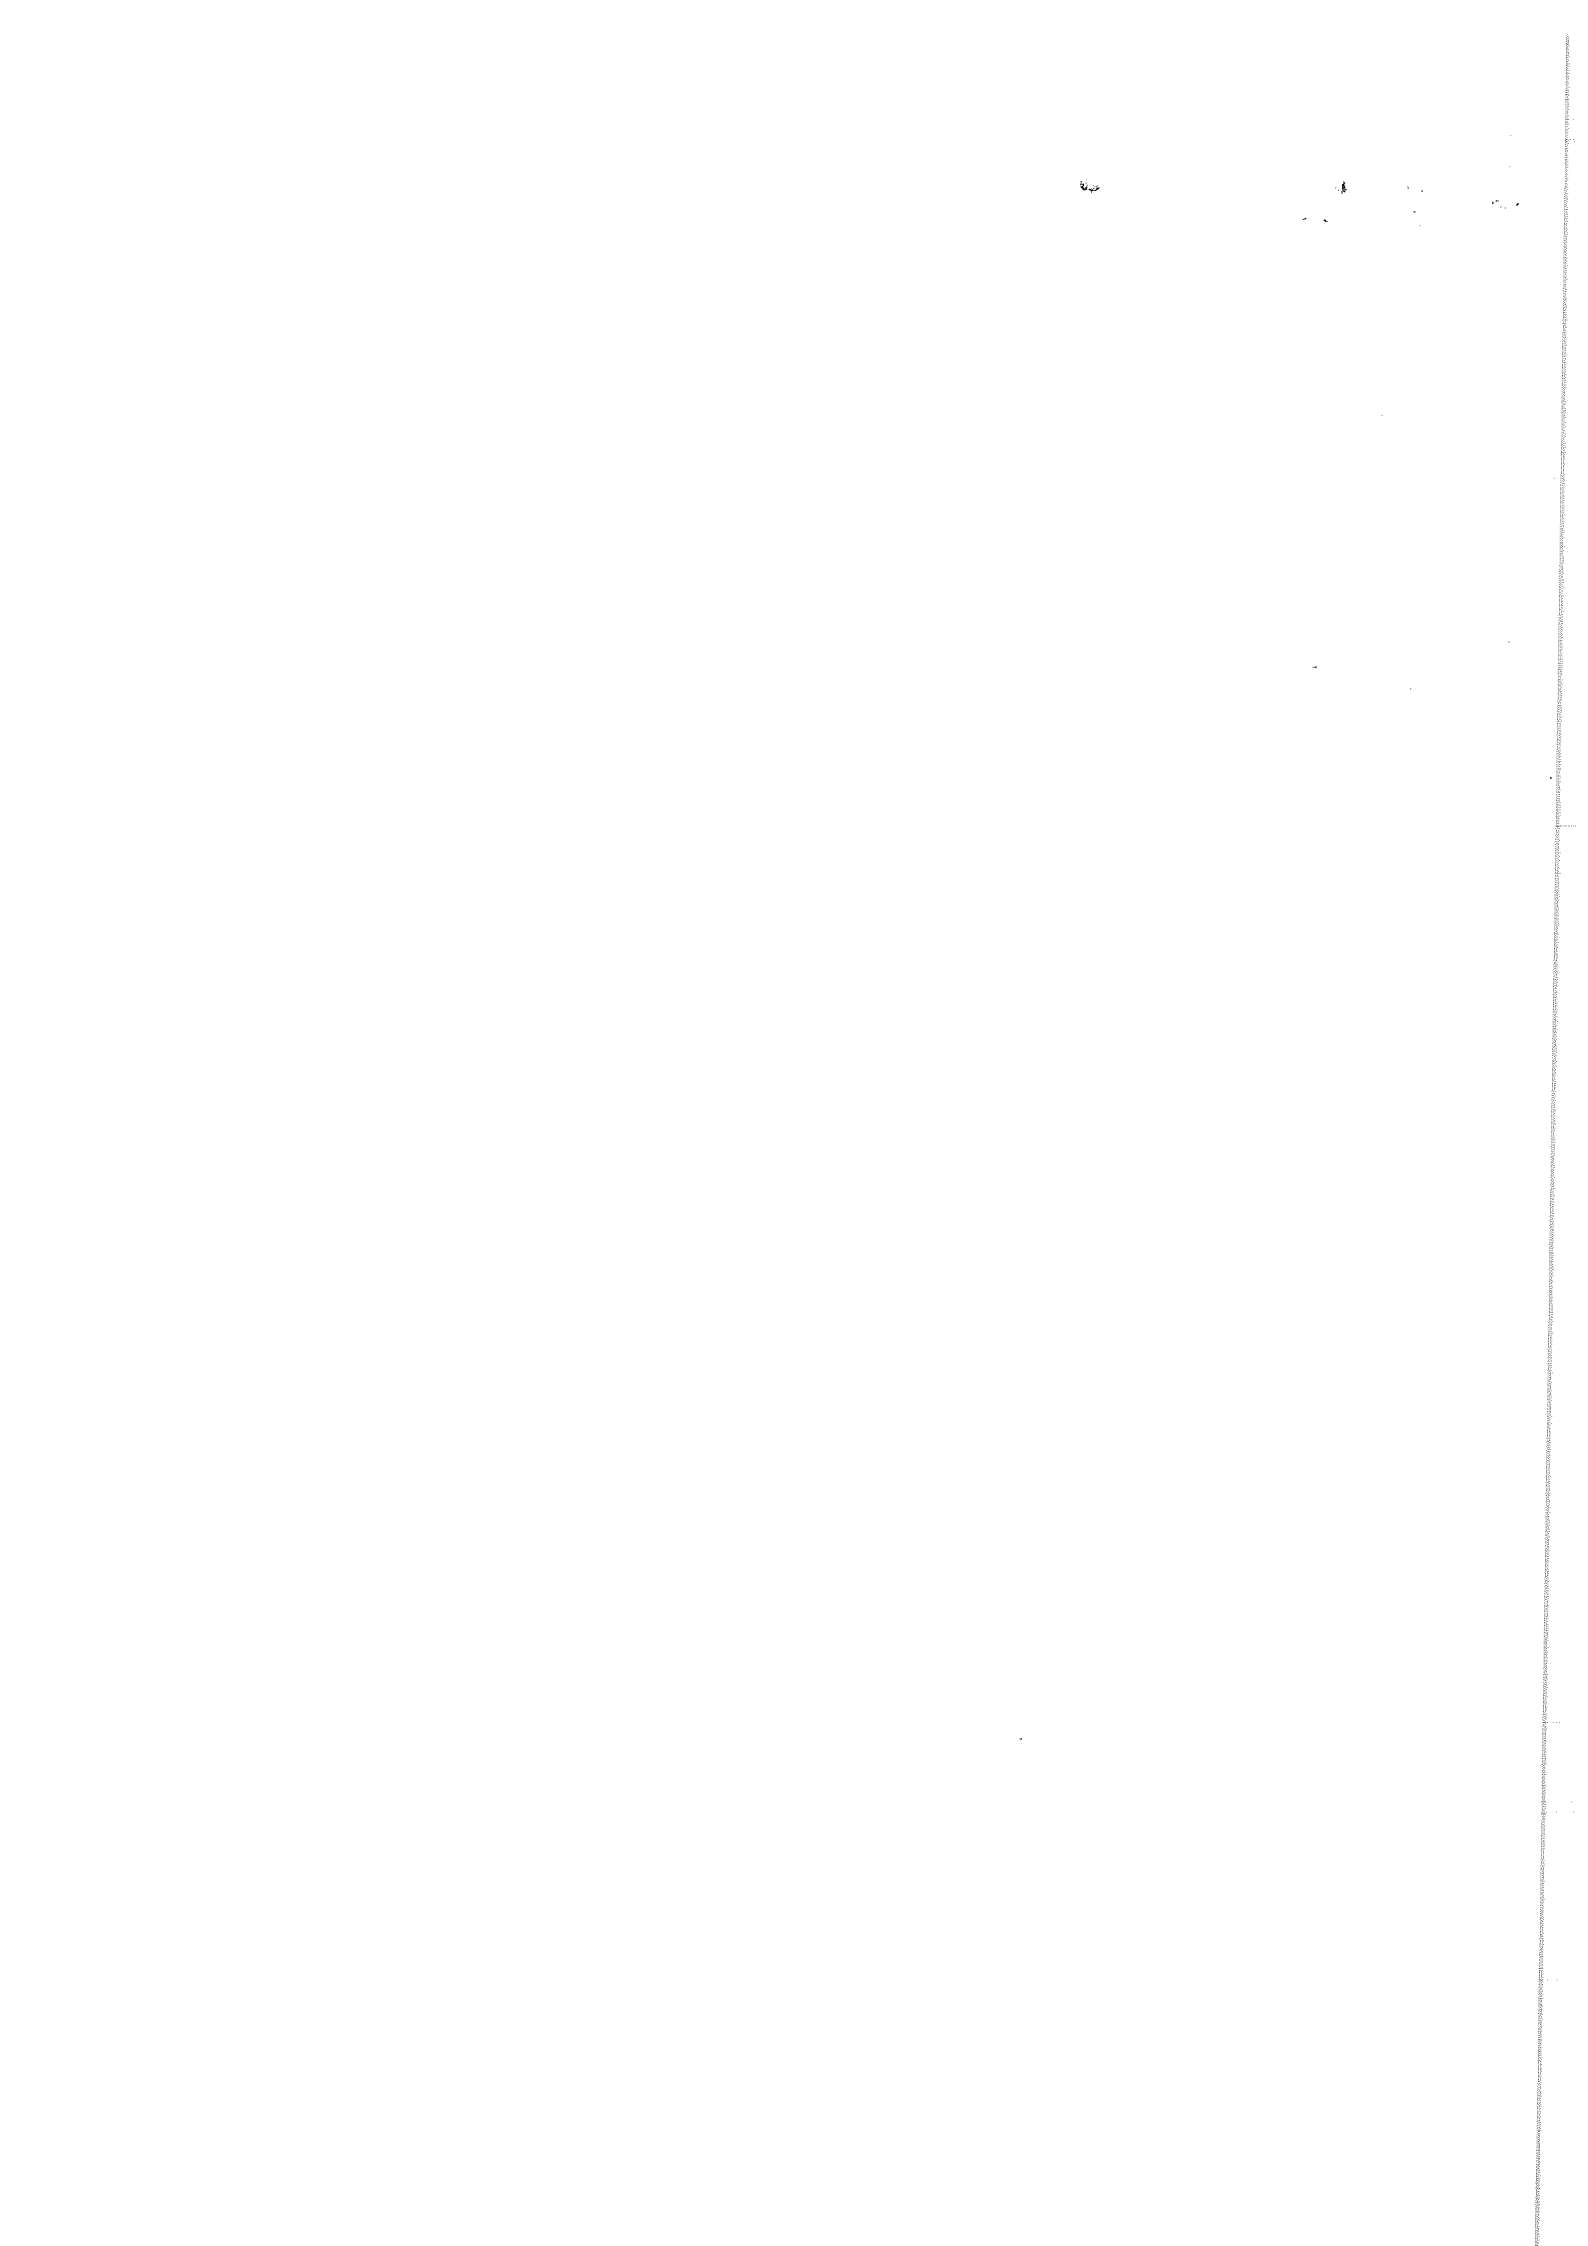

Одговор по поставени прашања од економски оператори во врска со Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

From : Вања Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Wed, Apr 08, 2020 03:21 PM

Subject : Одговор по поставени прашања од економски оператори во врска со Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

Всс : Сандра Веловска <sandra.velovska@zdravstvo.gov.mk>, Ljupco Balkoski <ljupco.balkoski@zdravstvo.gov.mk>, Elena Petrovska <elena.petrovska@zdravstvo.gov.mk>, Damjan Hristov <damjan.hristov@zdravstvo.gov.mk>, Jovan Grpovski <jovan.grpovski.piu@zdravstvo.gov.mk>, contact@jbt-ait.com, contact@kenpanel.mk, blagoj@brako.com.mk, sonjakrstic@yahoo.com

Почитувани,

Во врска со повеќе прашања кои еден од економските оператори ги постави, ве известуваме за следното:

Во однос на Прашањата 1, 2 и 3 кои се однесуваат на предлози за измена на техничкото решение во однос на понуденото идејно решение ве известуваме дека:

Одговор на прашањата 1, 2, и 3: Имајќи во предвид дека станува збор за набавка на принципот клуч на рака , секое техничко решение кое е во насока на подобра и поефикасна експлоатација и одржување а не се променува суштински техничката спецификација, карактеристиките и функционалноста на монтажните објекти е прифатливо за договорниот орган.

Прашање 4 - Во техничката спецификација на секоја посебна единица имате специфицирано дека треба да има IP табла. Тоа подразбира дека Вие ќе доведете кабел до скеоја IP табла на кој ние ќе се приклучиме. За да можеме да ја специфицираме опремата која треба да ја испорачаме Ве молиме за потврда на истото како и позиција на која треба IP таблите да бидат поставени.

Одговор : Се потврдува, дека договорниот орган ќе спроведе кабел од приклучно место до IP табла, позицијата на таблите дополните разработено согласно разработено решение;

Прашање 5 :Дали вратата кои што се специфицирани во сместувачкиот дел треба да биде имаат светол отвор 1050x2050? Препорачуваме да биде светол отвор од 1050mm како би можел болнички кревет непречено да поминува. Ве молиме за потврда.

Одговор : Да, димензиите на сите позиции за врати се однесуваат на светол отвор;

Прашање 6: Дали каде што е специфицирано лед осветлувањето од 18W се мисли „компатибилно на неонско осветлувањето од 18W,,?

Одговор: Да, во тендерската документација е напоменато правилото „или еквивалентно“.

Прашање 7 Во делот 2 кај табелата која треба да се користи за понуда, точка 3 ви е Монтажен објект медицински, истиот во текстот претходно не е даден опис. Дали можеме да подразбереме дека тоа е контейнер остава без прозор како што гледаме од скицата со електрична инсталација (осветлување и приклучок за струја). Ве молиме за потврда.

Одговор: Монтажниот објект медицински објект, истиот има опис во дел 1, точка 3, (медицински персонал) и се однесува на „Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (медицински персонал)“.

Прашање 8. Нашиот технички тим ја прегледа документацијата каде најде на разидување во дел од техничкиот текстуален опис и техничкиот цртеж а се со можност за добивање на подобра функционалност и подобра понуда би сакале да ги појасниме следните работи во дел 2 точка 3 од спецификацијата:

- 2 ПВЦ врати 850мм x 2050мм => не се предвидени на техничкиот цртеж
- 1 двокрилна ПВЦ врата 2/900/2050мм => предходно е ставена е во спецификацијата на дел 2 точка 2 и овдека се дуплира и како таква е непотребна. Ве молиме за потврда.
- 13 ПВЦ еднокрилни прозори со термопан стакло => кога споредуваме со техничката спецификација утврдуваме дека се потребни 6 прозори, Ве молиме за потврда.

Одговор: Во врска со поставеното прашање за дел 2 точка 3 од спецификацијата, Ве известуваме за следното:

- 2 ПВЦ врати 850мм x 2050мм - да не се вклучуваат во понудата
- 1 двокрилна ПВЦ врата 2/900/2050мм - да не се вклучуваат во понудата
- 13 ПВЦ еднокрилни прозори со термопан стакло – во понудата да се вклучат 6 ПВЦ еднокрилни прозори како по скицата

Прашање 9. Во дел 3 во изработка на топлата врска се ставени дека се потребни 8ком ПВЦ еднокрилни прозори со термопан стакло додека според техничкиот цртеж се 18ком скицирани на истиот. Ве молиме за потврда дали се 8 или 18 ком ПВЦ прозорци.

Одговор: Точната количина е 18 прозори;

Прашањето 10 кое се однесува на делот за антикорозивната заштита, за истото договорниот орган го дава следниот:

Одговор: Да, во тендерската документација е напоменато правилото „или еквивалентно“.

Прашање 11: Потребна ни е информација од Ваша страна околу Вашите потреби за инсталирана моќност по сместувачка болничка соба за болнички потреби (болнички апарати, респиратори, дополнителна медицинска опрема).

Одговор: Во врска со ова прашање одговор ќе биде испратен во најбрз можен рок а по добивање на официјалните потреби од страна на крајните корисници во објектот, или истото ќе биде допрецизирано за време на преговарањето.

Прашање 12: Потребна ни е информација од Ваша страна околу Вашите потреби за инсталирана моќност по монтажаен објект за медицински персонал за болнички потреби (болнички апарати, респиратори, дополнителна медицинска опрема).

Одговор: Во однос на инсталирана моќност по монтажаен објект за медицински персонал за болнички потреби ве известуваме дека за исотот важи наведеното во Техничките спецификации од Тендерската документација.

Поздрав,

Вања Андонова, д-р
Кабинет на Министер во Министерството за здравство
ул.50-та Дивизја 14, 1000 Скопје
тел: 023112500 лок:225
www.moh.gov.mk

Fwd: Прашање Итно

From : Вања Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Wed, Apr 08, 2020 08:45 PM

Subject : Fwd: Прашање Итно

Всс : contact@jbt-ait.com, contact@kenpanel.mk, sonjkrstic@yahoo.com, blagoj@brako.com.mk, Ljupco Balkoski <ljupco.balkoski@zdravstvo.gov.mk>, Сандра Беловска <sandra.velovska@zdravstvo.gov.mk>, Elena Petrovska <elena.petrovska@zdravstvo.gov.mk>, Jovan Grpovski <jovan.grpovski.piu@zdravstvo.gov.mk>, Damjan Hristov <damjan.hristov@zdravstvo.gov.mk>

Почитувани,

Подолу во овој меил ви доставувам одговор од крајни корисници а во врска со поставеното Прашање 10.

Поздрав,

Вања Андонова, д-р
Кабинет на Министер во Министерството за здравство
ул.50-та Дивизја 14, 1000 Скопје
тел: 023112500 лок:225
www.moh.gov.mk

----- Forwarded Message -----

From: "Milena Stevanovic"

To: "Вања Андонова" <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Sent: Wednesday, April 8, 2020 8:25:40 PM

Subject: Re: Прашање Итно

Zdravo Vanja, duri sega ja gledam porakata. Sigurno ke se koristat aparti od tipot na pulsoksimetri, monitori, ali toa ne e nekoj golem potrosuvac na struja bar taka mislam a sto se odnesuva na moknosta, koristat 220 v , standardni prikljucoci Ako toa bese prasanjeto :)
Poz. Milena

> On Apr 8, 2020, at 15:21, Вања Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>:
> Почитувани,
>

> Во врска со мобилната болница која се планира да се постави на платото до ЈЗУ УК за Инфективни и фебрилна состојби, со сместувачки капацитет од 12 мобилни контејнери , секој за сместување на по 6 лица, Ве молиме за информација дали во истата е планирано користење на медицински апарати за кои е потребна дополнителна електрична енергија од веќе планираното. Доколку е планирано ве молам наведете кои и која е потребната моќност на електрична енергија? Прашањата се однесуваат на потребата од тоа каква медицинска опрема ќе се користи во болничките соби.

- >
 - > Со почит,
 - >
 - > Вања Андонова, д-р
 - > Кабинет на Министер во Министерството за здравство
 - > ул.50-та Дивизја 14, 1000 Скопје
 - > тел: 023112500 лок:225
 - > www.moh.gov.mk
 - >
-

Fwd: Прашање Итно

From : Вања Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Wed, Apr 08, 2020 04:31 PM

Subject : Fwd: Прашање Итно

Всс : contact@jbt-ait.com, contact@kenpanel.mk, blagoj@brako.com.mk, sonjakrstic@yahoo.com, Ljupco Balkoski <ljupco.balkoski@zdravstvo.gov.mk>, Сандра Веловска <sandra.velovska@zdravstvo.gov.mk>, Damjan Hristov <damjan.hristov@zdravstvo.gov.mk>, Elena Petrovska <elena.petrovska@zdravstvo.gov.mk>, Jovan Grovski <jovan.grovski.piu@zdravstvo.gov.mk>

Почитувани,

Подолу во овој меил ви го доставувам одговорот од крајните корисници а во врска со поставеното Прашање 10.

Поздрав,

Вања Андонова, Диа
Кабинет на Министер во Министерството за здравство
ул.50-та Дивизија 14, 1000 Скопје
тел: 023112500 лок:225
www.moh.gov.mk

----- Forwarded Message -----

From: "маја мојсова"
To: "Вања Андонова" <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>
Sent: Wednesday, April 8, 2020 4:21:05 PM
Subject: Re: Прашање Итно

Vo mobilnata bolnica ne se planiraat respiratorno zavisni pacienti. Sekako vo taa ke treba dovod na kislorod. Se drugo koe e respiratorno zavisno bi trebalo da se stacionira vo infektivna kkinika- cvrsta gradba . Sekako polesno za menadziranje od zdravstven personal

Pozdrav

- > Почитувани,
 - >
 - > Во врска со мобилната болница која се планира да се постави на платото до
 - > ЈЗУ УК за Инфективни и фебрилна состојби, со сместувачки капацитет од 12
 - > мобилни контејнери , секој за сместување на по 6 лица, Ве молиме за
 - > информација дали во истата е планирано користење на медицински апарати за
 - > кои е потребна дополнителна електрична енергија од веќе планираното.
 - > Доколку е планирано ве молам наведете кои и која е потребната моќност на
 - > електрична енергија? Прашањата се однесуваат на потребата од тоа каква
 - > медицинска опрема ќе се користи во болничките соби.
 - >
 - > Со почит,
 - >
 - > Вања Андонова, д-р
 - > Кабинет на Министер во Министерството за здравство
 - > ул.50-та Дивизија 14, 1000 Скопје
 - > тел: 023112500 лок:225
 - > www.moh.gov.mk
 - >
 - >
-

RE: Прашања од страна на ДПТУ Брако ДОО во врска со Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

From : Blagoj Shalev <blagoj@brako.com.mk>

Wed, Apr 08, 2020 01:46 PM
3 attachments

Subject : RE: Прашања од страна на ДПТУ Брако ДОО во врска со Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

To : Вања Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Сс : Dejan Gosevski <dejan.gosevski@brako.com.mk>, Dragan Panov <dragan.panov@brako.com.mk>, Aleksandar Naumov <aleksandar@brako.com.mk>, Nikola Gravchev <nikola.gravchev@brako.com.mk>, Zoran Strahilov <sales@brako.com.mk>


Почитувани,

Најпрвен да се извинам за покое маил-ови кои ги испраќаме но се надевам дека ќе прифатите дека се работи со цел да се добие поточно и подобро техничко решение, а со оглед на целокупната ситуација и итност испраќаме прашања како што се согледуваат.


11. Потребна ни е информација од Ваша страна околу Вашите потреби за инсталирана моќност ПО СМЕСТУВАЧКА БОЛНИЧКА СОБА ЗА БОЛНИЧКИ ПОТРЕБИ (БОЛНИЧКИ АПАРАТИ, РЕСПИРАТОРИ, ДОПОЛНИТЕЛНА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА).
12. Потребна ни е информација од Ваша страна околу Вашите потреби за инсталирана моќност ПО МОНТАЖЕН ОБЈЕКТ ЗА МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА БОЛНИЧКИ ПОТРЕБИ (БОЛНИЧКИ АПАРАТИ, РЕСПИРАТОРИ, ДОПОЛНИТЕЛНА МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА).

Поздрав / Best regards

Blagoj Shalev | CEO | DPTU BRAKO DOO Veles, Macedonia
| M: +389 78 265 358 | www.brako.com.mk



Before you print think about the ENVIRONMENT

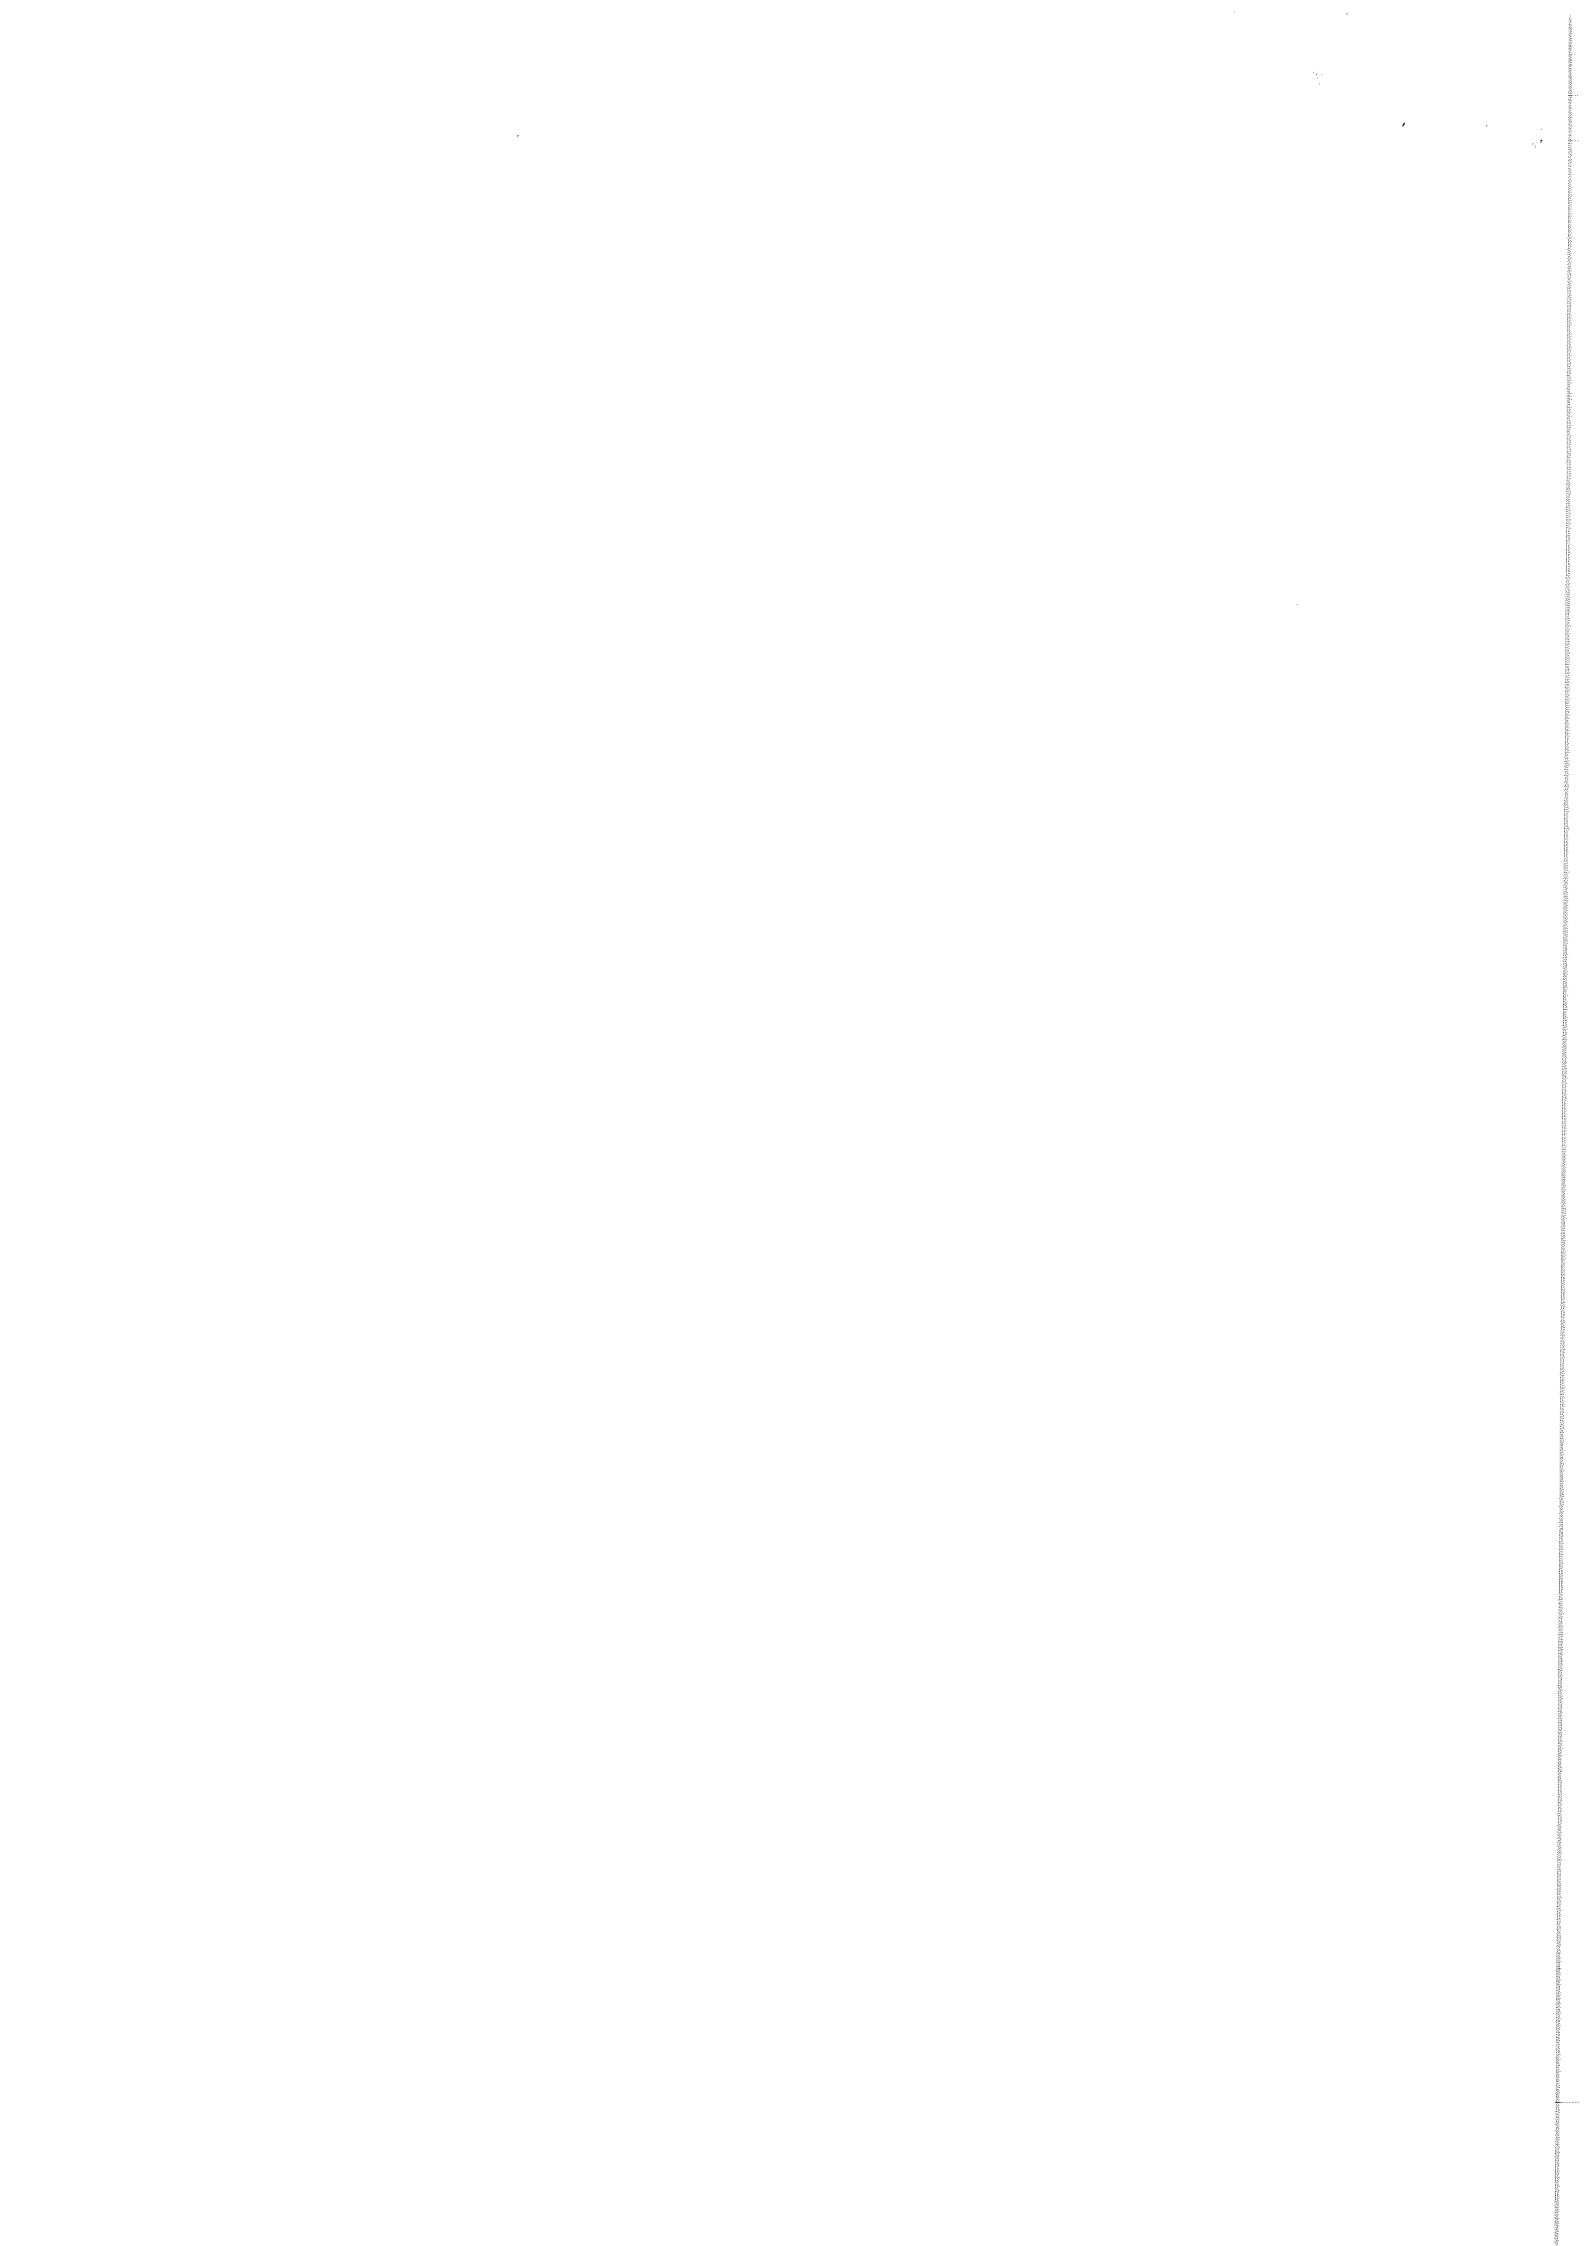

RE: Прашања од страна на ДПТУ Брако ДОО во врска со Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

From : Blagoj Shalev <blagoj@brako.com.mk>

Wed, Apr 08, 2020 01:35 PM
 3 attachments

Subject : RE: Прашања од страна на ДПТУ Брако ДОО во врска со Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

To : Вања Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Сс : Dejan Gocovski <dejan.gocovski@brako.com.mk>, Dragan Panov <dragan.panov@brako.com.mk>, Aleksandar Naumov <aleksandar@brako.com.mk>, Nikola Gravchev <nikola.gravchev@brako.com.mk>, Zoran Strahilov <sales@brako.com.mk>

Почитувани,


Согласно нашите подолу наведени прашање би сакале би сакале да додадеме дополнително предлог (10) кои беше разгледан од страна на нашиот стручен технички тим, кој врз база на нашето долгогодишно искуство посебно во делот на антикорозивната заштита. Имено нашата фабрика во делот на антикорозивна заштита ја има усвоено како технологија далеку поквалитетна и поотпорна на секаков вид на надворешни влијаниа „ електростатско прашкасто фарбање со индустриска полиестерска боја„. Ве молиме за потврда дека овој начин на антикорозивна заштита би бил прифатлив од Ваша страна а се со цел како поквалитетно и подолготрајно решение. Имено сакам само да дадам дека оваков тип на заштита се сметка како ЗАДОЛЖИТЕЛЕН СТАНДАРД во медицинската програма.

Поздрав / Best regards


Blagoj Shalev | CEO | DPTU BRAKO DOO Veles, Macedonia
 | М: +389 78 265 358 | www.brako.com.mk

BRAKO



 Before you print think about the ENVIRONMENT

From: Blagoj Shalev
Sent: Wednesday, April 8, 2020 11:53 AM
To: 'Вања Андонова' <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

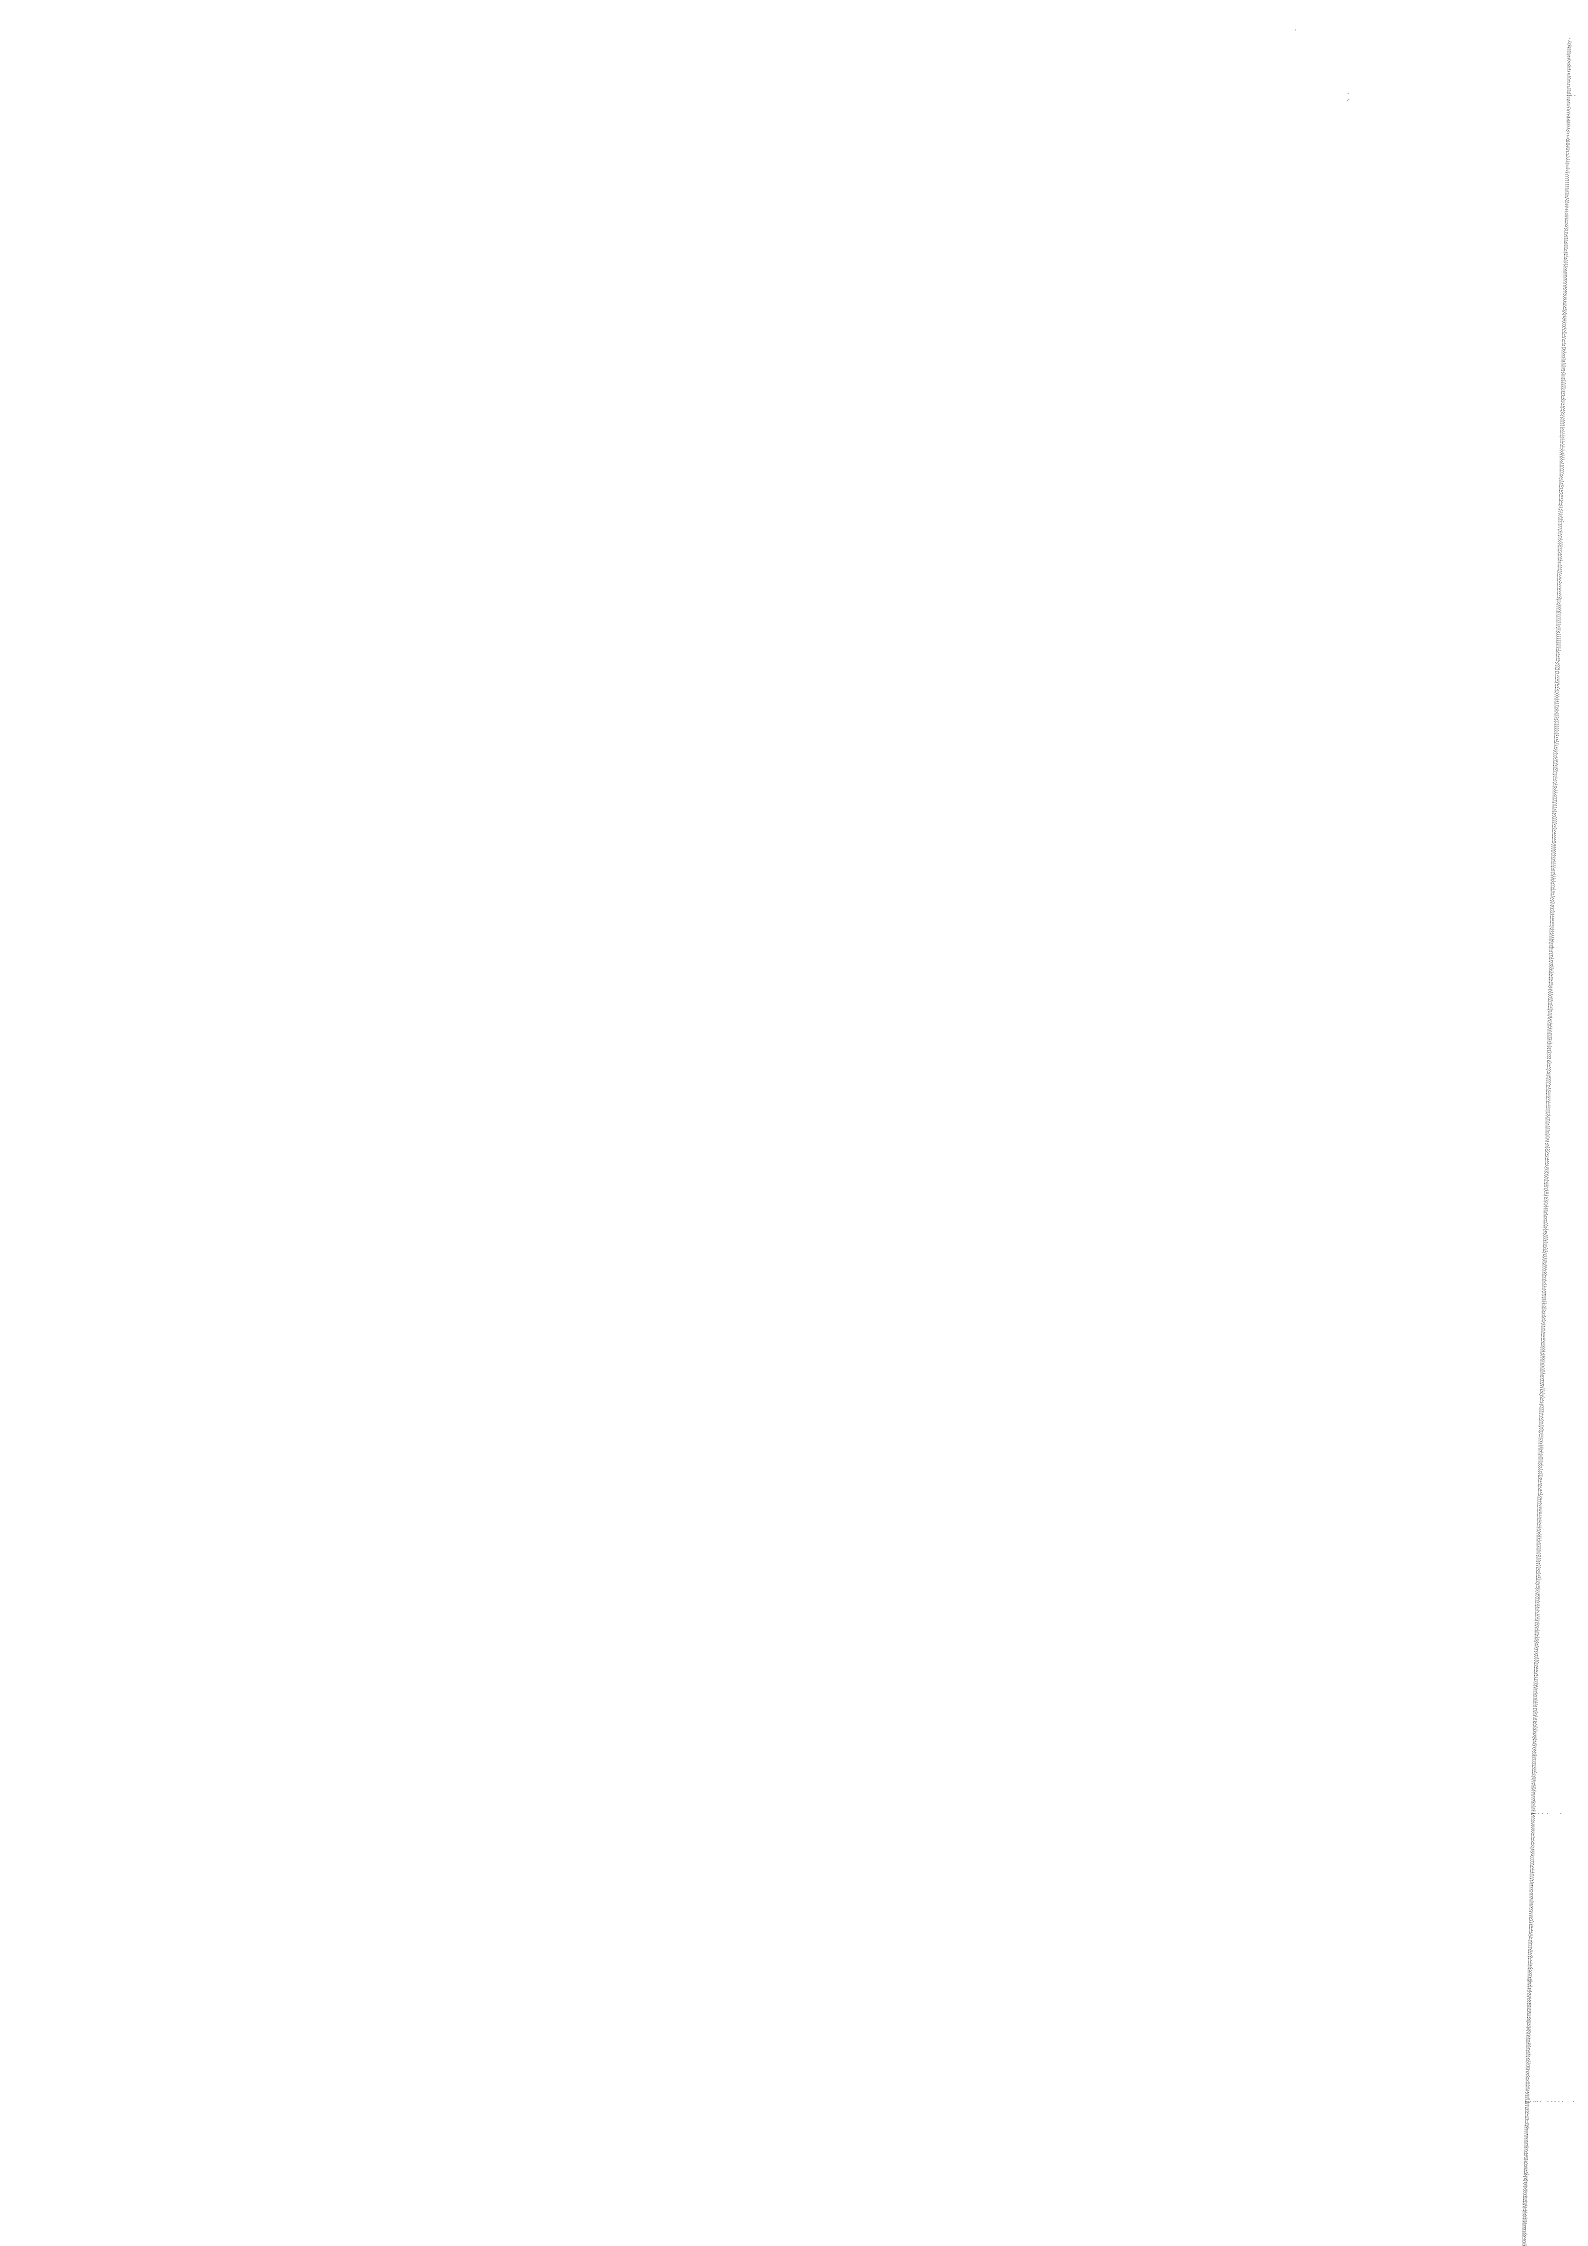

Прашања од страна на ДПТУ Брако ДОО во врска со Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

From : Blagoj Shalev <blagoj@brako.com.mk>

Wed, Apr 08, 2020 11:53 AM

Subject : Прашања од страна на ДПТУ Брако ДОО во врска со Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

3 attachments

To : Вања Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Cc : Dejan Gosevski <dejan.gosevski@brako.com.mk>, Dragan Panov

<dragan.panov@brako.com.mk>, Aleksandar Naumov <aleksandar@brako.com.mk>, Nikola

Gravchev <nikola.gravchev@brako.com.mk>, Zoran Strahilov <sales@brako.com.mk>

Почитувани,

Ви благодариме на Вашиот маил Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност и ценејќи ја настаната ситуација во нашата држава сакам да ја искажам нашата спремност како Брако да целокупната наша техничка експертиза и нашите технички можности ги ставиме во функција на изработка овој проект. Поради тоа уште веднаш нашиот технички тим ја разгледа испратената документација и се со цел добивање на најдобро функционално решение, би сакале да поставиме некои прашања, како би биле во можност и да дадеме попрецизна понуда за истите:

1. Нашиот предлог за измена на техничкото решение е да помеѓу сместувачките соби односно помеѓу сите објекти во делот 2 (сместувачки соби, канцеларии, тоалети) да се остави простор од 200mm се со цел пристап и можност за чистење на олуците и избегнување на внатрешни олуци и можност за нивно запушување и протекување во собите. Цениме дека ова решение од аспект на експлоатација и понатамошно одржување е доста подобро и поефикасно за Вас. Ова го кажуваме поради нашето долгогодишно искуство со оваа проблематика. Со оваката промена би се добил ходник (помеѓу сместувачките објекти) во делот 2. ПОДОЛГ ЗА 1600 mm.
2. Предлагаме техничка измена во делот 1 топла врска, да контејнерите бидат разделени 200mm од шаторите се со цел поефикасна монтажа, чистење, а и понатамошна демонтирање на објектите (шатори и контејнери) но со ова би избегнале и било какви на оштетување на шаторите заради триење со контејнерите .
3. Од нашиот увид на место увидовме дека можеби (ќе се потврди со геодетски снимање кое ќе го извршиме пред монтажа) правецот на шаторите до влезот на постојната цврста грамба не е во права врска туку има девијациа. Поради ова предлагаме адаптација со закосување во делот 3 топла врска. Ве замолуваме за дозвола да биде извршена адаптација согласно условите на теренот.
4. Во техничката спецификација на секоја посебна единица имате специфицирано дека треба да има IP табла. Тоа подразбира дека Вие ќе доведете кабел до секоја IP табла на кој ние ќе се приклучиме. За да можеме да ја специфицираме опремата која треба да ја испорачаме

Ве молиме за потврда на истото како и позиција на која треба IP таблите да бидат поставени.

5. Дали вратата кои што се специфицирани во сместувачкиот дел треба да биде имаат светол отвор 1050x2050? Препорачуваме да биде светол отвор од 1050mm како би можел болнички кревет непречено да поминува. Ве молиме за потврда.
6. Дали каде што е специфицирано лед осветлувањето од 18W се мисли „компатибилно на неонско осветлувањето од 18W,,? ”
7. Во делот 2 кај табелата која треба да се користи за понуда, точка 3 ви е Монтажен објект медицински, истиот во текстот претходно не е даден опис. Дали можеме да продрозбереме дека тоа е контейнер остава без прозор како што гледаме од скицата со електрична инсталација (осветлување и приклучок за струја). Ве молиме за потврда..
8. Нашиот технички тим ја прегледа документацијата каде најде на разидување во дел од техничкиот текстуален опис и техничкиот цртеж а се со можност за добивање на подобра функционалност и подобра понуда би сакале да ги појасниме следните работи во дел 2 точка 3 од спецификацијата:
 - 2 ПВЦ врати 850мм x 2050мм => не се предвидени на техничкиот цртеж
 - 1 двокрилна ПВЦ врата 2/900/2050мм => предходно е ставена е во спецификацијата на дел 2 точка 2 и овдека се дуплира и како таква е непотребна. Ве молиме за потврда.
 - 13 ПВЦ еднокрилни прозори со термопан стакло => кога споредуваме со техничката спецификација утврдуваме дека се потребни 6 прозори, Ве молиме за потврда.
9. Во дел 3 во изработка на топлата врска се ставени дека се потребни 8ком ПВЦ еднокрилни прозори со термопан стакло => кога споредуваме со термопан стакло додека според техничкиот цртеж се 18ком скицирани на истиот. Ве молиме за потврда дали се 8 или 18 ком ПВЦ прозорци.

Однапред Ви благодарам на брзиот одговор како би можеле да пристапиме кон изработка на понуда а се со цел согледувајќи ја настанатата ситуација во државата поради епидемијата на Covid-19.

Поздрав / Best regards

Blagoj Shalev | CEO | DPTU BRAKO DOO Veles, Macedonia
| M: +389 78 265 358 | www.brako.com.mk

BRAKO



ISO 14001
U-C (Certification)



Before you print think about the **ENVIRONMENT**

Fwd: Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

From : Вања Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Tue, Apr 07, 2020 10:04 PM
3 attachments

Subject : Fwd: Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

Всс : blagoj@brako.com.mk, contact@jbt-ait.com, contact@kenpanel.mk, sonjkrstic@yahoo.com, Makedonska Mirjana EDA МКМ <mirjana.makedonska@eda.admin.ch>, Ljupco Balkoski <ljupco.balkoski@zdravstvo.gov.mk>, Сандра Веловска <sandra.velovska@zdravstvo.gov.mk>

Почитувани,

На барање во прилог ви ја испраќаме последната страна од Тендерската документација во pdf формат за ваше запознавање.

Со почит,

Вања Андонова, Диа
Кабинет на Министер во Министерството за здравство
ул.50-та Дивизија 14, 1000 Скопје
тел: 023112500 лок:225
www.moh.gov.mk

----- Forwarded Message -----

From: "Вања Андонова" <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Sent: Tuesday, April 7, 2020 5:34:58 PM

Subject: Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

Почитувани,

Министерство за здравство , со адреса на ул. 50 Дивизија бр.14, и електронска пошта kontakt@zdravstvo.gov.mk , има потреба од јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност. За таа цел, Министерството за здравство спроведува постапка со преговарање без објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) од Законот за јавните набавки. Ве молиме да ни доставите првична понуда електронски потпишана за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка во согласност со приложената техничка спецификација најдоцна до 09.04.2020 година до 10:00 часот на следната меил адреса: vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk.

Handwritten text in the upper right quadrant, possibly a title or header, including the characters '蒙' and '加'.

A small handwritten mark or character located in the middle right area of the page.

Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите оригиналните обрасци кои се составен дел на тендерската документација.

Молиме, во понудата да наведете и лице кое во име на понудувачот ќе учествува во преговорите за реализација на набавката (име и презиме, контакт телефон).

Однапред благодариме на соработката.

Со почит,

Вања Андонова, д-р
Кабинет на Министер во Министерството за здравство
ул.50-та Дивизја 14, 1000 Скопје
тел: 023112500 лок:225
www.moh.gov.mk

 **V_E_montazni_kontenjeri-smestuvanje_Model_TD.pdf**

312 KB

 **7.4.Tenderska dokumentacija.docx**


569 KB

 **POKANA-kontejneri.pdf**

69 KB

Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна ИТНОСТ**From :** Вања Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Tue, Apr 07, 2020 05:34 PM

Subject : Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност  2 attachments**Vcc :** blagoj@brako.com.mk, contact@jbt-ait.com, sonjakrstic@yahoo.com, contact@kenpanel.mk, mirjana makedonska <mirjana.makedonska@eda.admin.ch>, Ljupco Balkoski <ljupco.balkoski@zdravstvo.gov.mk>, Сандра Веловска <sandra.velovska@zdravstvo.gov.mk>

Почитувани,

Министерство за здравство , со адреса на ул. 50 Дивизија бр.14, и електронска пошта kontakt@zdravstvo.gov.mk , има потреба од јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност. За таа цел, Министерството за здравство спроведува постапка со преговарање без објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) од Законот за јавните набавки. Ве молиме да ни доставите првична понуда електронски потпишана за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка во согласност со приложената техничка спецификација најдоцна до 09.04.2020 година до 10:00 часот на следната меил адреса: vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk.

Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите оригиналните обрасци кои се составен дел на тендерската документација.

Молиме, во понудата да наведете и лице кое во име на понудувачот ќе учествува во преговорите за реализација на набавката (име и презиме, контакт телефон).

Однапред благодариме на соработката.

Со почит,

Вања Андонова, д-р
Кабинет на Министер во Министерството за здравство
ул.50-та Дивизија 14, 1000 Скопје
тел: 023112500 лок:225
www.moh.gov.mk

4/9/2020

 **7.4. Tenderska dokumentacija.docx**

569 KB

 **POKANA-kontejneri.pdf**

69 KB

Zimbra

Понуда за јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

From : Vlatko Serafimovski <vlatko_serafimovski@hotmail.com>

Wed, Apr 08, 2020 11:48 PM
5 attachments

Subject : Понуда за јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

To : Вања Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Сс : contact@kenpanel.mk

Почитувани,

Согласно Вашата покана за доставување на понуда за јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување на оглас од причини од крајна итност во прилог Ви испраќаме

- Прилог 2 - Образец на понуда
- Прилог 3 - Изјава за сериозност на понуда
- Прилог - Технички спецификации
- Потврда за регистрирана дејност

За дополнителни информации контактирајте не.

Ве молам за потврда за прием на овој маил.

Со почит

VLATKO SERAFIMOVSKI

Sales manager

Ken Panel Monting Dooel

Gornovranovska 186 b


Aerodrom, 1000 Skopje, MK

GSM: ++ 389/78 301 868

++ 389/78 360 713

Web: www.kenpanel.mk

Fan Page: <https://www.facebook.com/pages/Ken-Panel/536501109749019?ref=hl>

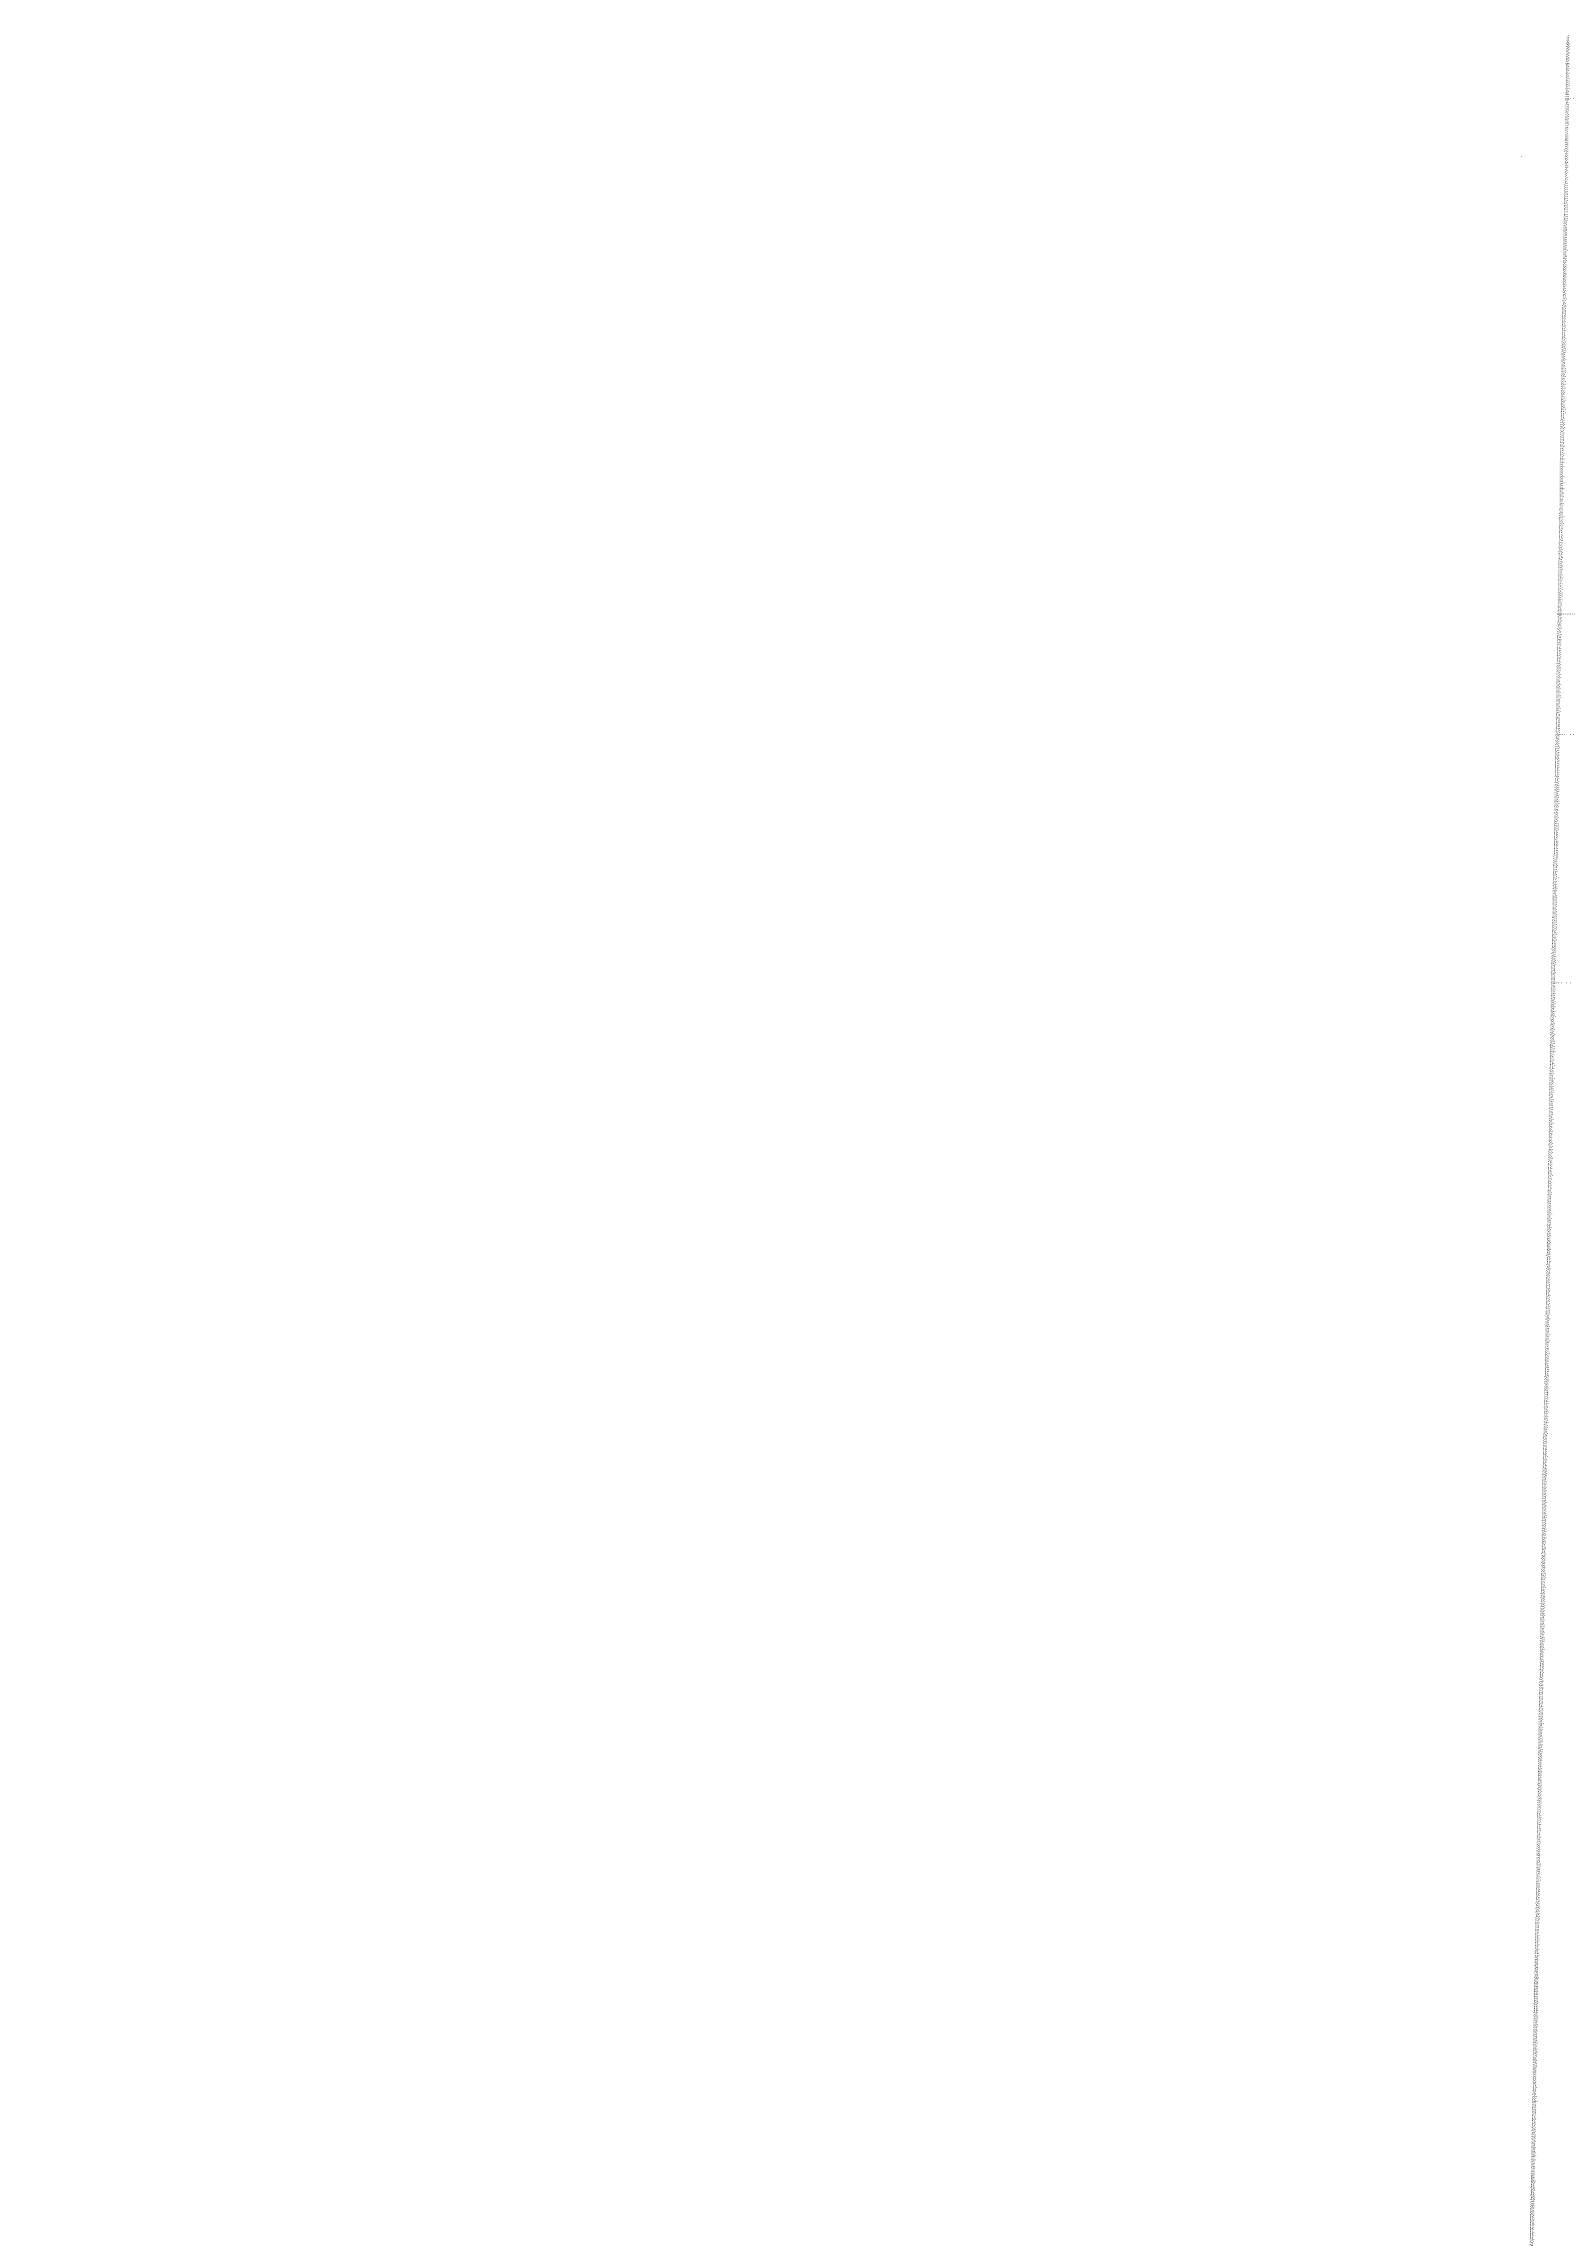


ponuda za montazni kontenjeri

From : Nela Dzilvidzieva <jbt.proinzenering@gmail.com>

Thu, Apr 09, 2020 09:22 AM

Subject : ponuda za montazni kontenjeri

 4 attachments

To : vanja andonova <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

vo prilog vi gi prakame dokumentite za ponuda za montaznite kontenjeri

 **ponuda Proinzenering potpis.pdf**

113 KB

 **izjava Robert potpis.pdf**


98 KB

 **drd proinzenering.pdf**

456 KB

 **7.4.Tenderska dokumentacija bolnica.docx**


514 KB

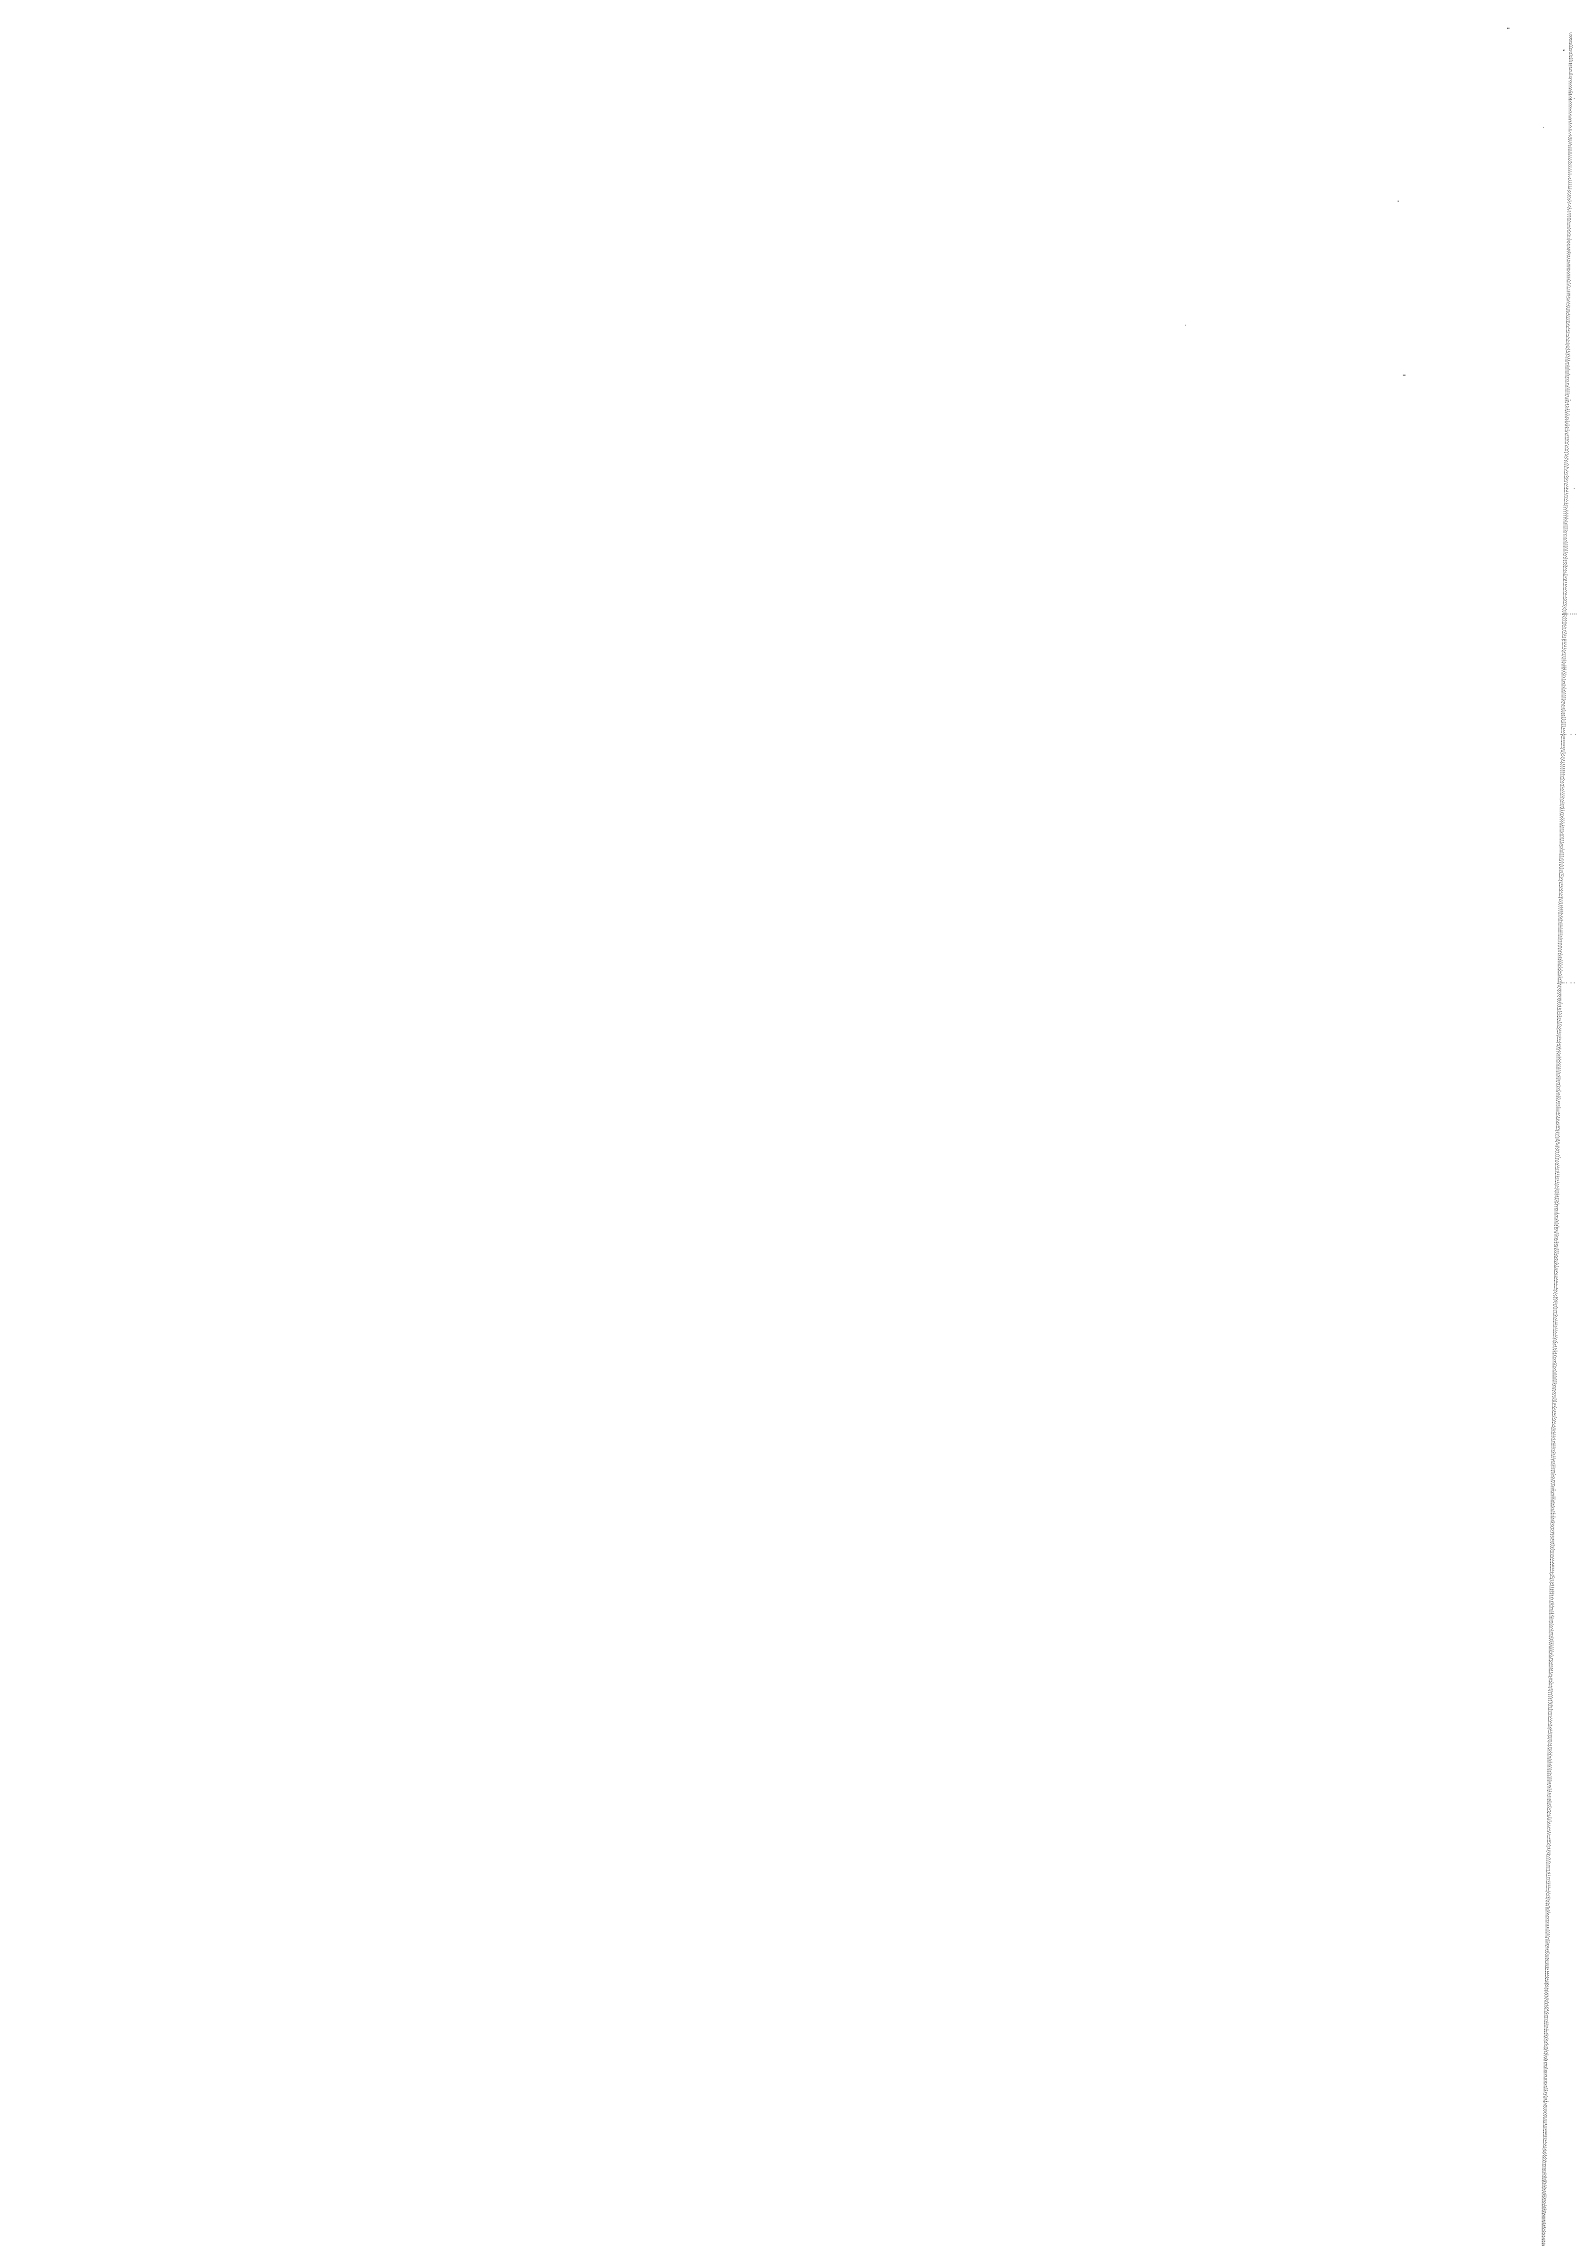

Zimbra**vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk****Dokumenti**


From : Aristotel Isirov <aritomvalandovo@gmail.com>**Subject :** Dokumenti

Thu, Apr 09, 2020 09:23 AM

 2 attachments**To :** vanja andonova <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk> **izjava Aristitel potpisana.pdf**

86 KB

 **ponuda A I T potpisana.pdf**100 KB

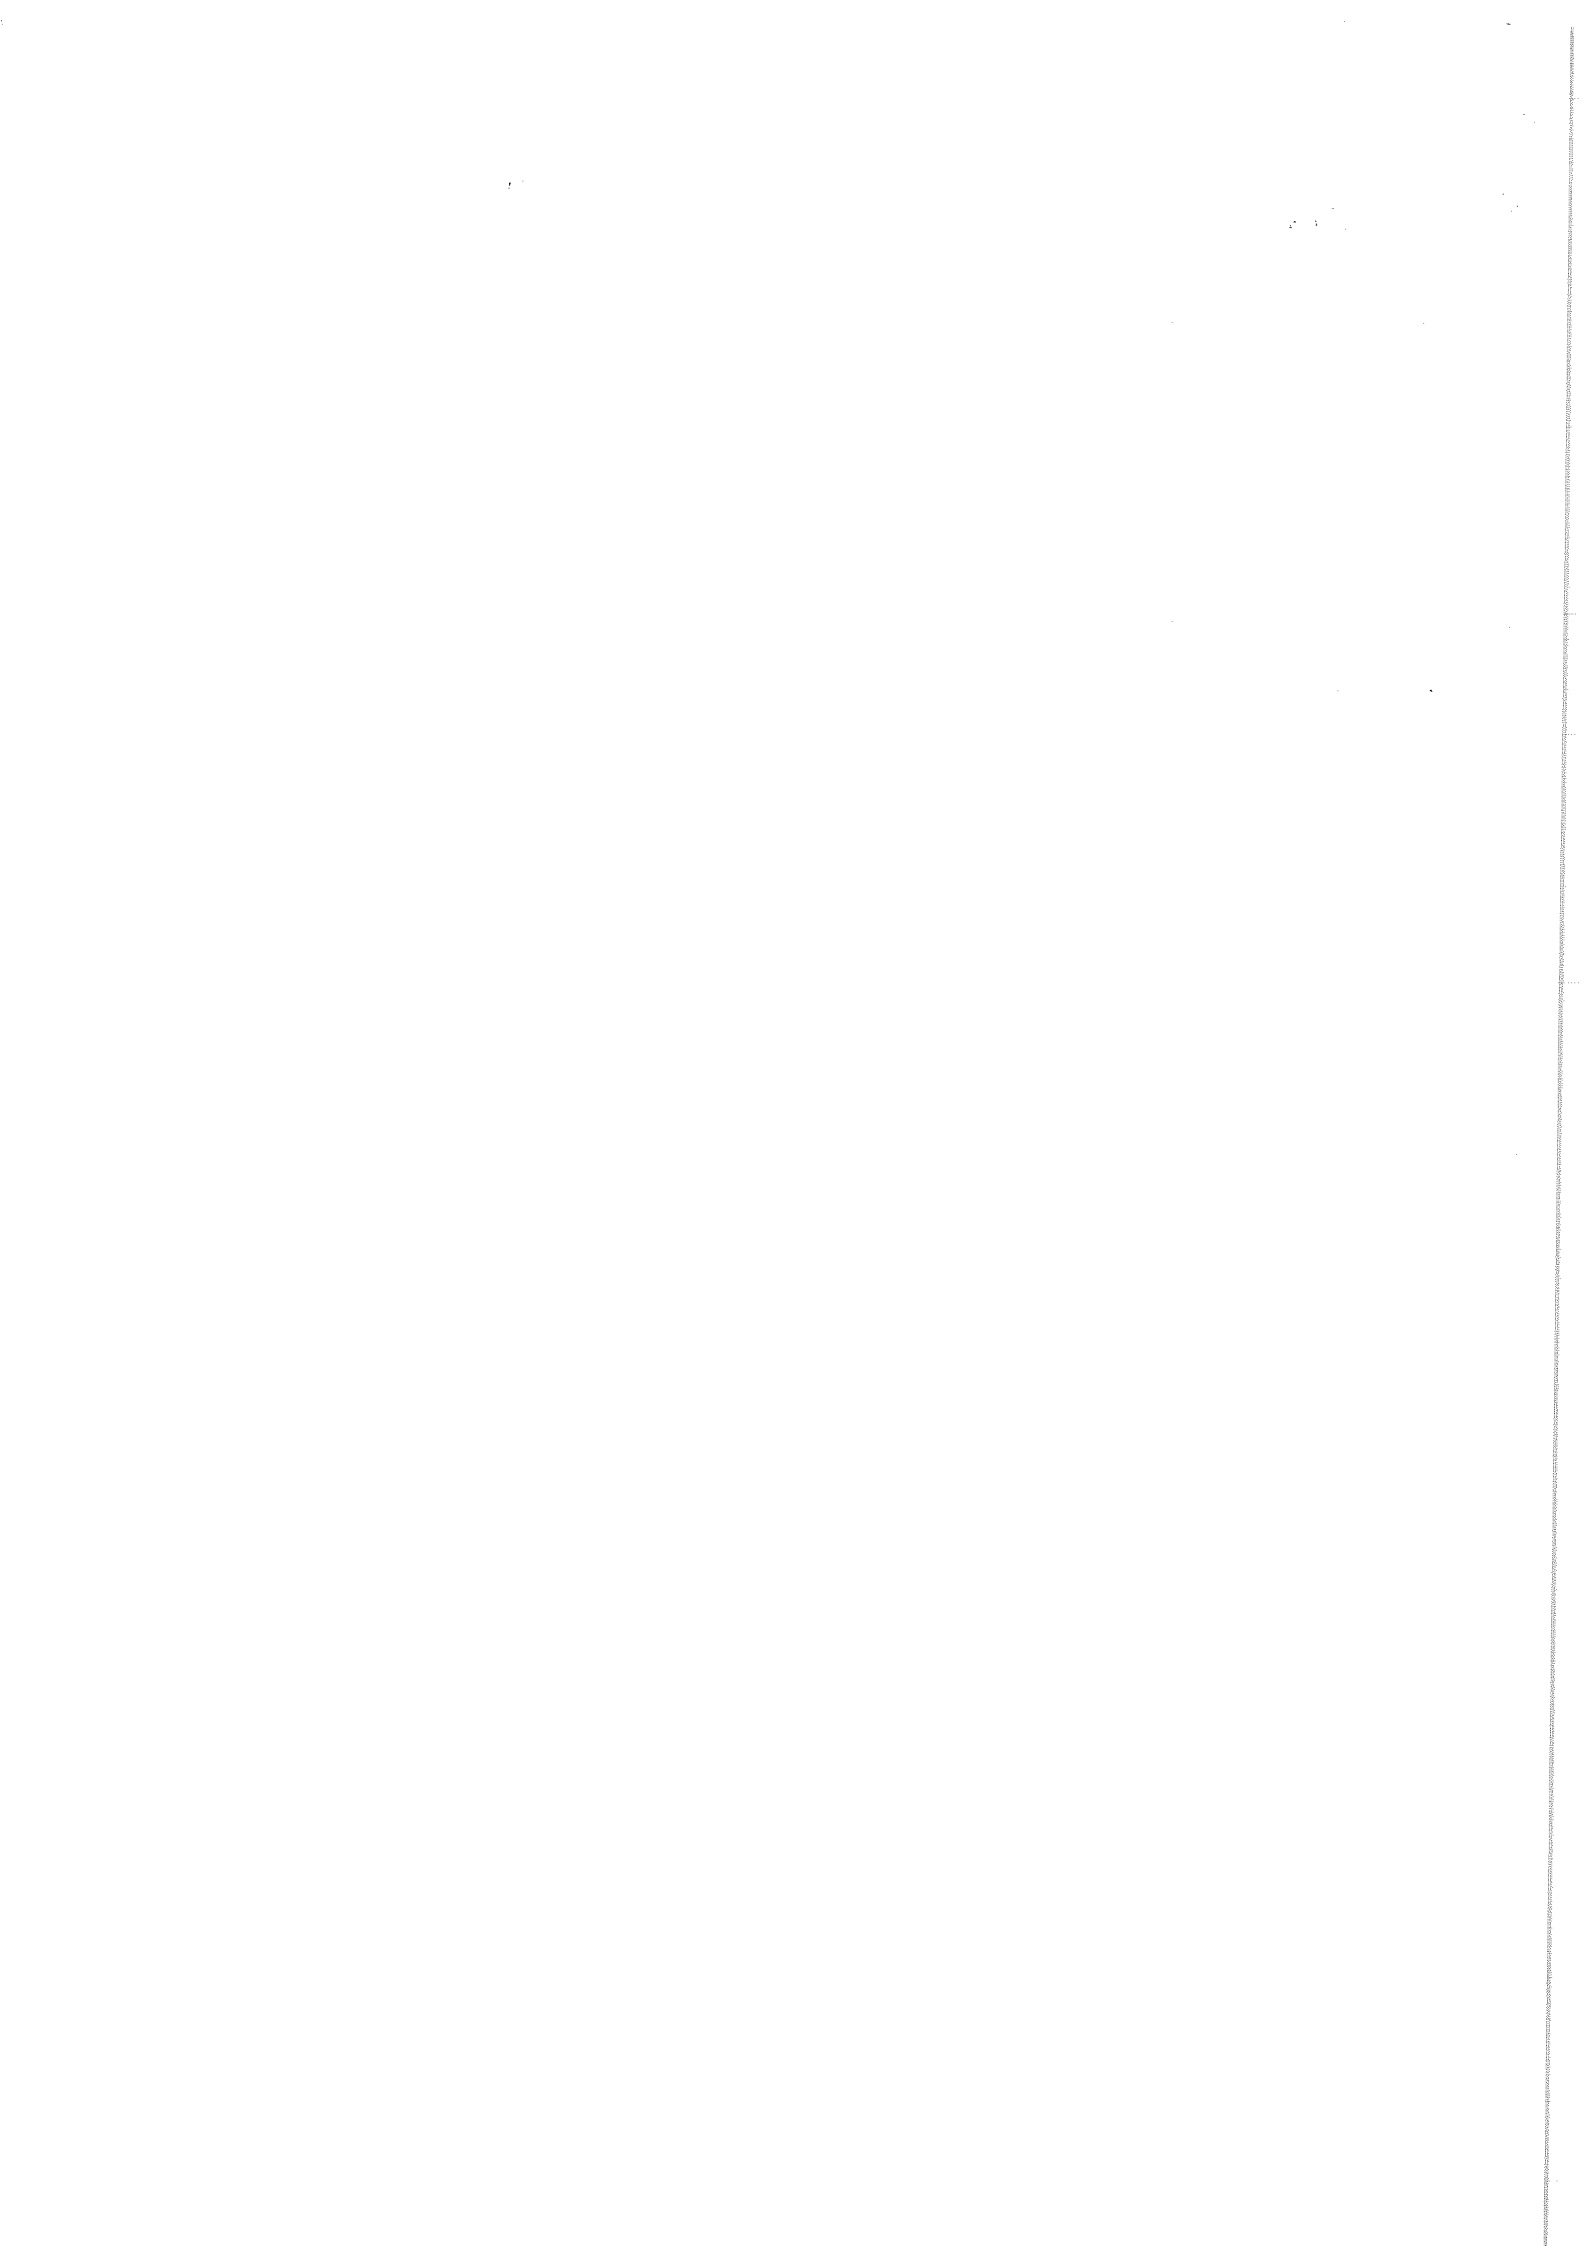

Re: Dokumenti

From : Aristotel Isirov <aritomvalandovo@gmail.com>

Subject : Re: Dokumenti

To : vanja andonova <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Thu, Apr 09, 2020 10:03 AM

 12 attachments

On Thu, Apr 9, 2020 at 9:23 AM Aristotel Isirov <aritomvalandovo@gmail.com> wrote:

 **Потврда за ликвидација potpisan.pdf**

623 KB

 **Список агенција з авработување potpisan.pdf**

750 KB

 **Потврда за регистрирана дејност potpisan.pdf**

684 KB

 **Потврда за стечај potpisan.pdf**


626 KB

 **Izjana potpisan.pdf**


587 KB

 **Тековна состојба potpisan.pdf**


2 MB

 **potvrda za prekrsocna sankcija 3 potpisan.pdf**

631 KB

 **potvrda za prekrsocna sankcija 2 potpisan.pdf**

669 KB

 **potvrda za prekrsocna sankcija potpisan.pdf**

677 KB

 **potvrda za sporedna kazna 3 potpisan.pdf**


673 KB

 **potvrda za sporedna kazna 2 potpisan.pdf**

654 KB

 **potvrda za sporedna kazna potpisan.pdf**

657 KB

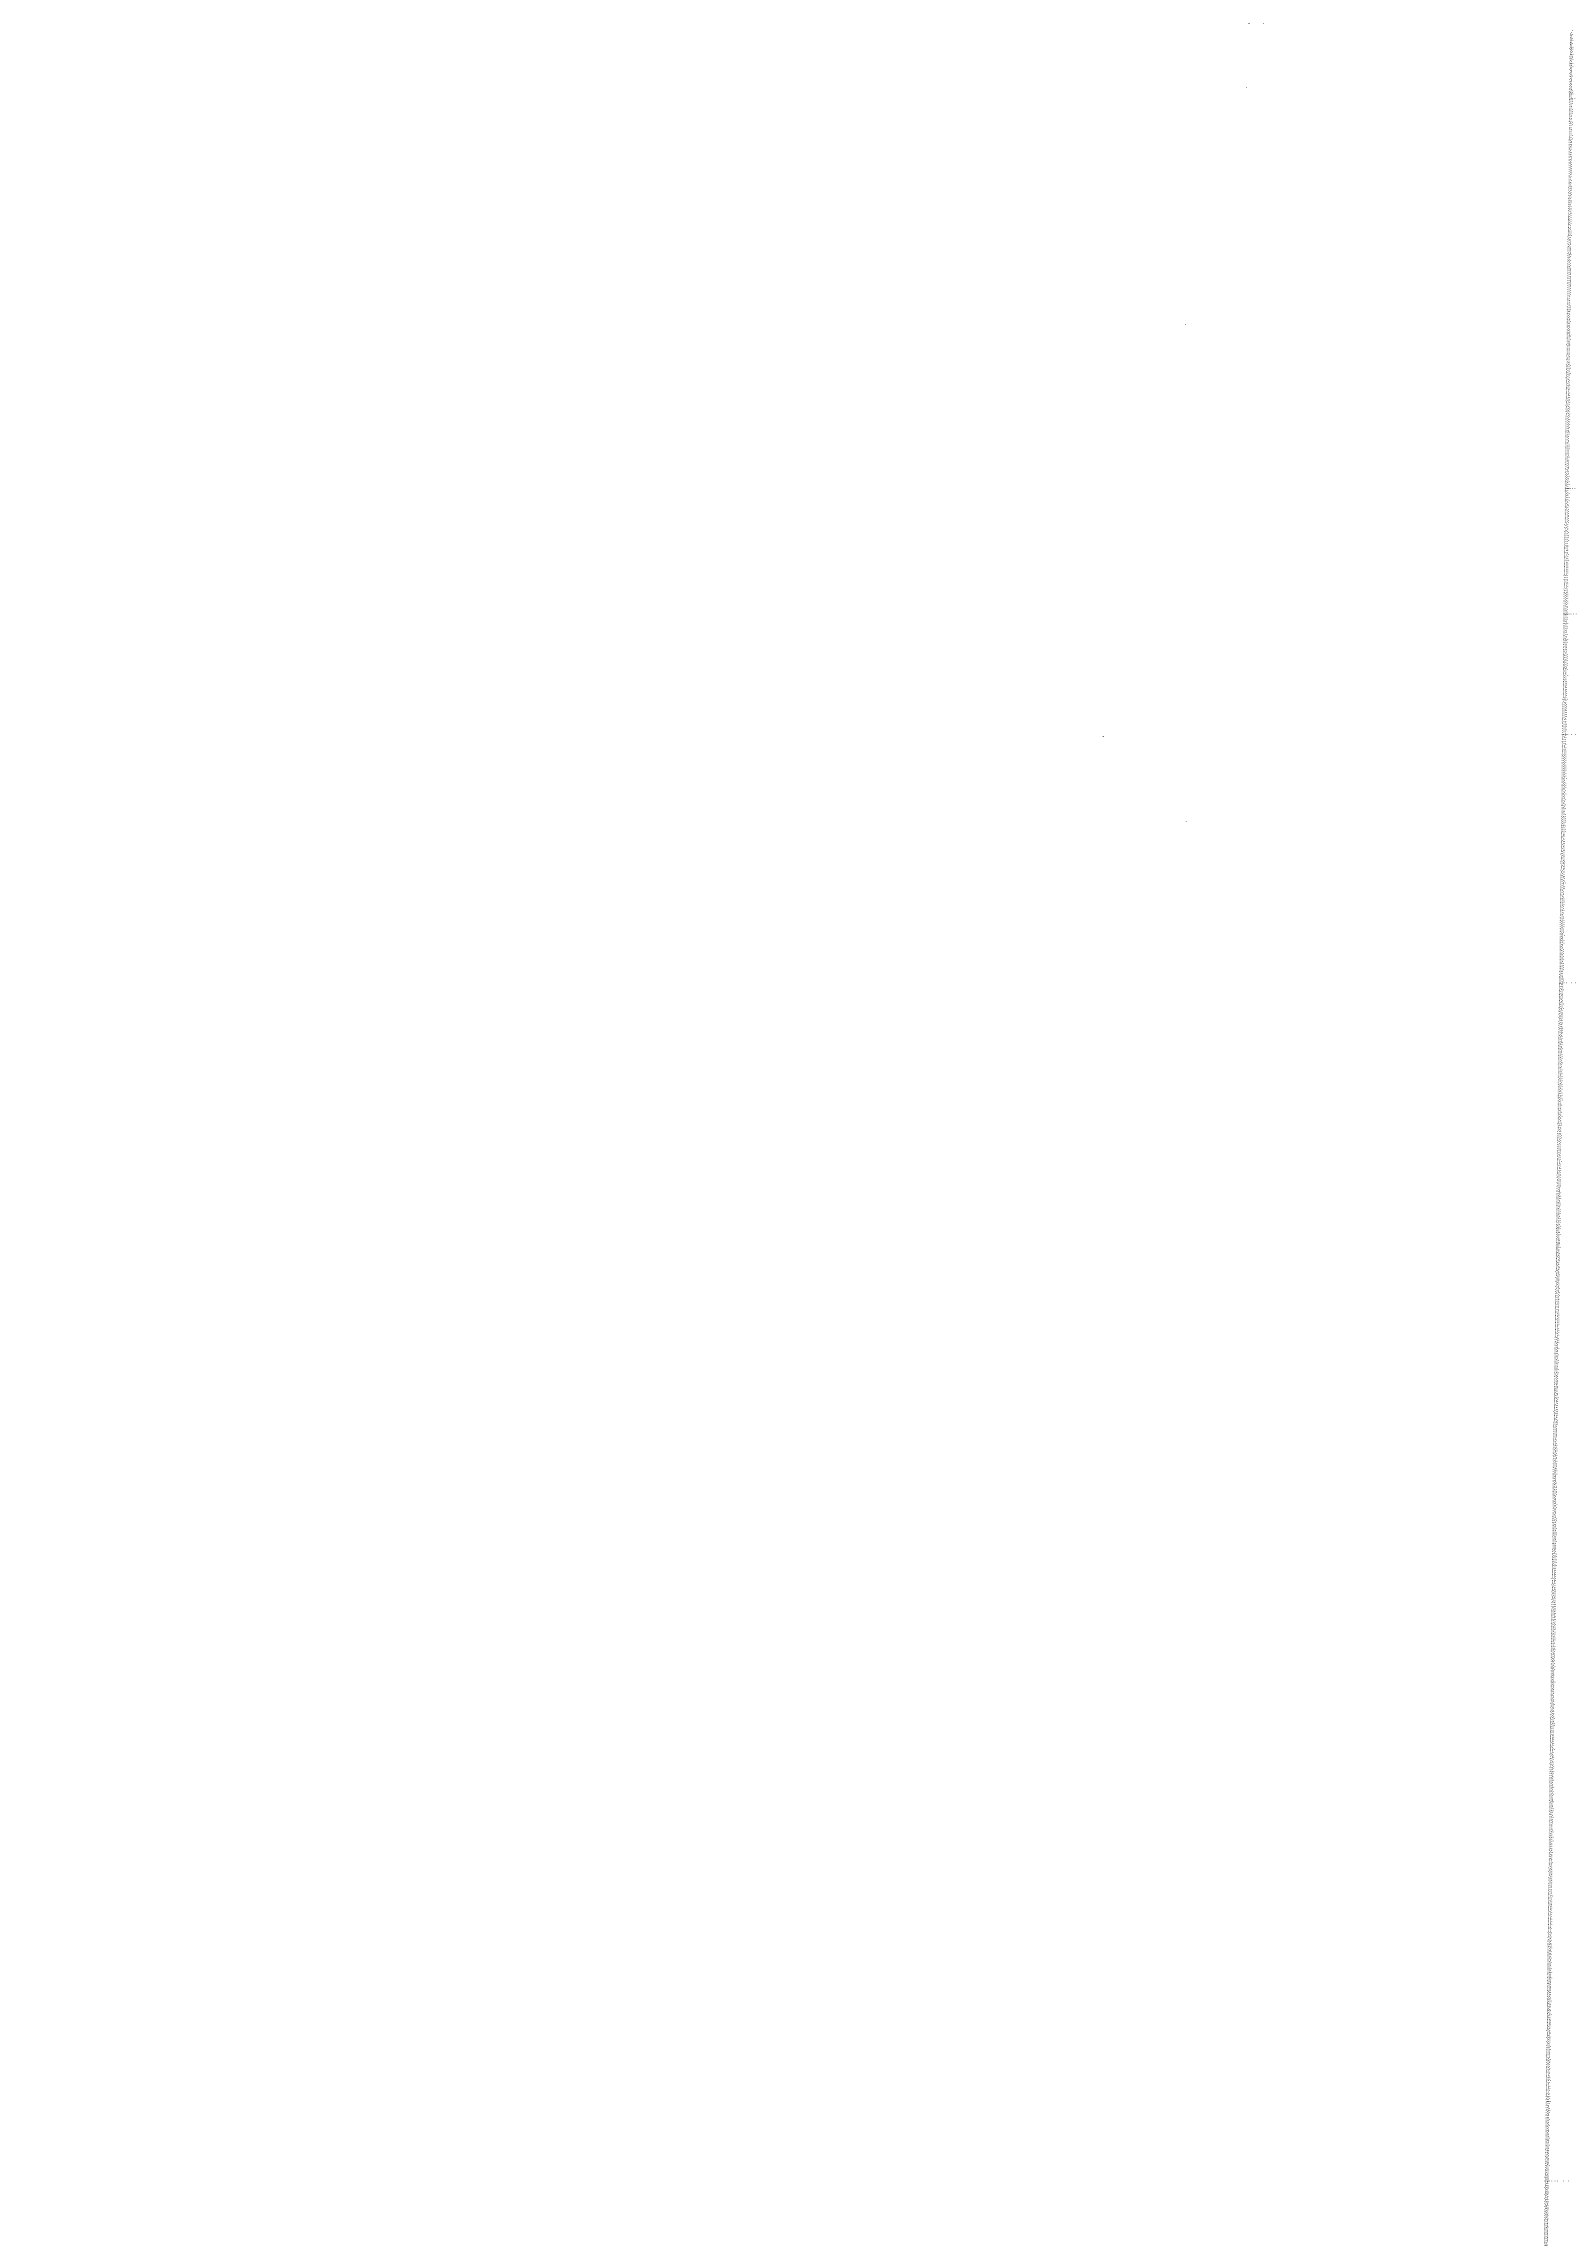

Понуда за Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

From : Blagoj Shalev <blagoj@brako.com.mk>

Thu, Apr 09, 2020 09:45 AM
7 attachments

Subject : Понуда за Јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

To : Вања Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Почитувана,

Ви благодариме на Барањето за понуда за јавната набавка.

Во прилог е нашата понуда која се надеваме дека во целост ќе ги задоволи Вашите очекувања и потреби.

Поздрав / Best regards

Blagoj Shalev | CEO | DPTU BRAKO DOO Veles, Macedonia
| M: +389 78 265 358 | www.brako.com..mk

BRAKO



ISO 14001
IIC-Certification

Before you print think about the **ENVIRONMENT**


This E-mail was scanned by Kaspersky Secure Mail Gateway! No malwares ware found.

BRAKO

image001.jpg
2 KB

image002.jpg
2 KB

1



 **Финансиска понуда signed.pdf**
787 KB

 **Техничка спецификација signed.pdf**
1,005 KB

 **Изјава за сериозност на понудата signed.pdf**
161 KB

 **Документ за регистрирана дејност БРАКО.pdf**
514 KB

ponuda za montazni kontejneri za potrebite na zdravstveniот sistem

From : sonja krstic <sonjkrstic@yahoo.com>

Subject : ponuda za montazni kontejneri za potrebite na zdravstveniот sistem

To : Вања Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>

Reply To : sonja krstic <sonjkrstic@yahoo.com>

Pocituvani,

vo prilog e ponudata kako i prilozite vo vrska so nabavkata na montazni kontejneri za potrebite na zdravstveniот sistem.
Poradi itnosta na potrebata za izvedba, ponudeno e realno resenie za izvedba na Vaseto baranje vo najkratok mozen rok .

So pocit

Sonja Janevska (Krstic)

MSS mobile sanitary service Dooel Skopje Macedonia

Str:Zdanec No:19b 1000 Skopje

Tel:+38922461337

Fax:+38922461117

Mob:+38975273927

E-mail:sonjkrstic@yahoo.com

Web:www.adco.de

www.toitoidixi.de

Thu, Apr 09, 2020 09:55 AM

5 attachments

 **дс Прилог 3-Изјава за сериозност.pdf**

455 KB

 **Документ за докажување на професионална способност - Потврда за регистрирана дејност_Пакет2 (1).pdf**

295 KB

 **Прилог-техничка спецификација дс.pdf**

579 KB

 **Прилог 1-Образец на ропида дс.pdf**

4/9/2020

Zimbra

544 KB

V_E_montazni_kontenjeri-smestuvanje_PREDLOG_1_mss.pdf



411 KB



ДПТУ БРАКО ДОО

Ул. Раштански пат 2 - 1400, Велес

Р. Северна Македонија

Тел.: ++389 43 212 560, 212 561

Факс ++ 389 43 232 534

www.brako.com.mk; sales@brako.com.mk

ПРОПРАТНО ПИСМО

(од информативен карактер)

Почитувани,

Пред се сакаме на сите здравствени работници и вработените во Министерство за здравство да им се заблагодариме и да им честитаме за напорите кои го вложуваат во справувањето со кризата.

Врз база на објавен повик за јавна набавка од Април 2020 год на монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност од страна на Министерството за здравство, денес по електронски пат (како што беше побарано) доставивме понуда за изработка на монтажна контејнерска болница. Понудената цена во понудата е 12.145.891 ден без ДДВ, односно 14.332.150 ден со ДДВ за комплетна изведба со монтажа за сите три дела од техничката спецификација.

Сакаме да Ве информираме дека реаланата фабричка цена без заработка на овој објект со инсталација изнесува цца. 15.000.000 ден без ДДВ односно цца. 17.700.000 ден со ДДВ.

Имајќи ја во предвид ситуацијата во која се наоѓа државата како последица на COVID 19, сопствениците на Брако како општествено одговорна компанија ја понуди цената дадена во понудата, односно одлучи разликата во цена на чинење без заработка до понудената цена во понудата да ја покрие од сопствени извори како донација. Се надеваме дека овој мал придонес ќе помогне во оваа тешка ситуација.

Со почит,



Zimbra

vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk

Пропратно писмо од информативен карактер

From : Blagoj Shalev <blagoj@brako.com.mk>

Thu, Apr 09, 2020 10:39 AM

Subject : Пропратно писмо од информативен карактер

4 attachments

To : Ванја Андонова <vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk>, kontakt@zdravstvo.gov.mk

Поздрав / Best regards

Blagoj Shalev | CEO | ДРТУ БРАКО ДОО Veles, Macedonia
| M: +389 78 265 358 | www.brako.com.mk

БРАКО



ISO 14001
IIC (Certification)



Before you print think about the ENVIRONMENT

This E-mail was scanned by Kaspersky Secure Mail Gateway! No malwares ware found.

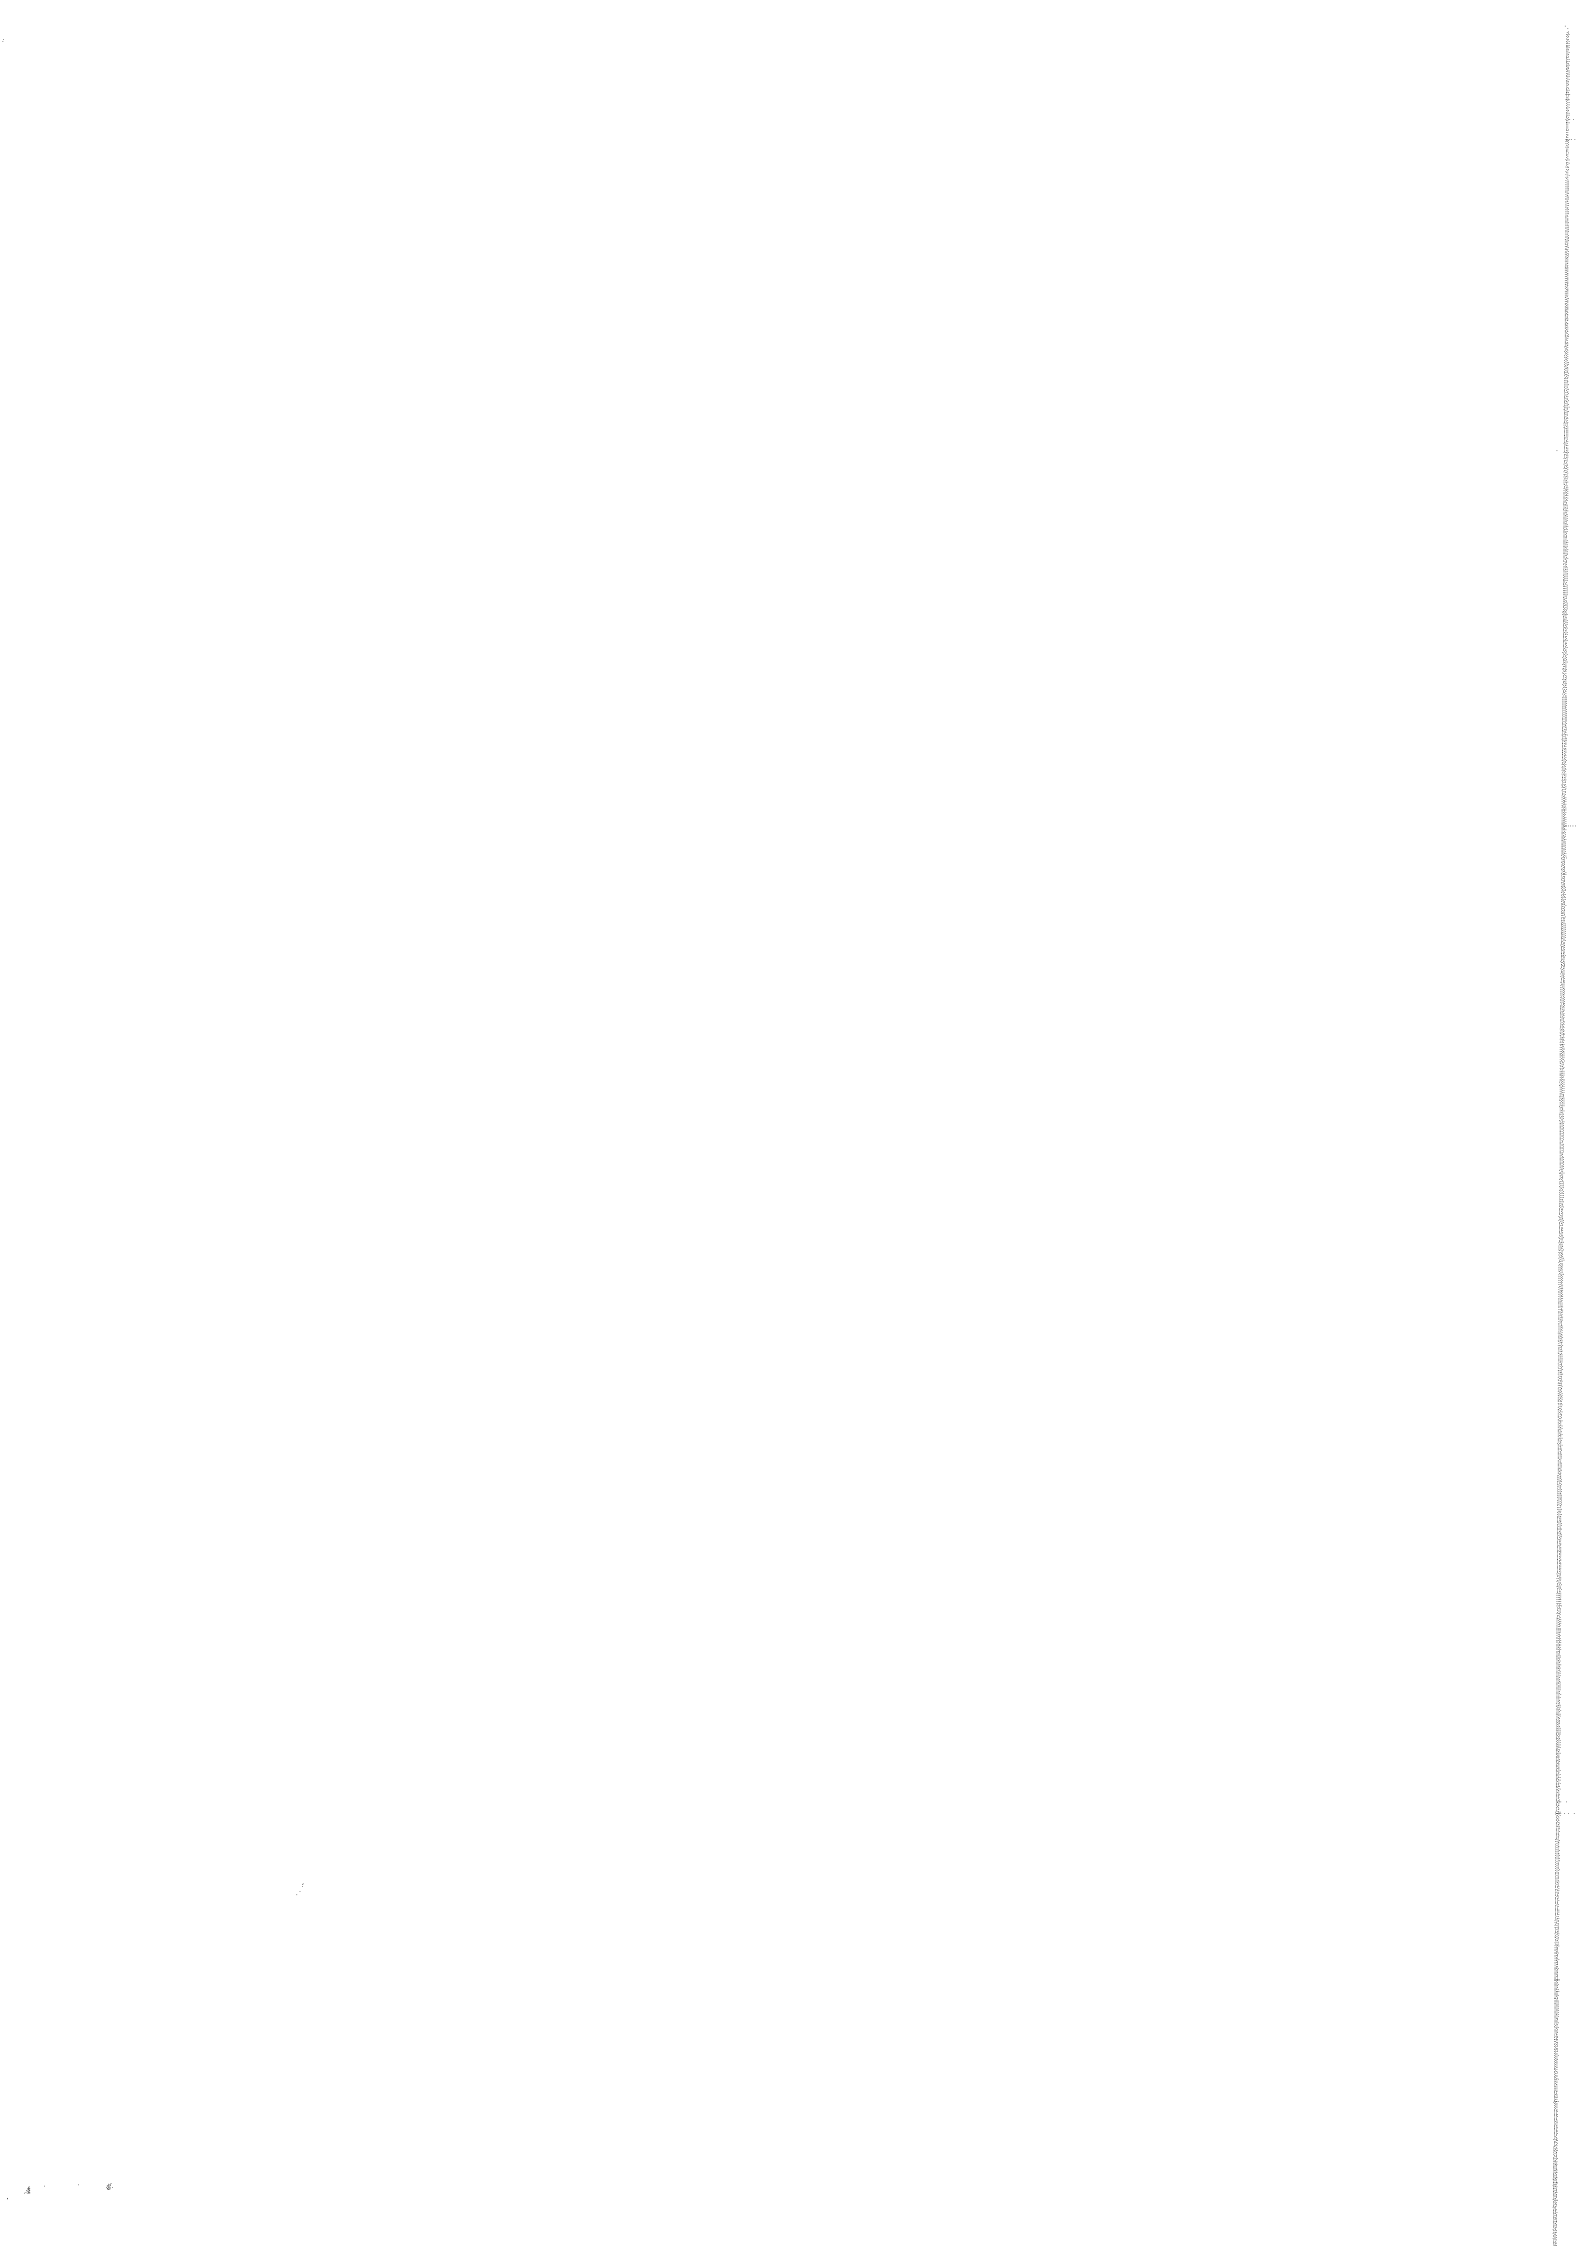


image001.jpg
2 KB



image002.jpg
2 KB

image003.png
10 KB





Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

До: Сите економски оператори

ПРЕДМЕТ: Одговор на поставени прашања во врска со Покана за поднесување понуда за јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

Прашање 1. Нашиот предлог за измена на техничкото решение е да помеѓу сместувачките соби односно помеѓу сите објекти во делот 2 (сместувачки соби, канцеларии, тоалети) да се остави простор од 200mm се со цел пристап и можност за чистење на олуците и избегнување на внатрешни олуци и можност за нивно запушување и протекување во собите. Цениме дека ова решение од аспект на експлоатација и понатамошно одржување е доста подобро и поефикасно за Вас. Ова го кажуваме поради нашето долгогодишно искуство со оваа проблематика. Со оваквата промена би се добил ходник (помеѓу сместувачките објекти) во делот 2 подолг за 1600 mm.

Одговор: Имајќи во предвид дека станува збор за набавка на принципот клуч на рака, секое техничко решение кое е во насока на подобра и поефикасна експлоатација и одржување а не се променува суштински техничката спецификација, карактеристиките и функционалноста на монтажните објекти е прифатливо за договорниот орган.

Прашање 2. Предлагаме техничка измена во делот 1 топла врска, да контејнерите бидат разделени 200mm од шаторите се со цел поефикасна монтажа, чистење, а и понатамошна демонтажа на објектите (шатори и контејнери) но со ова би избегнале и било какви на штетување на шаторите заради триење со контејнерите.

Одговор: Имајќи во предвид дека станува збор за набавка на принципот клуч на рака, секое техничко решение кое е во насока на подобра и поефикасна експлоатација и одржување а не се променува суштински техничката спецификација, карактеристиките и функционалноста на монтажните објекти е прифатливо за договорниот орган.

Прашање 3 -Од нашиот увид на место увидовме дека можеби (ќе се потврди со геодетски снимање кое ќе го извршиме пред монтажа) правецот на шаторите до влезот на постојната цврста градба не е во права врска туку има девијација. Поради ова предлагаме адаптација со закосување во делот 3 топла врска. Ве замолуваме за дозвола да биде извршена адаптација согласно условите на теренот.



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Одговор: Имајќи во предвид дека станува збор за набавка на принципот клуч на рака, секое техничко решение кое е во насока на подобра и поефикасна експлоатација и одржување а не се променува суштински техничката спецификација, карактеристиките и функционалноста на монтажните објекти е прифатливо за договорниот орган.

Прашање 4 - Во техничката спецификација на секоја посебна единица имате специфицирано дека треба да има IP табла. Тоа подразбира дека Вие ќе доведете кабел до секоја IP табла на кој ние ќе се приклучиме. За да можеме да ја специфицираме опремата која треба да ја испорачаме Ве молиме за потврда на истото како и позиција на која треба IP таблите да бидат поставени.

Одговор : Се потврдува, дека договорниот орган ќе спроведе кабел од приклучно место до IP табла, позицијата на таблите дополните разработено согласно разработеното решение;

Прашање 5 : Дали вратата кои што се специфицирани во сместувачкиот дел треба да биде имаат светол отвор 1050x2050? Препорачуваме да биде светол отвор од 1050mm како би можел болнички кревет непречено да поминува. Ве молиме за потврда.

Одговор : Да, димензиите на сите позиции за врати се однесуваат на светол отвор;

Прашање 6: Дали каде што е специфицирано лед осветлувањето од 18W се мисли „компатибилно на неонско осветлувањето од 18W,,“?

Одговор: Да.

Прашање 7 Во делот 2 кај табелата која треба да се користи за понуда, точка 3 ви е Монтажен објект медицински, истиот во текстот претходно не е даден опис. Дали можеме да продрозбереме дека тоа е контейнер остава без прозор како што гледаме од скицата со електрична инсталација (осветлување и приклучок за струја). Ве молиме за потврда..

Одговор: Монтажниот објект медицински објект, истиот има опис во дел 1, точка 3, (медицински персонал) истата е дадена и во прилог на одговоров ;

Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (медицински персонал) – клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 1 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1400мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Ветонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 2 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Климатизација- инвертер сплит систем 2,5KW

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект 3мм

Прашање 8. Нашиот технички тим ја прегледа документацијата каде наиде на разидување во дел од техничкиот текстуален опис и техничкиот цртеж а се со можност за добивање на подобра функционалност и подобра понуда би сакале да ги појасниме следните работи во дел 2 точка 3 од спецификацијата:

- 2 ПВЦ врати 850мм x 2050мм => не се предвидени на техничкиот цртеж
- 1 двокрилна ПВЦ врата 2/900/2050мм => предходно е ставена е во спецификацијата на дел 2 точка 2 и овдека се дуплира и како таква е непотребна. Ве молиме за потврда.
- 13 ПВЦ еднокрилни прозори со термопан стакло => кога споредуваме со техничката спецификација утврдуваме дека се потребни 6 прозори, Ве молиме за потврда.

Одговор: Во врска со поставеното прашање за дел 2 точка 3 од спецификацијата, Ве известуваме за следното:



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

- 2 ПВЦ врати 850мм x 2050мм - да не се вклучуваат во понудата
- 1 двокрилна ПВЦ врата 2/900/2050мм - да не се вклучуваат во понудата
- 13 ПВЦ еднокрилни прозори со термопан стакло – во понудата да се вклучат 6 ПВЦ еднокрилни прозори како по скицата

Прашање 9. Во дел 3 во изработка на топлата врска се ставени дека се потребни 8ком ПВЦ еднокрилни прозори со термопан стакло додека според техничкиот цртеж се 18ком скицирани на истиот. Ве молиме за потврда дали се 8 или 18 ком ПВц прозорци.

Одговор: Точната количина е 18 прозори;

Комисија за јавни набавки

1.  _____
2. _____
3.  _____

ДО: **ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Валандово**

ПРЕДМЕТ: Покана за поднесување понуда за јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

Почитувани,

Министерство за здравство , со адреса на ул. 50 Дивизија бр.14, и електронска пошта kontakt@zdravstvo.gov.mk , има потреба од јавна набавка на **монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност**. За таа цел, Министерство за здравство спроведува постапка со преговарање без објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) од Законот за јавните набавки. Ве молиме да ни доставите првична понуда електронски потпишана за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка во согласност со приложената техничка спецификација најдоцна до 09.04.2020 година до 10:00 часот следната меил адреса: vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk.

Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите оригиналните обрасци кои се составен дел на тендерската документација.

Молиме, во понудата да наведете и лице кое во име на понудувачот ќе учествува во преговорите за реализација на набавката (име и презиме, контакт телефон).

Однапред благодариме на соработката.

Одговорно лице
Министер
Доц. Д-р Венко Филипче

**ПОСТАПКА СО
ПРЕГОВАРАЊЕ БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС ЗА**

за јавна набавка на

**Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем
со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност**

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Скопје, април 2020 година

1. Општи информации во врска со договорниот орган и предметот на набавка

1.1 Договорен орган е Министерство за здравство, со адреса ул. „50-та Дивизија“ бр.14, телефон за контакт +389 2 311 2 500, контакт лице Божин Ложанкоски.

1.2 Предмет на договорот за јавна набавка е јавна набавка на **Монтажни контејнери за**

потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност.

1.3 Предметот на договорот е делив на три дела:

ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);

ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)

ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

1.3.1 Понудите кои ќе содржат рок на изведба кои ќе содржат поголем рок за изведба нема да бидат земени во предвид поради итноста на постапката (безбедноста и здравјето на граѓаните).

1.4 Договорниот орган ќе склучи договор за предметната набавка со носителот на набавката со времетраење до завршување на пандемијата Ковид 19 во Република Северна Македонија.

1.5 Техничка спецификација на набавката: **монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност.**

1.6 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со преговарање без претходно објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) од Законот за јавните набавки.

1.7 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки донесените подзаконски акти.

2. Елементи на понуда

2.1 Понудата треба да е составена од следниве елементи:

- Образец на понуда (Прилог 2),
- Документ за регистрирана дејност,
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),

2.2 Критериуми за утврдување на способност

2.2.1. Економскиот оператор треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.3 Начин на докажување на способноста на понудувачот

2.3.1 За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна

набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

3. Критериум за избор на најповолна понуда

Договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи **ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЛНАТА ПОНУДА ВРЗ ОСНОВА НА ЦЕНАТА.**

3.1 Цена на понудата

3.1.1 Во цената на понудата треба да се засметани сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во денари.

3.2 Корекција на цени

3.2.1 При реализација на договорот за јавна набавка не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

4. Начин и рок на плаќање, рок на испорака и важност на понуди

4.1 Се предвидува следниов начин на плаќање:

- Плаќањето ќе се изврши по претходно изготвен записник за примопредавање од лицата задолжени за реализација на договорот назначени од Министерство за здравство и доставена фактура по испорака, монтажа и извршено примопредавање.

4.2 Рок за реализирање на набавката

Договорниот орган со носителот на набавката ќе склучи договор за предметната набавка со носителот на набавката со времетраење до целосно реализација на договорот согласно начин на испорака наведена во техничката спецификација.

4.3 Период на важност на понудата

Понудите треба да важат најмалку 30 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите, за чие времетраење понудата со сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудата што важи за пократок период од предвидениот, договорниот орган ја отфрла како неприфатлива понуда. Доколку договорниот орган процени за потребно, може да побара од понудувачот продолжување на периодот на важност на понудата.

5. Начин на доставување на понудата

Економскиот оператор понудата електронски потпишана треба да ја достави на следната меил адреса: vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk, најдоцна пристигнати до 09.04.2020 година до 10:00 часот.

5.1. Секој економски оператор, може да учествува за еден или повеќе делови од постапката за јавна набавка.

Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на поканата за поднесување на понуди за доделување на договор за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел 1. Информации за понудувачот

1.1. Име на понудувачот: ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Валандово

1.2. Контакт информации:

- Адреса: Маршал Тито бр ББ Валандово
- Телефон: 077 558 037
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: Роберт Исиров

1.3. Одговорно лице:

Аристотел Исиров

1.4. Даночен број: 4003006105207

Дел 2. Финансиска понуда

2.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за: **ДЕЛ 1 / 2 / 3 (соодветно да се пополни)**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, за за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** 15396500 [со бројки] (петнаесет милиони тистотини деведесет и шест илјади и петстотини денари) [со букви] денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува 2771370 денари.

2.2 Ги прифаќаме начинот на плаќање и рокот на реализација на предметот на набавка утврдени во тендерската документација.

Дел 3. Рок на важност на понудата: 30 дена

На преговорите што ќе ги закаже договорниот орган, понудувачот ќе го претставува лицето:

_____ Роберт Исиров _____, тел _____ 077 558 037 _____.

Дел 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

ПРИЛОГ: (Документите што се приложуваат кон понудата)

Со финансиската понуда задолжително се доставуваат и:

- документи за регистрирана дејност
- изјава за сериозност на понудата

--	--

ПРИЛОГ 3 - Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот ___Аристотел Исиров___ [име и презиме], врз основа на член 101 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот _ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Валандово_, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 101 став 7 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

___9,04,2020___

Овластено лице

___Аристотел Исиров___

ПРИЛОГ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Согласно одлуките на Влада на Република Северна Македонија за мерки и препораки за заштита и превенција од Коронавирус COVID-19, а поради зголемување на бројот на заболени лица се јавува потреба од предвидување на нови болнички капацитети за згрижување на заболени лица. Министерството за здравство има потреба од набавка – прибирање на понуди за **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем**, кои ќе се поставуваат во непосредна близина на ЈЗУ Универзитеска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби при Универзитетскиот Клинички комплекс „Мајка Тереза“ во Скопје и во согласност со Извадок од Нацрт-записникот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година, („Точка 10“). За таа цел, планирана е лесна, брза и монтажна изградба на медицински капацитети – болничко сместување со просторија за медицински персонал и згрижување со медицински третман на заболени лица од Коронавирус COVID-19.

Локацијата на која е предвидено поставување на модулите за монтажаен објект - контејнери, претходно на подлогата е поставено шљунак и истата е нивелирана со тампон.

На локацијата ќе биде обезбеден приклучок на водоводна и канализациона мрежа и приклучок кон електро дистрибутивната мрежа заради потребите од снабдување со електрична енергија.

Со поставувањето на модулните монтажаен објекти – контејнери се предвидува да се добие обезбеден простор за:

- (канцелариски) – за потребите на медицински персонал;
- сместувачки капацитет – болнички кревети;
- тоалети со туш кабини;
- ходник; и
- „топла врска“

Во прилог е даден: графички цртеж со просторно решение и диспозиција на модулите.

Технички карактеристики:

ДЕЛ 1.

- Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажаен објект – (вече со туш кабини – тоалети- ТИП 1) - клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремни со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) или во зависност од модулната поставеност
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 4 ПВЦ - врати 700м-2050мм исполна панел „саќе“;

- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабинни сендвич панел PUR сид најмалку 40мм;

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 3 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Тоалет со 4 кабин и тоа:

- 3 Вц- кабини опремени со толетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мијалници
- 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
- 1 туш кабина комплет со батерија и сиот потребен врзен материјал
- Довод
- Одвод
- ПВЦ цевки
- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW

или еквивалетни

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект минимум 3мм

- **Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на монтажнен објект** – (вече со туш кабин и тоалети - **ТИП 2**) – клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) или во зависност од модуларната поставеност

Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саќе“;
- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм;

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабинни сендвич панел PUR сид намалку 40мм

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 3 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Тоалет со 4 кабинни и тоа:

- 2 Виц- кабинни опремени со тоалетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мијалници
- 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
- 2 туш кабинни комплет со батерија и сиот потребен врзен материјал
- Довод
- Одвод
- ПВЦ цевки
- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW

или еквивалентни

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект минимум 3мм
- **Изработка, транспорт и монтажа на монтажнен објект – (медицински персонал)** – клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 1 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1400мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 2 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Климатизација- инвертер сплит систем 2,5KW

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект 3мм

- **Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност - Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 2 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“ комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2/900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков

- 13 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 12 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009;

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2550мм/ должина 41000мм - апроксимативно. Поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации.

***Начин на испорака за ДЕЛ 1 – во рок од 5-10 календарски дена од потпишување на договор.**

Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба.

ДЕЛ 1.

Ред. Бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количина/ Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- ТИП 1	420500	4	1682000	302760	1984760
2	Монтажен објект - ТИП 2	420500	2	841000	151380	992380
3	Монтажен објект медицински персонал	190000	3	570000	102600	672600

4	Топла врска-коридор 41м	1070000	1	1070000	192600	1262600
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						4912340

ДЕЛ 2.

1. Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (сместувачки) – клуч на рака-димензии: должина 6000 мм – ширина 7200 мм и висина 2600 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да бидат опремени со:

Кровна конструкција (двоводен кров) ±100мм

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- Олуци
- 1 ПВЦ - врата без праг 1050 мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 2 ПВЦ – двокрилни со термопан стакло, 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 1400мм-1400мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-4 0мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 ЛЕД светла x 18w
- 1 Прекинувач
- 6 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Инвертер сплит ситем за климатизација – 3,5 KW

или еквивалентни

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или „еквивалент“, согласно MKC EN10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

2. Изработка, транспорт и монтажа на монтажаен објект – ходник за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери – димензии: должина 42000 мм – ширина 2400мм и висина 2550 мм- апроксимативно (надворешна димензија) или „еквивалентно“

Контејнерите да бидат опремени со:

Кровна конструкција Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- 1 ПВЦ – дупла врата без праг 90 мм – 2050мм исполна термопан стакло 4+16+4
- 1 ПВЦ – со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1400мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4 мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-4 0мм-3мм
- Цементни (Betonур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 14 ЛЕД светла x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција:

Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или „еквивалент“, согласно MKC EN10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажаен објект најмалку 3мм

3. Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- 2 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“ комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2/900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков
- 13 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм;

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Бетонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2550мм/ должина 18000мм- апроксимативно. Поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации.

- **Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажнен објект – (вече со туш кабини – тоалети- ТИП 1) -** клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) или во зависност од модуларната поставеност
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“

- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саке“;
- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабинни сендвич панел PUR сид најмалку 40мм;

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 3 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Тоалет со 4 кабинни и тоа:

- 3 Вц- кабинни опремени со толетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мијалници
- 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
- 1 туш кабина комплет со батерија и сиот потребен врзен материјал
- Довод
- Одвод
- ПВЦ цевки
- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW

или еквивалетни

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажаен објект минимум 3мм

***Начин на испорака за ДЕЛ 2 – во рок од 10-20 календарски дена од потпишување на договор. Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба**

ДЕЛ 2.

Ред. Бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количина/Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект-сместувачки	585000	12	7020000	1263600	8283600
2	Монтажен објект ходник - 42 м	1050000	1	1050000	189000	1239000
3	Монтажен објект медицински персонал	190000	1	190000	34200	224200
4	Топла врска-коридор 18м	369000	1	369000	66420	435420
5	Монтажен објект- ТИП 1	420500	4	1682000	302760	1984760
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						12166980

ДЕЛ 3.

- **Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и ЈЗУ УК за Инфективни и фебрилни состојби, по принципот клуч на рака.

Топлата врска да биде опремена со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 2 ПВЦ дупли врати 2x 900mm x 2050mm исполна термопан стакло 4x16x4 “комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2 x 900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков и можност за заклучување
- 8 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина

на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- Под
- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betonyr) табли 20мм
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 20 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 5 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009


- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 3000мм / висина 2550мм/ должина 34000мм - апроксимативно. Детална поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации. Изведувачот е должен на направи разработка на скицата и работилнички цртежи.

***Начин на испорака за ДЕЛ 3 – во рок од 10-20 календарски дена од потпишување на договор. Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба**

ДЕЛ 3.

Ред. Бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количина парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Топла врска – коридор 34 м	922500	1	922500	166050	1088550
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						1088550

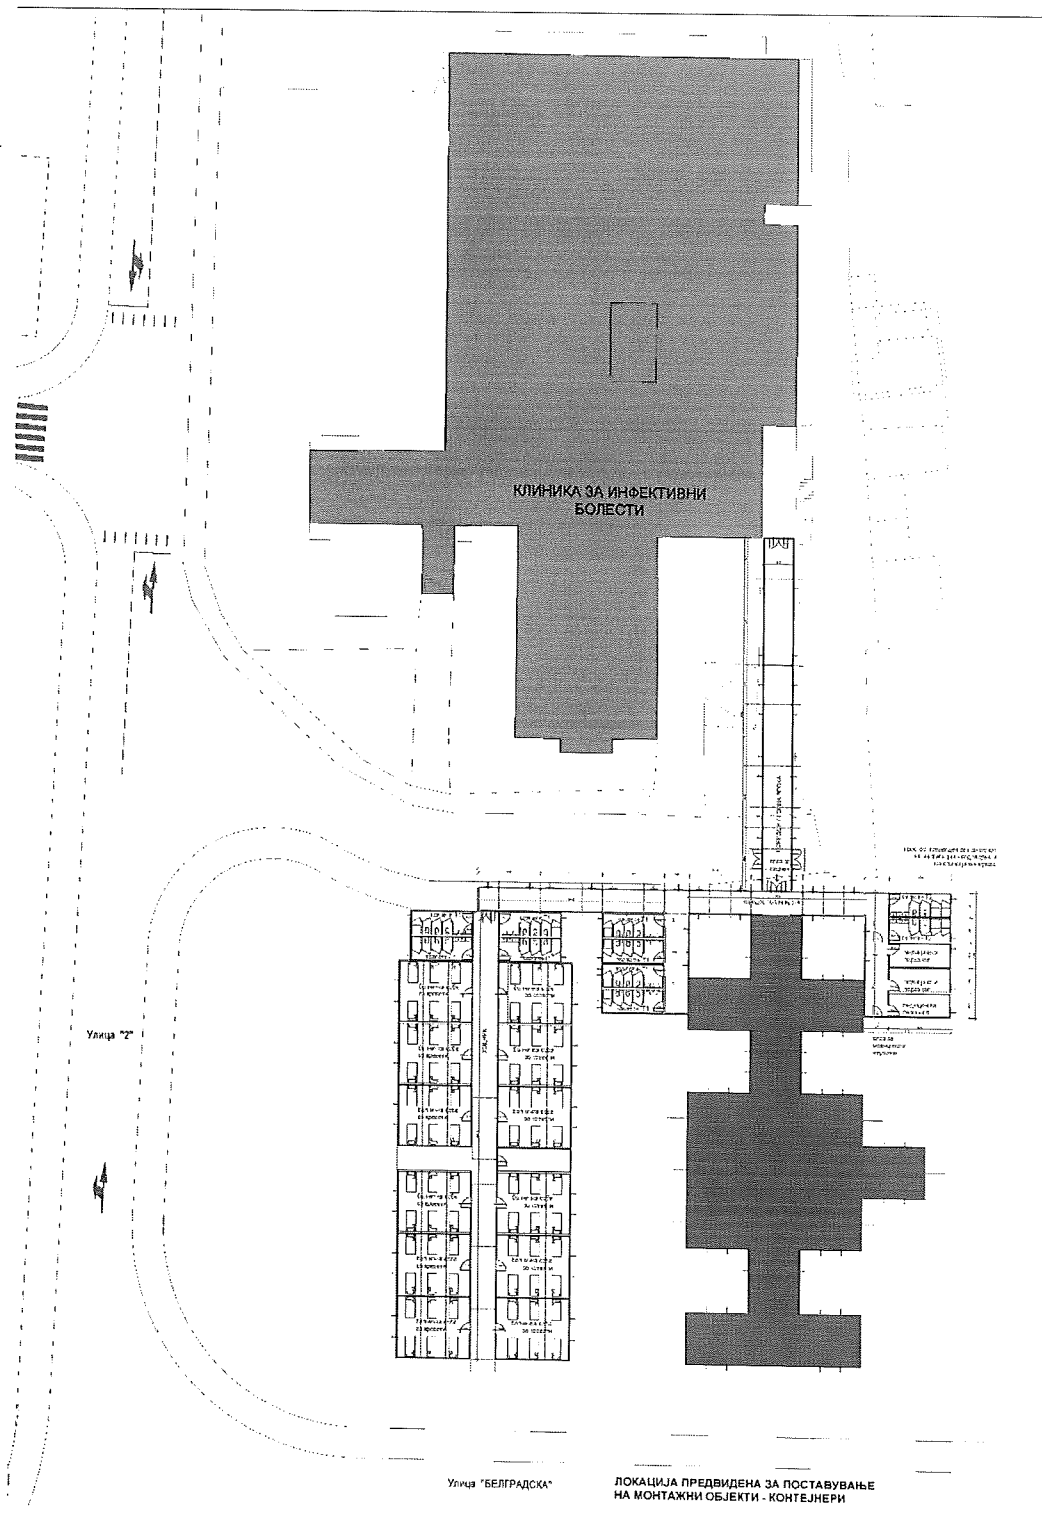

Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на поканата за поднесување на понуди за доделување на договор за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел 1. Информации за понудувачот

1.1. Име на понудувачот: __ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Валандово__

1.2. Контакт информации:

- Адреса: __Маршал Тито бр ББ Валандово__
- Телефон: __077 558 037__
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: __Роберт Исиров__

1.3. Одговорно лице:


__Аристотел Исиров__

1.4. Даночен број: __4003006105207__

Дел 2. Финансиска понуда

2.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за: **ДЕЛ 1 / 2 / 3 (соодветно да се пополни)**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, за за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** __15396500 [со бројки] (__ петнаесет милиони тистотини деведесет и шест илјади и петстотини денари __) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува __2771370__ денари.

2.2 Ги прифаќаеме начинот на плаќање и рокот на реализација на предметот на набавка утврдени во тендерската документација.

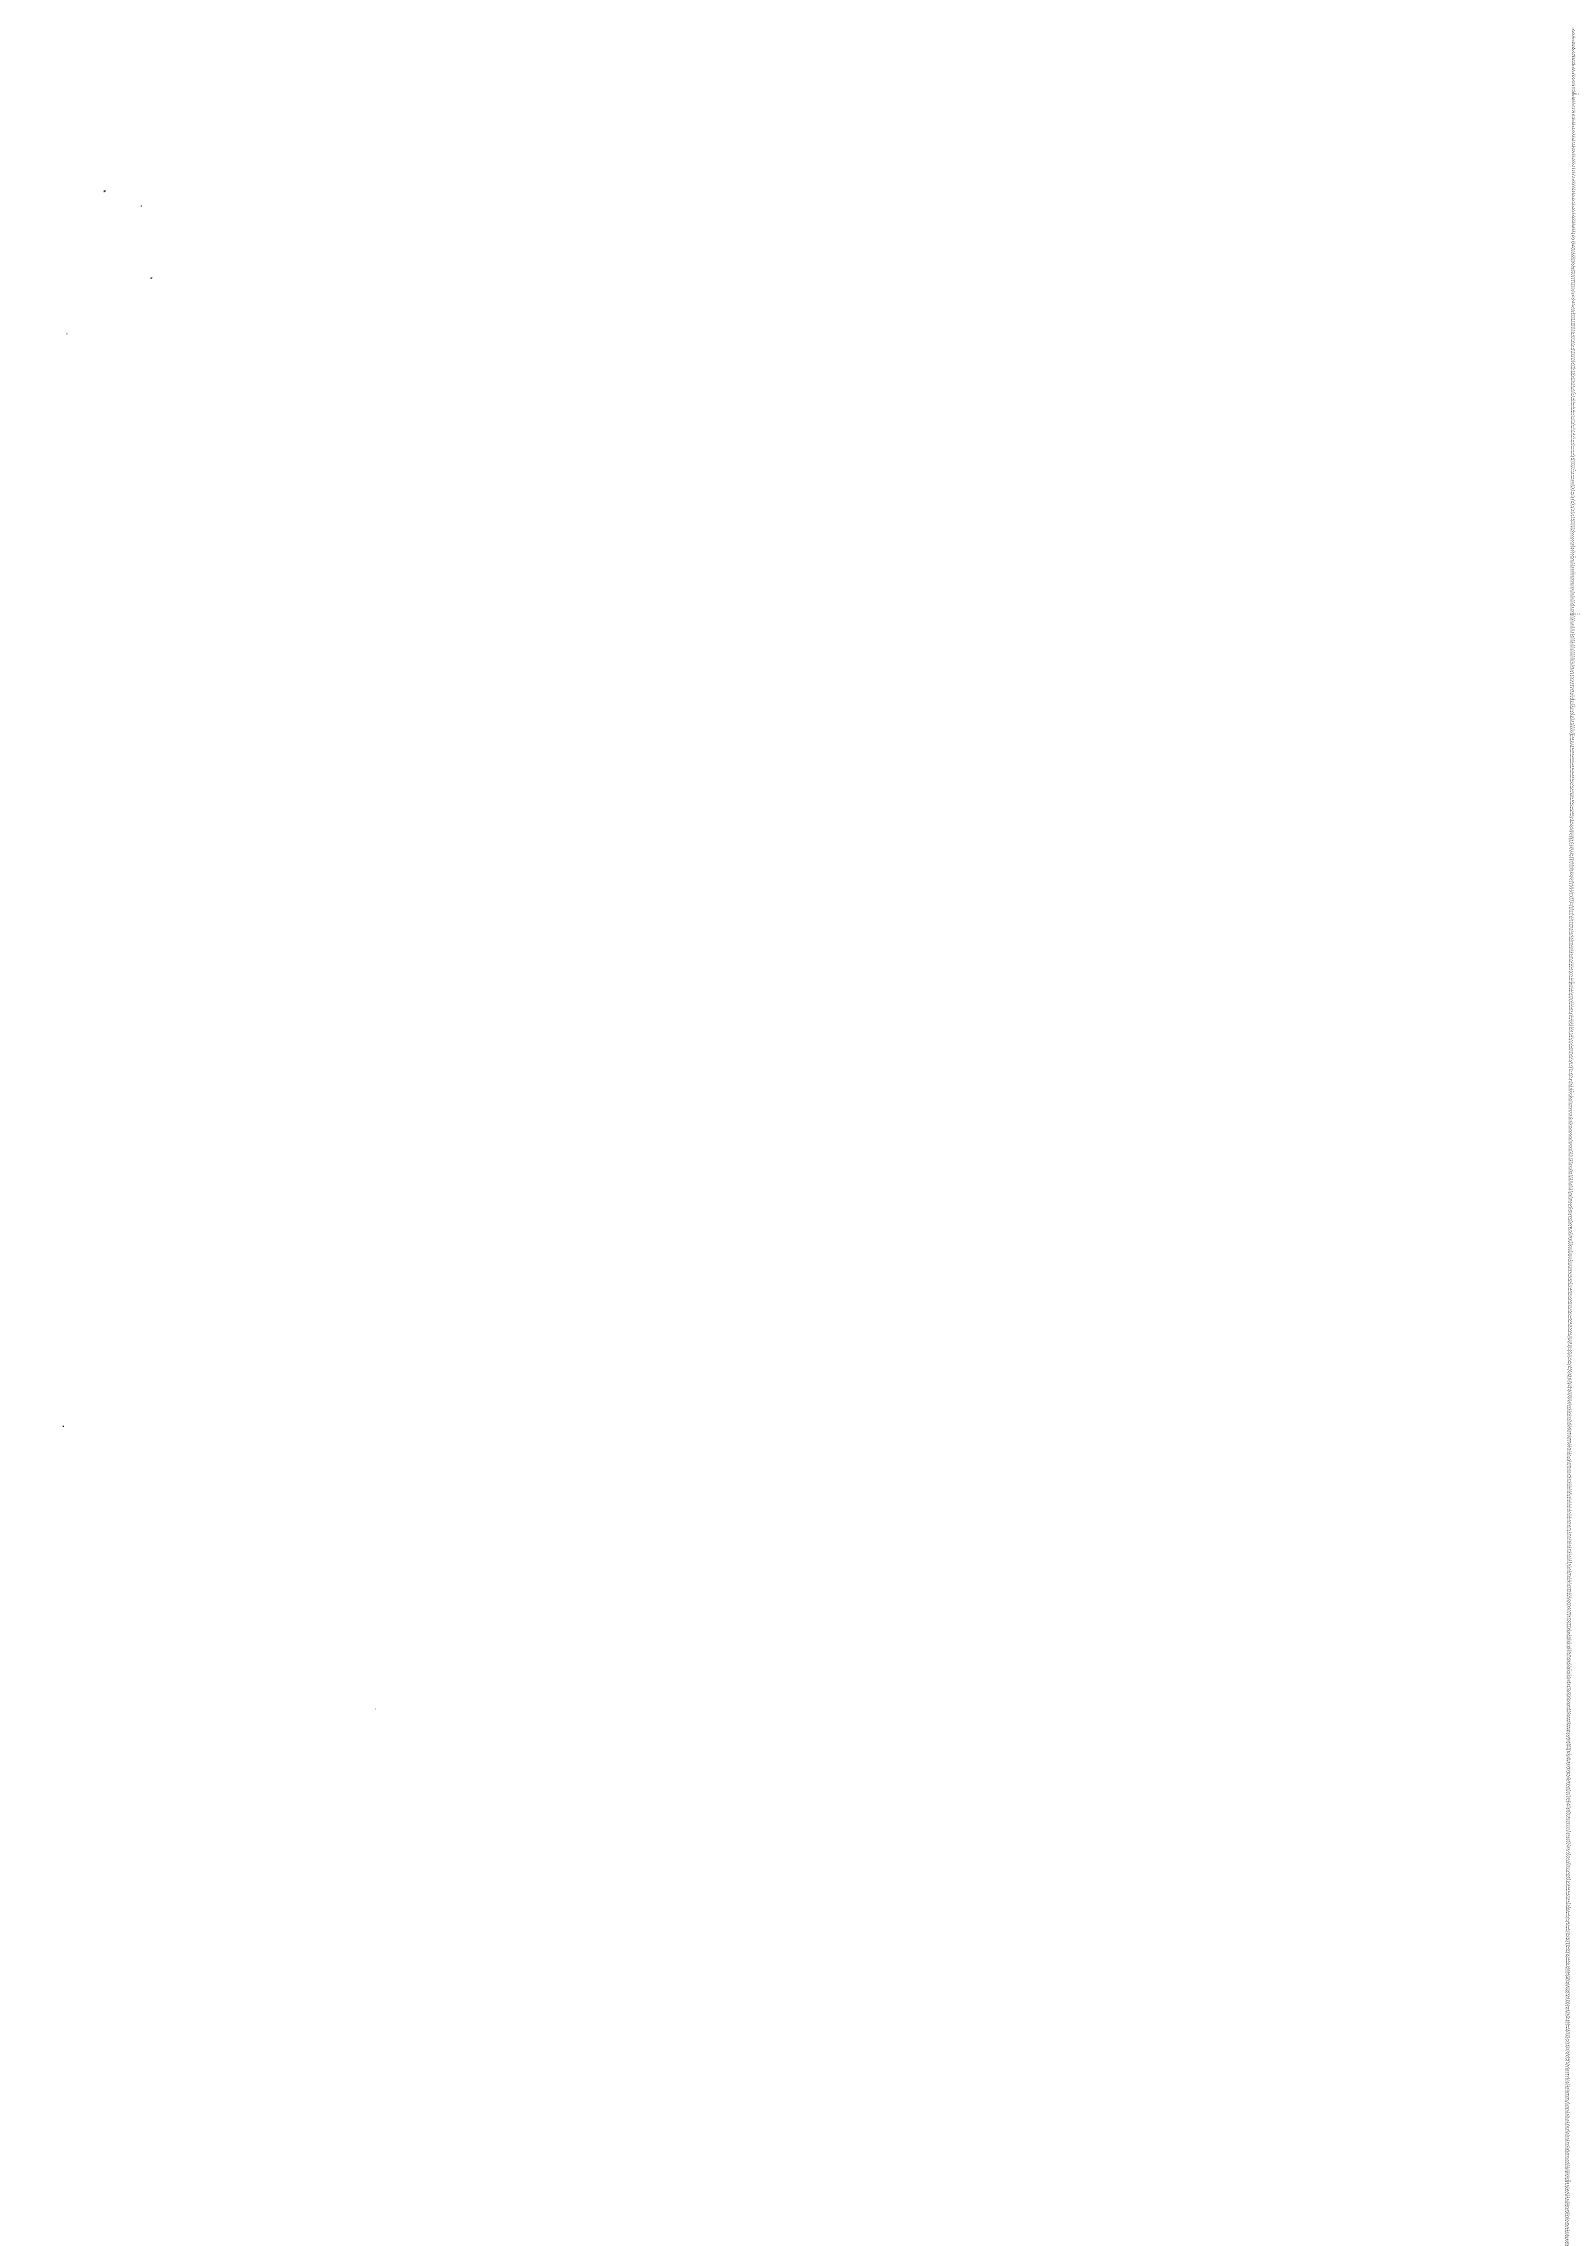

Дел 3. Рок на важност на понудата: 30 дена

На преговорите што ќе ги закаже договорниот орган, понудувачот ќе го претставува лицето:
_____ Роберт Исиров _____, тел _____ 077 558 037 _____.

Дел 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

ПРИЛОГ: (Документите што се приложуваат кон понудата)


Со финансиската понуда задолжително се доставуваат и:

- документи за регистрирана дејност
- изјава за сериозност на понудата

--	--

Makedonski
Telekom CA,
Aristotel Isirov

Digitally signed by
Makedonski Telekom
CA, Aristotel Isirov
Date: 2020.04.09
09:21:07 +02'00'

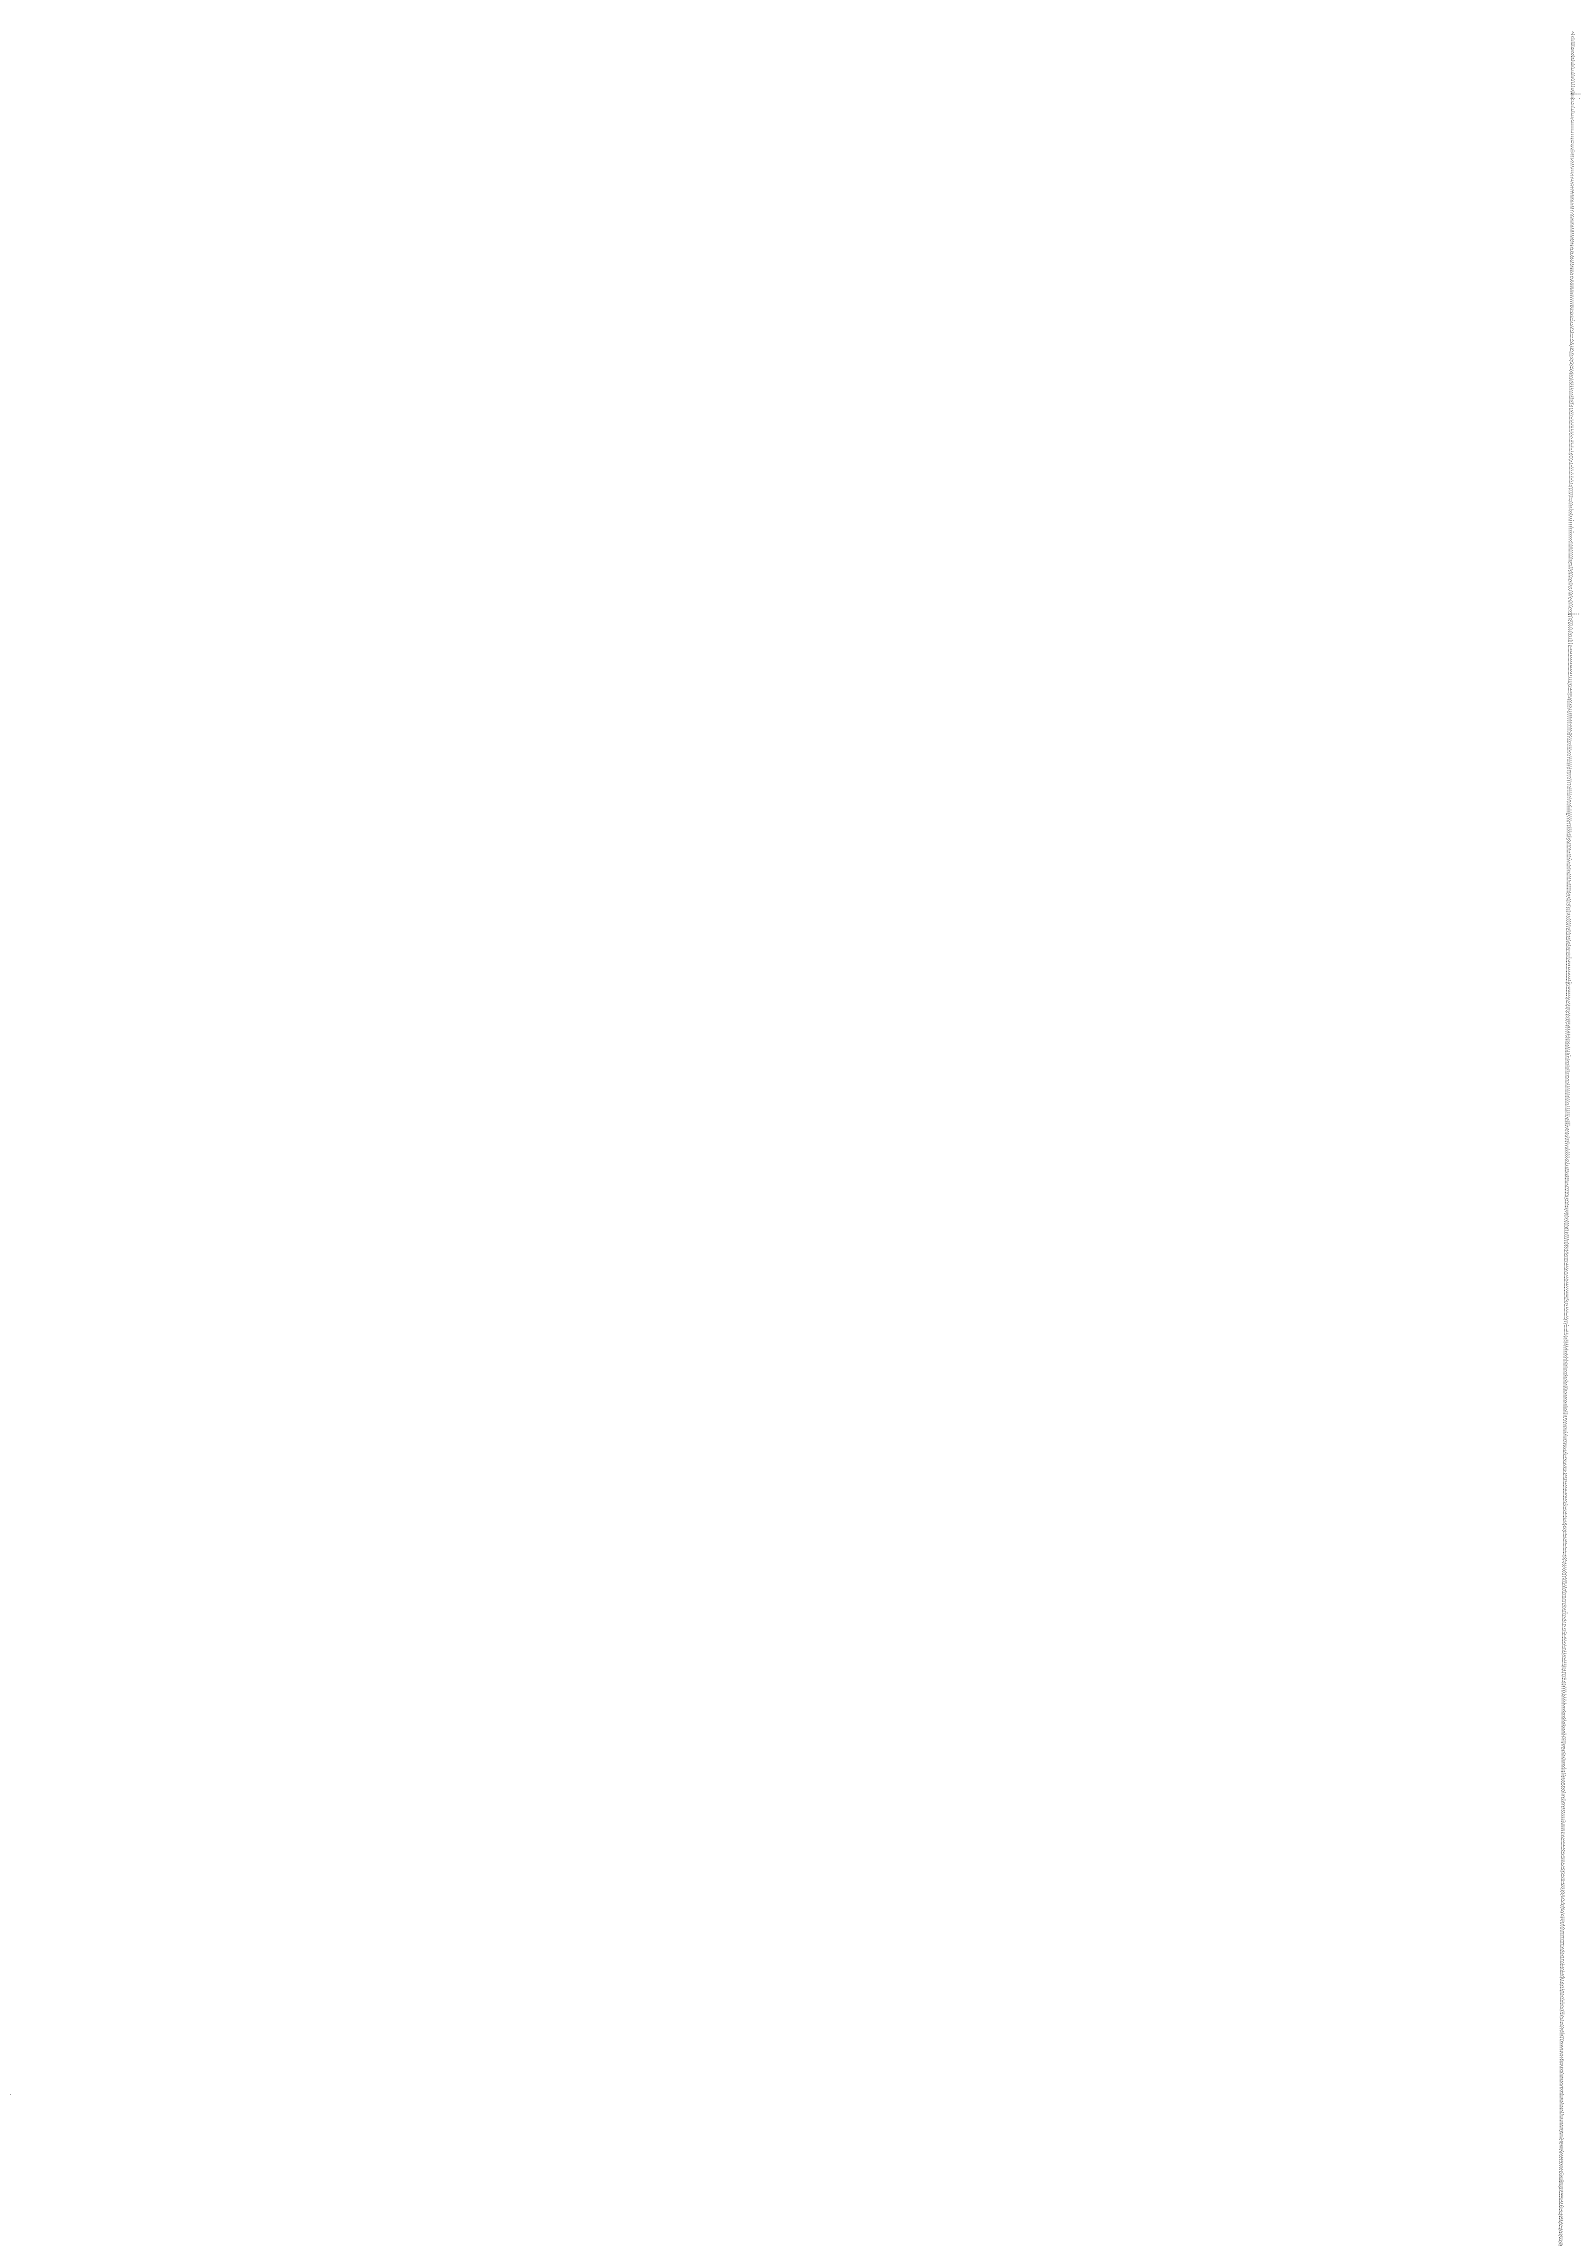

ПРИЛОГ 3 - Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот ___Аристотел Исиров___ [име и презиме], врз основа на член 101 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот _ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Валандово_, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 101 став 7 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум


___9,04,2020___

Овластено лице

___Аристотел Исиров___

Makedonski
Telekom CA,
Aristotel Isirov

Digitally signed by
Makedonski Telekom
CA, Aristotel Isirov
Date: 2020.04.09
09:20:05 +02'00'

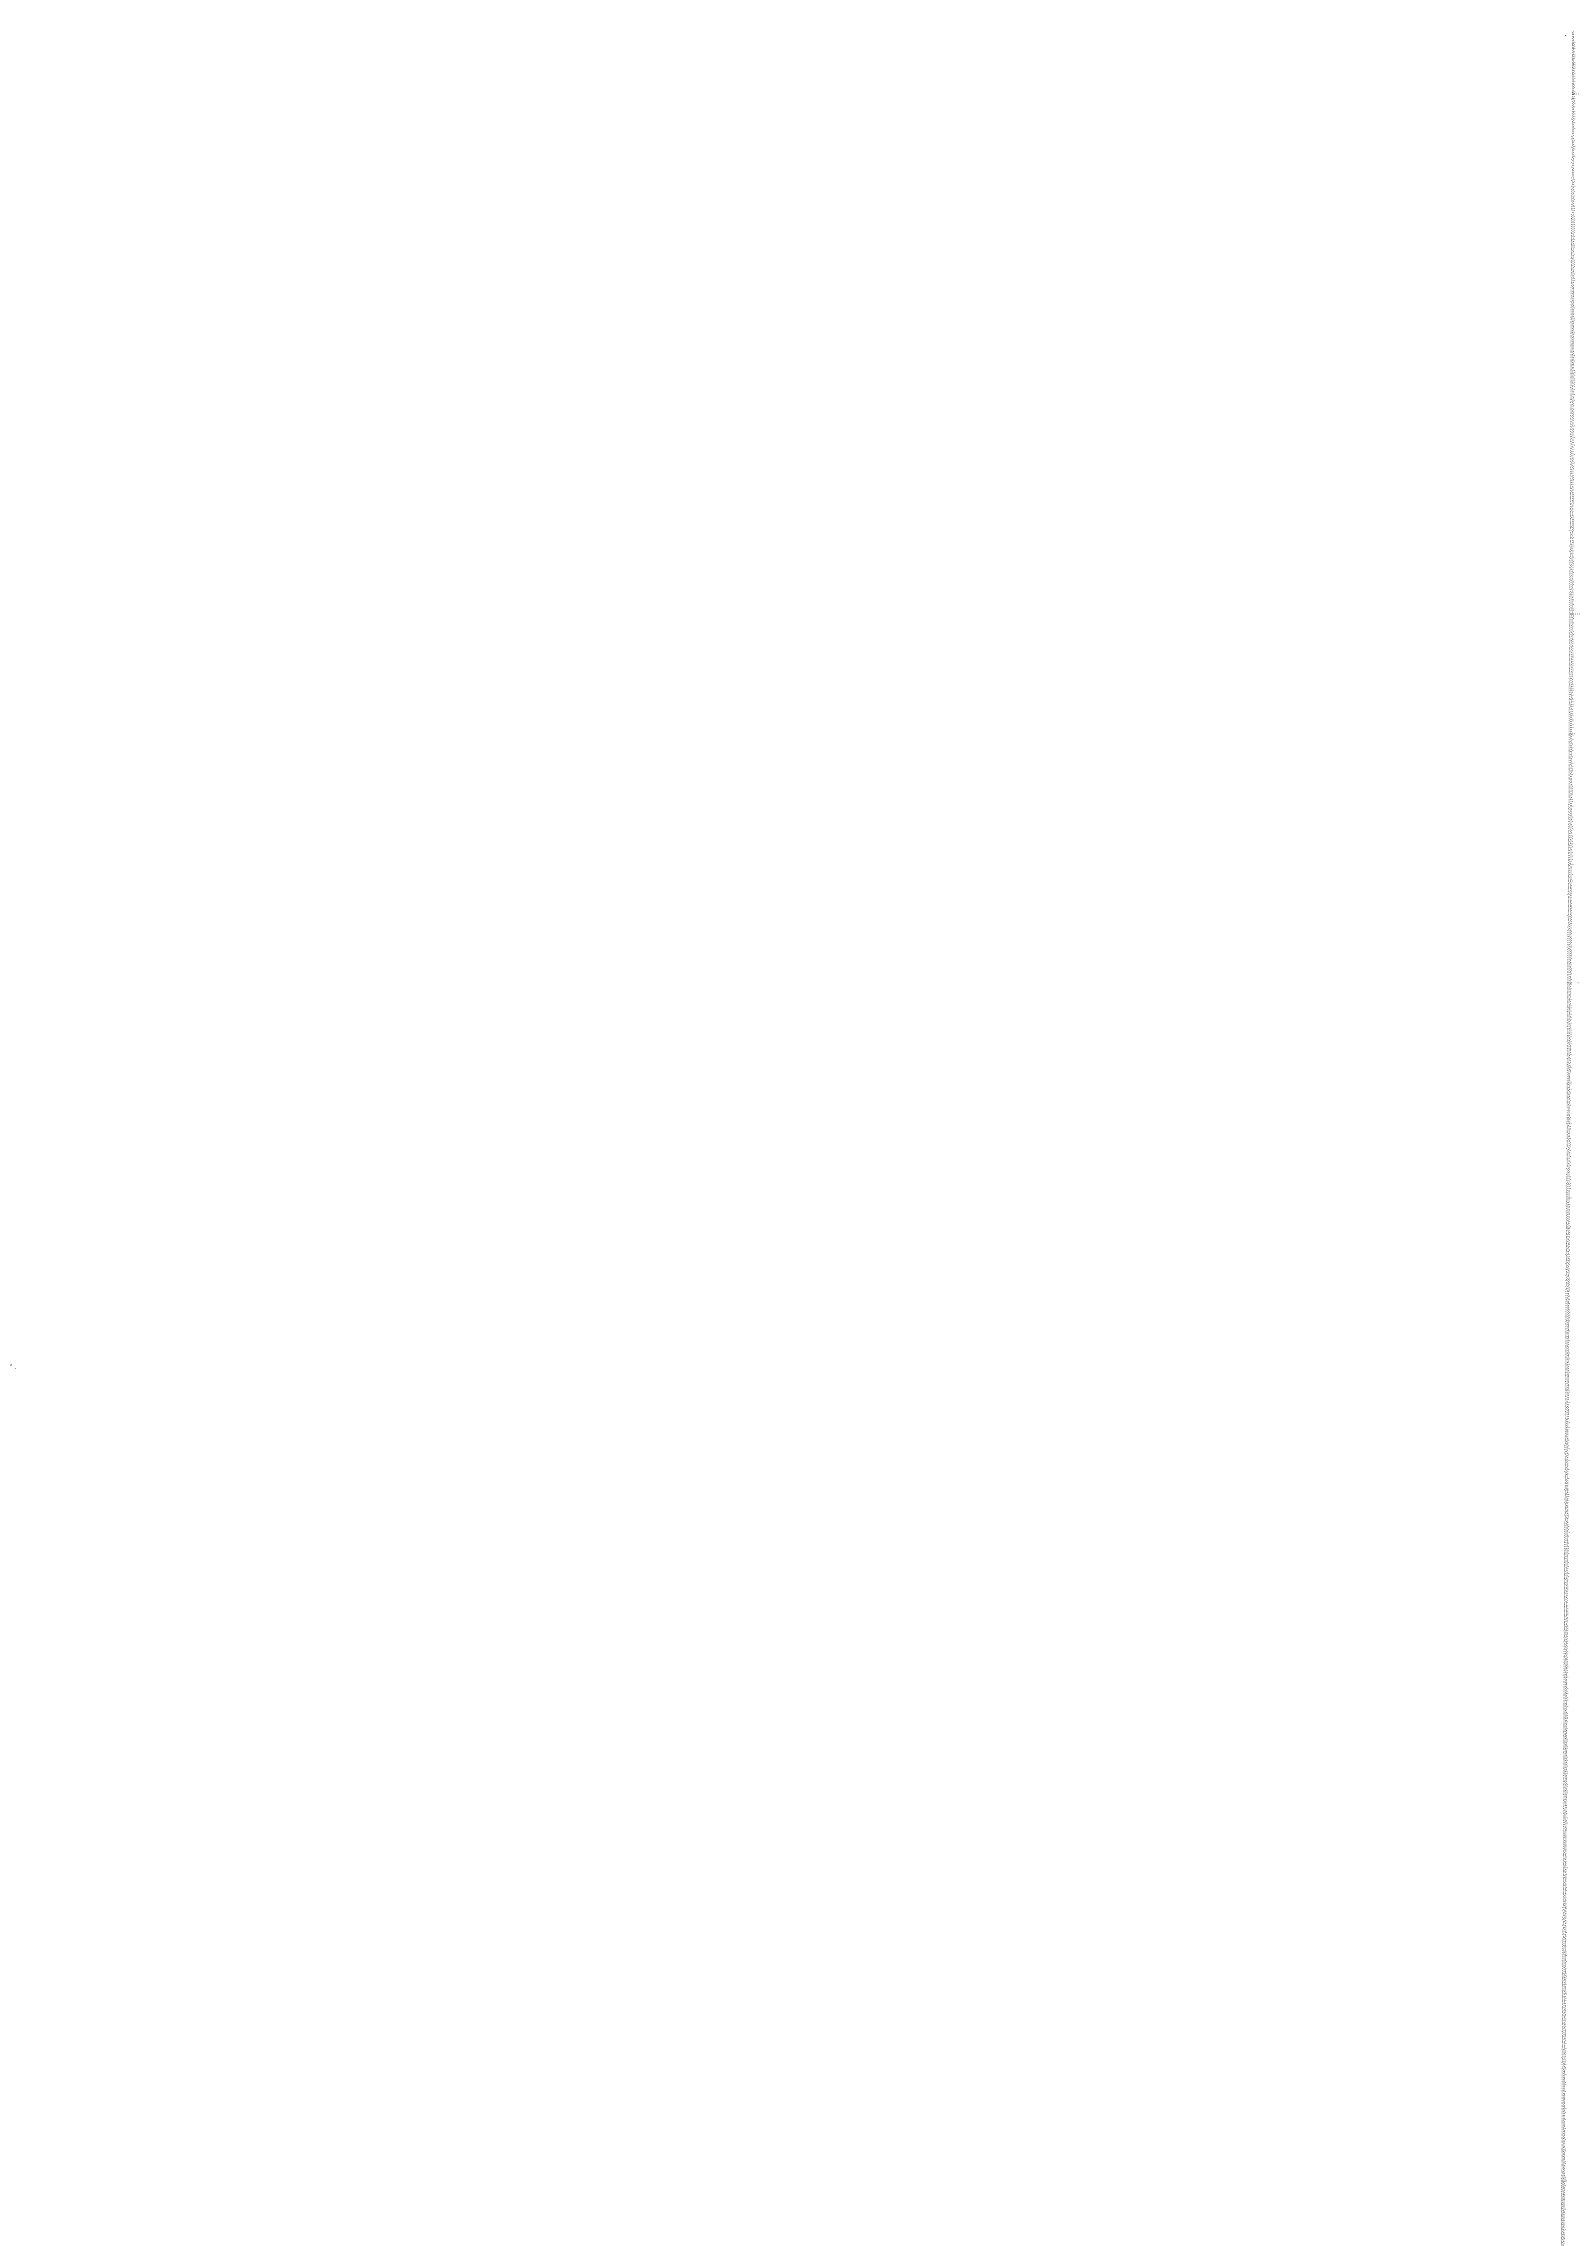

Број: 0809-50/152520200000139
Датум и време: 7.4.2020 г. 10:55:04

Makedonski Telekom CA,
Aristotel Isirov
Digitally signed by
Makedonski Telekom
CA, Aristotel Isirov
Date: 2020.04.09
09:59:57 +02'00'

ПОТВРДА
за регистрирана дејност


ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6101577
Назив:	Друштво за производство градежништво трговија и услуги ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ увоз-извоз Валандово
Седиште:	МАРШАЛ ТИТО 66 ВАЛАНДОВО, ВАЛАНДОВО

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	43.99 - Останати специјализирани градежни работи, неспомнати на друго место
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема


Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.


Изготвил:





Овластено лице:



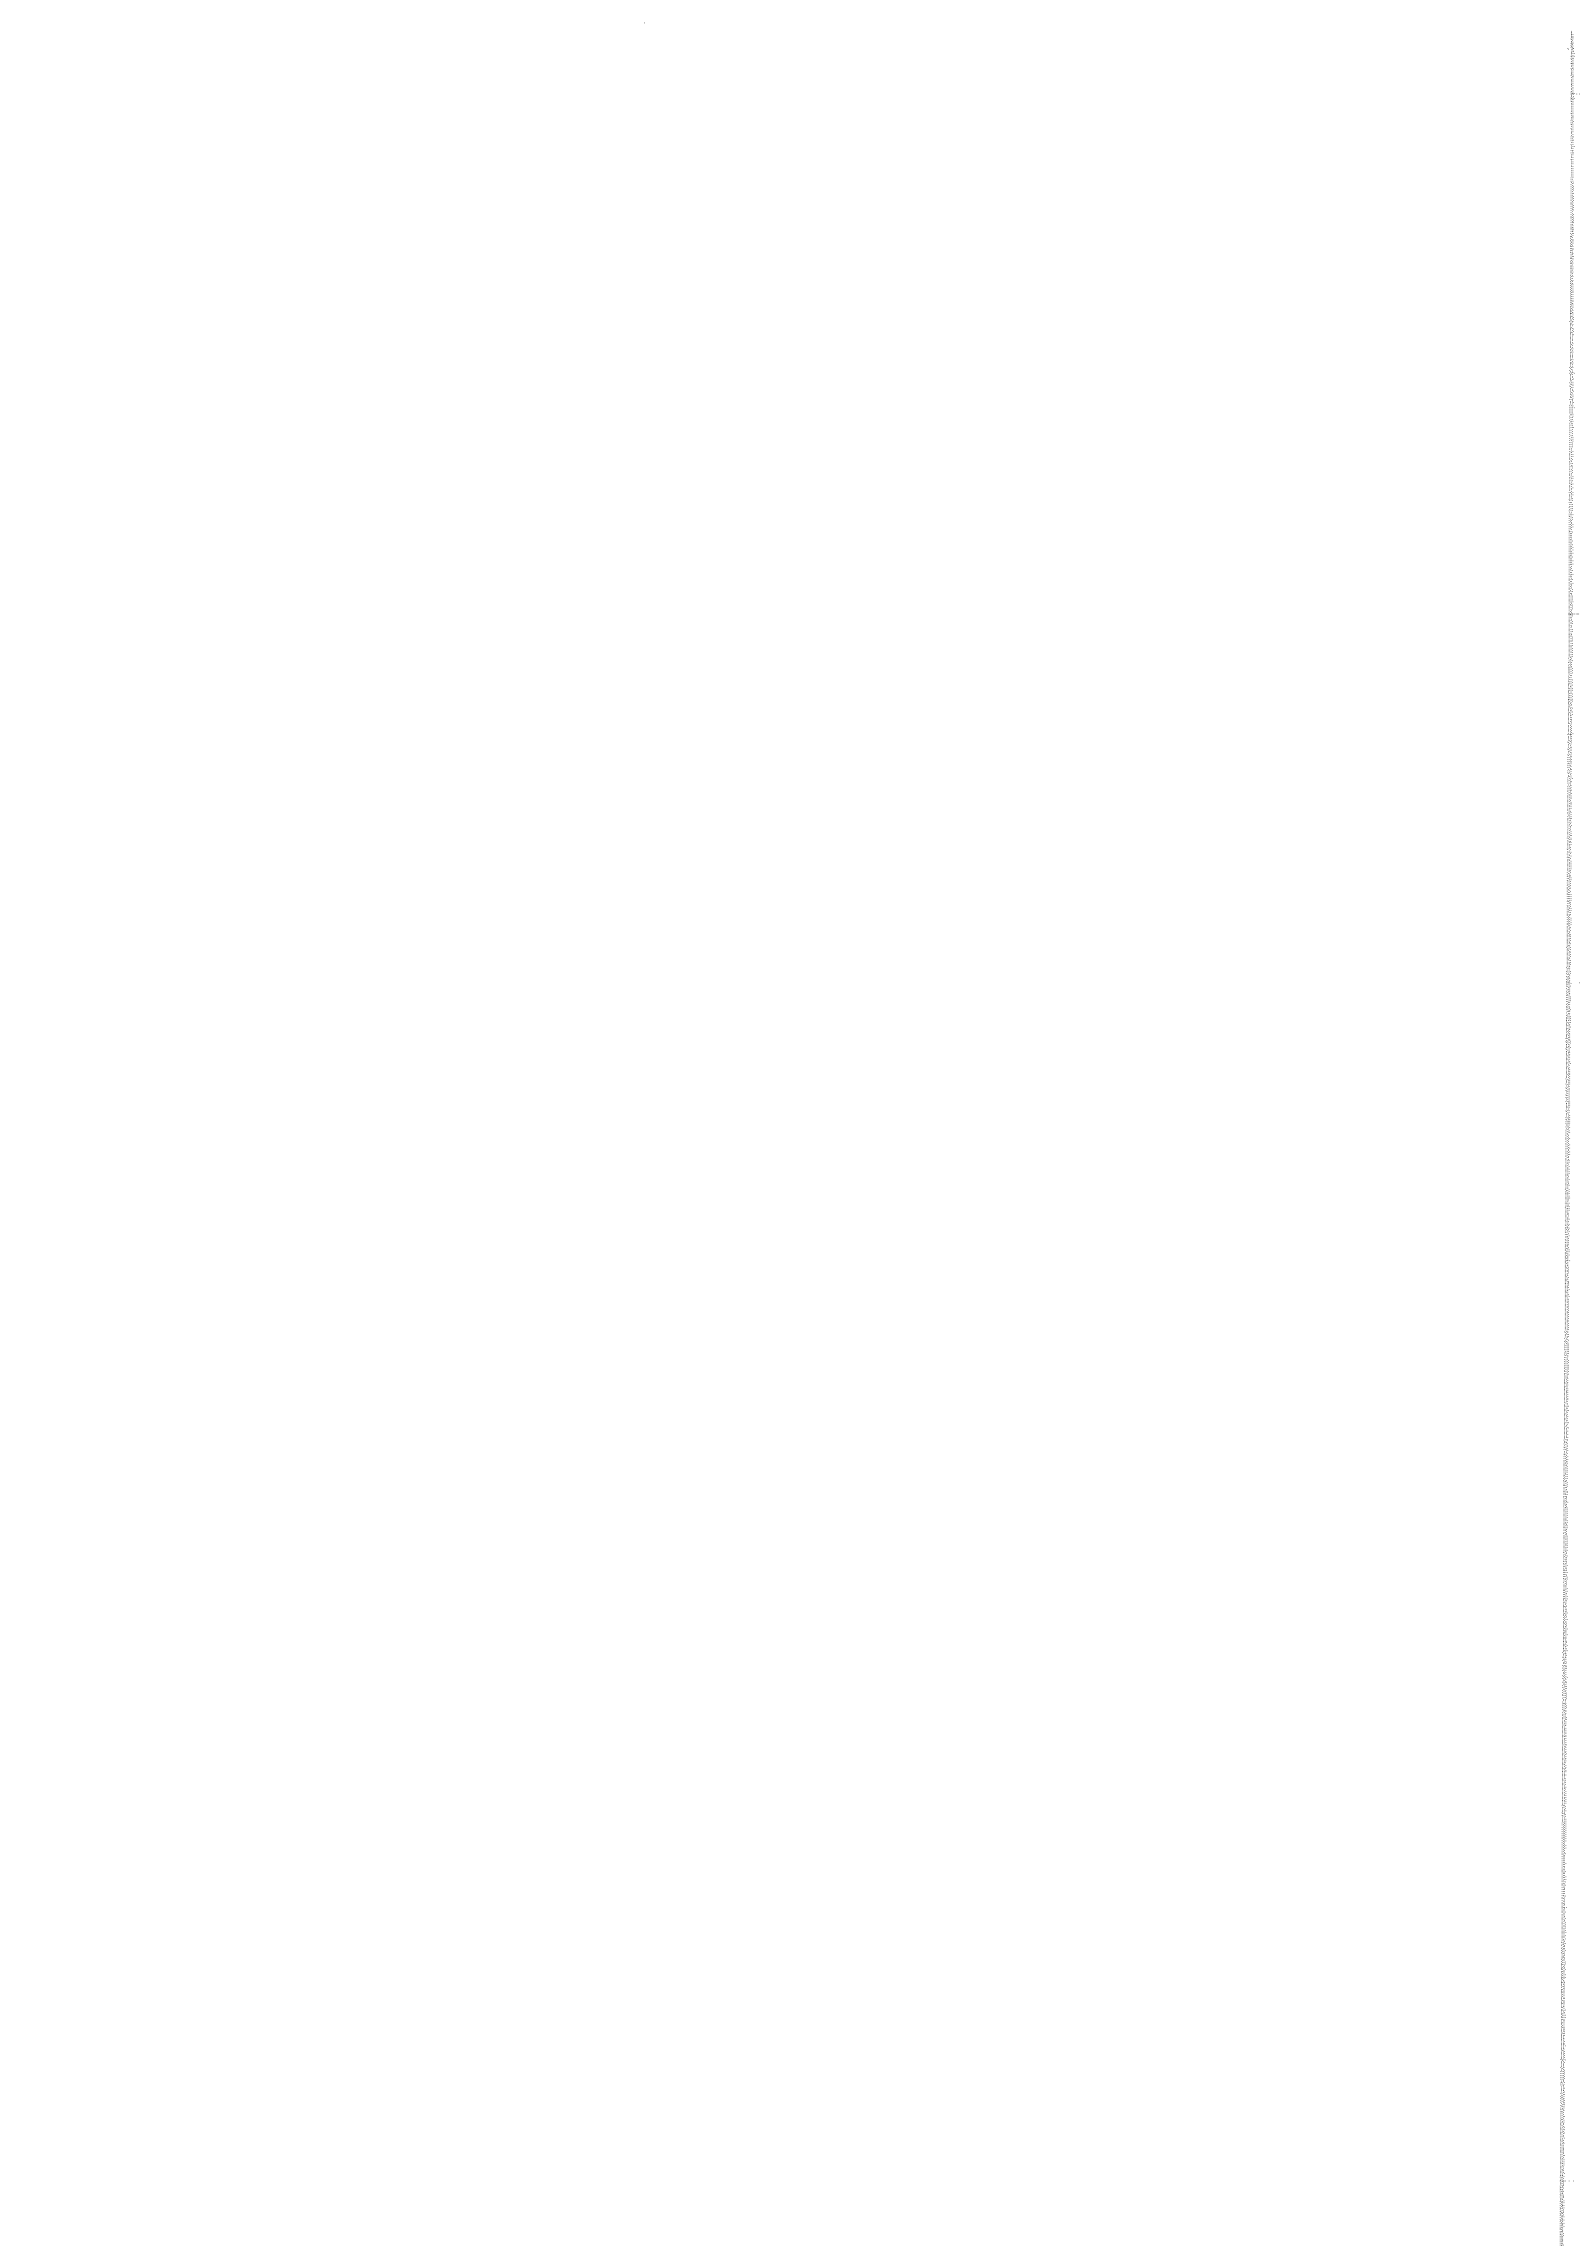

- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм
- Изработени од еколошки зидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм, надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43U(W/m2K) RAL 9002/9002.

• Внатрешни кабини сендвич панел PUR ѕид најмалку 40мм.

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betolur) табли 20мм
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 3 LED осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автомобилски осигурачи
- Доводна IP табла

Толер со 4 кабин и тоа:

- 3 Вд- кабин опремени со толетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
 - 3 Миралници
 - 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
 - 1 туш кабина комплет со батерија и ситот потребен врзен материјал
 - Довод
 - Олов
 - ПВЦ цевки
 - Електричен Бојлер 80л
 - Конвекторски панел за загревање 2KW
- или еквивалентни
- Конструкција:** Челично жетезо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009
- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект минимум 3мм

- **Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект** – (веле со туш кабин и тоалети - ПИИ 2) – клуч на рака со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контрмерите да се отркени со:

- Кровна конструкција (сводовен кров) или во зависност од модуларната поставеност

Кровни ребрасти панел (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0.4мм надворешно 0.4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0.43 U(W/m2K) RAL 9002/9002

- 1 ПВЦ - везна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“
- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саке“
- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм.

Изработени од еколошки зидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм, надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43U(W/m2K) RAL 9002/9002.

• Внатрешни кабини сендвич панел PUR ѕид најмалку 40мм

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betolur) табли 20мм
- ПВЦ под
- 3 LED осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автомобилски осигурачи
- Доводна IP табла

Комплетна инсталација

- 3 Вд- кабин опремени со толетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
 - 3 Миралници
 - 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
 - 2 туш кабин комплет со батерија и ситот потребен врзен материјал
 - Довод
 - Олов
 - ПВЦ цевки
 - Електричен Бојлер 80л
 - Конвекторски панел за загревање 2KW
- или еквивалентни
- Толер со 4 кабин и тоа:**

- 3 Вд- кабин опремени со толетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
 - 3 Миралници
 - 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
 - 2 туш кабин комплет со батерија и ситот потребен врзен материјал
 - Довод
 - Олов
 - ПВЦ цевки
 - Електричен Бојлер 80л
 - Конвекторски панел за загревање 2KW
- или еквивалентни
- Конструкција:** Челично жетезо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009
- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажн објект минимум 3мм

- **Изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект – (медицински персонал) –** клуч на рака со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“
- 1 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1400мм

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002.

Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Бетонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 2 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Климатизација-инвертер сплит систем 2,5KW

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажаен објект 3мм

- **Изработка трансपोर्ट и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модулари монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност - Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 2 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“ комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2/900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков

ПРИЛОГ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Согласно одлуките на Влада на Република Северна Македонија за мерки и препораки за заштита и превенција од Коронавирус COVID-19, а поради зголемување на бројот на заболени лица се јавува потреба од предвидување на нови болнички капацитети за згрижување на заболени лица. Министерството за здравство има потреба од набавка – прибирање на понуди за **Монтажни контејнери за употреба на здравствениот систем**, кои ќе се поставуваат во непосредна близина на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби при Универзитетскиот Клинички комплекс „Мајка Тереза“ во Скопје и во согласност со Извадок од Најрт-законикот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година. („Точка 10“). За таа цел, планирана е лесна, брза и монтажа изградба на медицински капацитети – болничко сместување со просторија за медицински персонал и згрижување со медицински третман на заболени лица од Коронавирус COVID-19.

Локацијата на која е предвидено поставување на модулите за монтажаен објект – контејнери, претходно на подлогата е поставено шпунџак и истата е нивелирана со тампон.

На локацијата ќе биде обезбеден приклучок на водоводна и канализациона мрежа и приклучок кон електро дистрибутивната мрежа заради потребите од снабдување со електрична енергија.

Со поставувањето на модулариите монтажаен објекти – контејнери се предвидува да се добие обезбеден простор за:

- (канцелариски) – за потребите на медицински персонал;
- сместувачки капацитет – болнички кревети;
- тоалети со туш кабини;
- ходник; и
- „топла врска“

Во прилог е даден: графички цртеж со просторно решение и диспозиција на модулите.

Технички карактеристики:

ДЕЛ 1.

- **Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажаен објект** – (вече со туш кабини – тоалети-ТИП 1.) - клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) или во зависност од модуларната поставеност
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“
- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саке“.

ПРИЛОГ 3 - Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, допотпишаниот _____Аристотел Исиров _____ [име и презиме], врз основа на член 101 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот „ДБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Веландово“, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекрпување на оваа изјава во случаите од член 101 став 7 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја давам оваа изјава.

Место и датум _____

Овластено лице _____

_____, 9.04.2020 _____

_____, Аристотел Исиров _____

- 13 ПВЦ - еднокрилни прозори со термоман стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PVC) најмалку 40мм кон заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лине" и надворешно фасадно "лине". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмалку 0.43 W/(m·K) RAL 9002/9002.

Поп:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм, 100мм x 20мм x 3мм, 80мм x 50мм x 3мм, 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Ветолур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 12 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Раводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурани
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009.

• Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм
Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2550мм/ должина 41000мм - директно/апативно. Поставаеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации.

***Начин на испорака за ДЕЛ 1 – во рок од 5-10 календарски дена од потпишување на договор.**
Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба.

ДЕЛ 1.

Ред. Бр.	ОПИС	Единична цена (денари)	Количина/ Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- ТИП 1	420500	4	1682000	302760	1984760
2	Монтажен објект - ТИП 2	420500	2	841000	151380	992380
3	Монтажен објект медицински персонал	190000	3	570000	102600	672600

4	Топла врска-коридор 41м	1070000	1070000	1	1070000	192600	1262600
ВКУПНО ЗА ПЛАНОВЕ							
							4912340

ДЕЛ 2.

1. Изработка, транспорт и монтаж на монтажен објект – (сместувачки) – клуч на рака-димензи: должина 6000 мм – ширина 7200 мм и висина 2600 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да бидат опремени со:

Кровна конструкција (двоен кров) ±100мм

- Кровни ребрasti панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- Олуци
- 1 ПВЦ- врата без праг 1050 мм – 2050мм исполна панел „сакс“
- 2 ПВЦ – двокрилни со термоман стакло, 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 1400мм-1400мм

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-4 0мм-3мм
- Цементни (Бетонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 ЛЕД светла x 18w
- 1 Преклучувач
- 6 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок – клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурани
- Доводна IP табла
- Инвертер сплит ситем за климатизација – 3,5 KW

или еквивалентни

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премакнато со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или „еквивалент“, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтаж објект најмалку 3мм

Дел 3. Рок на важност на понудата: 30 дена

На преговорите што ќе ги закаже договорниот орган, понудувачот ќе го претставува лице: **Роберт Исиров**, тел. **077 558 037**.

Дел 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

ПРИЛОГ: (Документите што се приложуваат кон понудата)

Со финансиската понуда задолжително се доставуваат и:

- документи за регистрирана дејност
- изјава за сериозност на понудата

ПРИЛОГ 2

Образец на понуда

[Автоморфен на понудувачот]

Врз основа на поканата за поднесување на понуди за должување на договор за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со поставка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итноост** и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел 1. Информации за понудувачот

1.1 Име на понудувачот: БТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Валањово _____

1.2 Контакт информации:

- Адреса: Марица Тито бр БВ Валањово _____
- Телефон: 077 558 037 _____
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: Роберт Исиров _____

1.3 Одговорно лице:

_____ Аристотел Исиров _____

1.4 Даночен број: 4003006105207 _____

Дел 2. Финансиска понуда

2.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за: **ДЕП 1 / 2 / 3 (соодветно да се пополни)**, вклучувајќи ги сите прошоци и попусты, без ДДВ, за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со поставка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итноост** 15396500 *Јако бр/к/л/* (_____ летнасмет милиони тисотини деведесет и шест илјади и петстотини денари _____) *Јако б/у/вн/* денари.
Вкупниот износ на ДДВ внесува 2771370 денари.

2.2 Ги прифаќаме начинот на плаќање и рокот на реализација на предметот на набавка утврдени во тендерската документација.

2. **Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – ходник за поврзување на објектите** оформени од модуларни монтажни – контејнери – димензии: должина 42000 мм – ширина 2400мм и висина 2550 мм- апроксимативно (надворешна димензија) или „еквивалентно“

Контејнерите да бидат одречени со:

Кровна конструкција Кровни ребрести панели (PUR) панелни најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полуреѓанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- 1 ПВЦ – дугла врата без праг 90 мм – 2050мм исполна термопан стапско 4+16+4
- 1 ПВЦ – со термопан стапско 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1400мм

Изработени од еколошки зидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "листе" и надворешно фасадно "листе". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4 мм, тежина на полуреѓанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-4 0мм-3мм
- Цементни (Ветонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 14 ЛЕД светла x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- Развојна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимално 3 автоматски осигурања
- Доводна ПР табла

Конструкција:

Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструиран S 235JR или „еквивалент“ согласно МКС EN10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

3. **Изработка трансподот и монтажа на топла врска кодидол** за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот куќа на рака.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR)** панели на малку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 2 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“ комплет со оков и можност за заклучување
 - 1 двокрилна ПВЦ врата – 2/900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков
 - 13 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм;

Изработени од еколошки чисти ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 3Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимално 3 автоматски осигурани
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железно антикорозивно споксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2550мм/ должина 18000мм- апроксимативно. Поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации.

- **Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект** – (вече со TUV кабини – тоалети- TYP I) - клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремен со:

- Кровна конструкција (едноволен кров) или во зависност од модуларната поставеност
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“

Економскиот оператор понудата електронски потпишана треба да ја достави на следната менаџерска адреса: valia.andonova@zdravstvo.gov.mk, најдоцна пристигнати до 09.04.2020 година до 10:00 часот.

5.1. Секој економски оператор, може да учествува за еден или повеќе делови од постапката за јавна набавка.

набавка или дока дека припата на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

3. Критериум за избор на најповолна понуда

Договорот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи **ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЛНАТА ПОНУДА ВРЗ ОСНОВА НА ЦЕНАТА.**

3.1 Цена на понудата

3.1.1 Во цената на понудата треба да се земат ги сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во денари.

3.2 Корекција на цени

3.2.1 При реализација на договорот за јавна набавка не се предвидува корекција на цените, односно цените исказани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото време траење на договорот за јавна набавка.

4. Начин и рок на плаќање, рок на испорака и важноста на понудата

4.1 Се предвидува следниов начин на плаќање:

- Плаќањето ќе се изврши по претходно изготвен записник за примопредавање од лицата задолжени за реализација на договорот назначени од Министерството за правда и доставена фактура по испорака, монтажа и извршено примопредавање.

4.2 Рок за реализирање на набавката

Договорниот орган со носителот на набавката ќе склучи договор за предметната набавка со носителот на набавката со времетраење до целосно реализација на договорот согласно начин на испорака наведена во техничката спецификација.

4.3 Период на важноста на понудата

Понудите треба да важат најмалку 30 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите, за чие времетраење понудата со сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудата што важи за покривок период од предвидениот, договорниот орган ја отфрла како неприфатлива понуда. Доколку договорниот орган процени за потребно, може да побара од понудувачот продолжување на периодот на важноста на понудата.

5. Начин на доставување на понудата

- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саке“;
- 1 ПВЦ - енокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм

Изработени од еколошки зградни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат згучна изолација, обложени со внатрешно „лице“ и надворешно фасадно „лице“. Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,431(W/m2K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабини сендвич панел PUR стил најмалку 40мм;

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Бетонур) таблаи 20мм
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 3 LED осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурач
- Доволна IP табла

Толет со 4 кабин и тоа:

- 3 Вч- кабини опремени со толетни јамки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мридаини
- 3 Батериски чепми комплет со врзен материјал
- 1 туш кабина комплет со батерија и ситот потребен врзен материјал
- Довод
- Оввод
- ПВЦ цевки
- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW

или еквиваленти

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премакван со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажаен објект минимум 3мм

***Начин на испорака за ДЕЛ 2 – во рок од 10-20 календарски дена од потпишување на договор. Давените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба**

ДЕЛ 2.

Ред. Бр.	ОПИС	Единична цена (денари)	Колчичина/Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- сместувачка	585000	12	7020000	1263600	8283600
2	Монтажен објект ходник - 42 м	1050000	1	1050000	189000	1239000
3	Монтажен објект медицински персонал	190000	1	190000	34200	224200
4	Топла врска- коридор 18м	369000	1	369000	66420	435420
5	Монтажен објект- ТИП 1	420500	4	1682000	302760	1984760
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						12166980

ДЕЛ 3.

- Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модулари монтажни – контејнери и ЈЗУ УК за Инфективни и фебрилни состојби, по принципот клуч на рака.

Топлата врска да биде опремена со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларијата поставеност
 - Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м², топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
 - 2 ПВЦ душли врати 2x 9000mm x 2050mm исполна термоман стакло 4x16x4 *комплет со оков и можност за заклучување
 - 1 двокрилна ПВЦ врата – 2 x 900/2050 мм исполна со термоман стакло 4x16x4 комплет со потребен оков и можност за заклучување
 - 8 ПВЦ - еднокрилни прозори со термоман стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм

Изработени од еколошки видни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина

потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност.

1.3 Предметот на договорот е делив на три дела:

ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);

ДЕЛ 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „свивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)

ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

1.3.1 Понудите кои ќе содржат рок на изведба кои ќе содржат поголем рок за изведба нема да бидат земени во предвид поради нивоа на постапката (безбедноста и здравјето на граѓаните).

1.4 Договорниот орган ќе склучи договор за предметната набавка со носителот на набавката со времетраење до завршување на пандемијата Ковид 19 во Република Северна Македонија.

1.5 Техничка спецификација на набавката: **монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност.**

1.6 Договорот за јавна набавка ќе се подели со примена на постапка со преговарање без претходно објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка Г) од Законот за јавните набавки.

1.7 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки донесените подзаконски акти.

2. Елементи на понуда

2.1 Понудата треба да е составена од следниве елементи:

- Образец на понуда (Прилог 2),
- Документ за регистрирана дејност,
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),

2.2 Критериуми за утврдување на способност

2.2.1. Економскиот оператор треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.3 Начин на докажување на способноста на понувачот

2.3.1 За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна

**ПОСТАПКА СО
ПРЕГОВАРАЊЕ БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС ЗА**

за јавна набавка на

**Монтажни контејнери за потреби на здравствениот систем
со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност**

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- Под
 - Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
 - Цементни (Ветолур) табли 20мм
 - ПВЦ под
 - Комплетна инсталација
 - 20 Неонски осветлувања x 18w
 - 2 Прекинувач
 - 5 Монофазни надградни приклучоци
 - 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурани
 - Доводна IP табла
- Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно MKS EN 10025-2:2009
- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 3000мм / висина 2550мм/ должина 340000мм - апроксимативно. Детална поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации. Изведувањот е должен на направа разработка на скицата и работилнички цртежи.


***Начин на испорака за ДЕЛ 3 – во рок од 10-20 календарски дена од потпишувањето на договорот. Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба**

ДЕЛ 3.

Ред. Бр.	ОПИС	Единична цена (денари)	Количина парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Топла врска – коридор 34 м	922500	1	922500	166050	1088550
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						1088550

Скопје, април 2020 година

1. Општи информации во врска со договорниот орган и предметот на набавка
- 1.1 Договорен орган е Министерството за здравство, со адреса ул. „50-та Дивизија“ бр.14, телефон за контакт +389 2 311 2 500, контакт лице Евожин Ложанкоски.
- 1.2 Предмет на договорот за јавна набавка е јавна набавка на **Монтажни контејнери** за

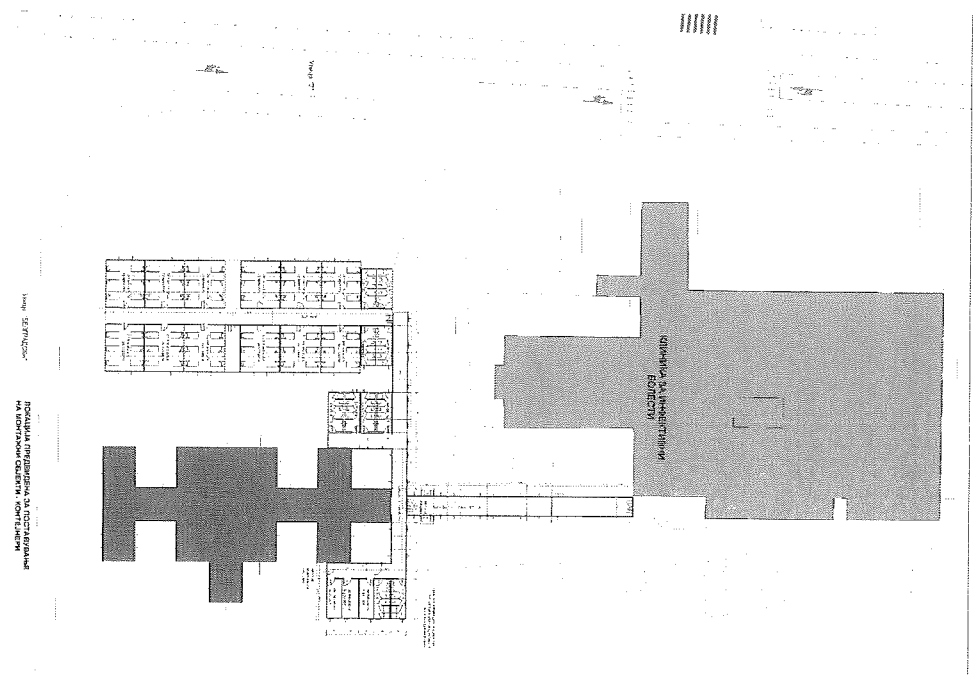

ДО: ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Веландово

ПРЕДМЕТ: Покана за поднесување понуда за јавна набавка на монтажни контејнери со поставка со преговаранье без објавување оглас од причини од крајна итноста

Почитувани,

Министерство за здравство, со адреса на ул. 50 Дивизија бр.14, и електронска пошта kontakt@zdravstvo.gov.mk, има потреба од јавна набавка на **монтажни контејнери со поставка со преговаранье без објавување оглас од причини од крајна итноста**. За таа цел, Министерство за здравство спроведува поставка со преговаранье без објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) од Законот за јавните набавки. Ве молиме да ни доставите првична понуда електронски потпишана за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка во согласност со придожената техничка спецификација најдоцна до 09.04.2020 година до 10:00 часот следната меил адреса: vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk.

Ве молиме при илготување на Вашата понуда да ги користите оригиналните образци кои се составен дел на тендерската документација.

Молиме, во понудата да навелете и лице кое во име на понудувачот ќе учествува во преговорите за реализација на набавката (име и презиме, контакт телефон).

Однапред благодариме на соработката.

Одговорно лице
Министер
Д-р Венко Филмиче

Број: 0809-50/150620200000728

Датум и време: 17.2.2020 г. 12:37:11


ПОТВРДА
за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5789885
Назив:	Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес
Седиште:	РАШТАНСКИ ПАТ бр.2 ВЕЛЕС, ВЕЛЕС

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	25.93 - Производство на жичани производи, синцири и пружини
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема


Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.


Изготвил:





Овластено лице:



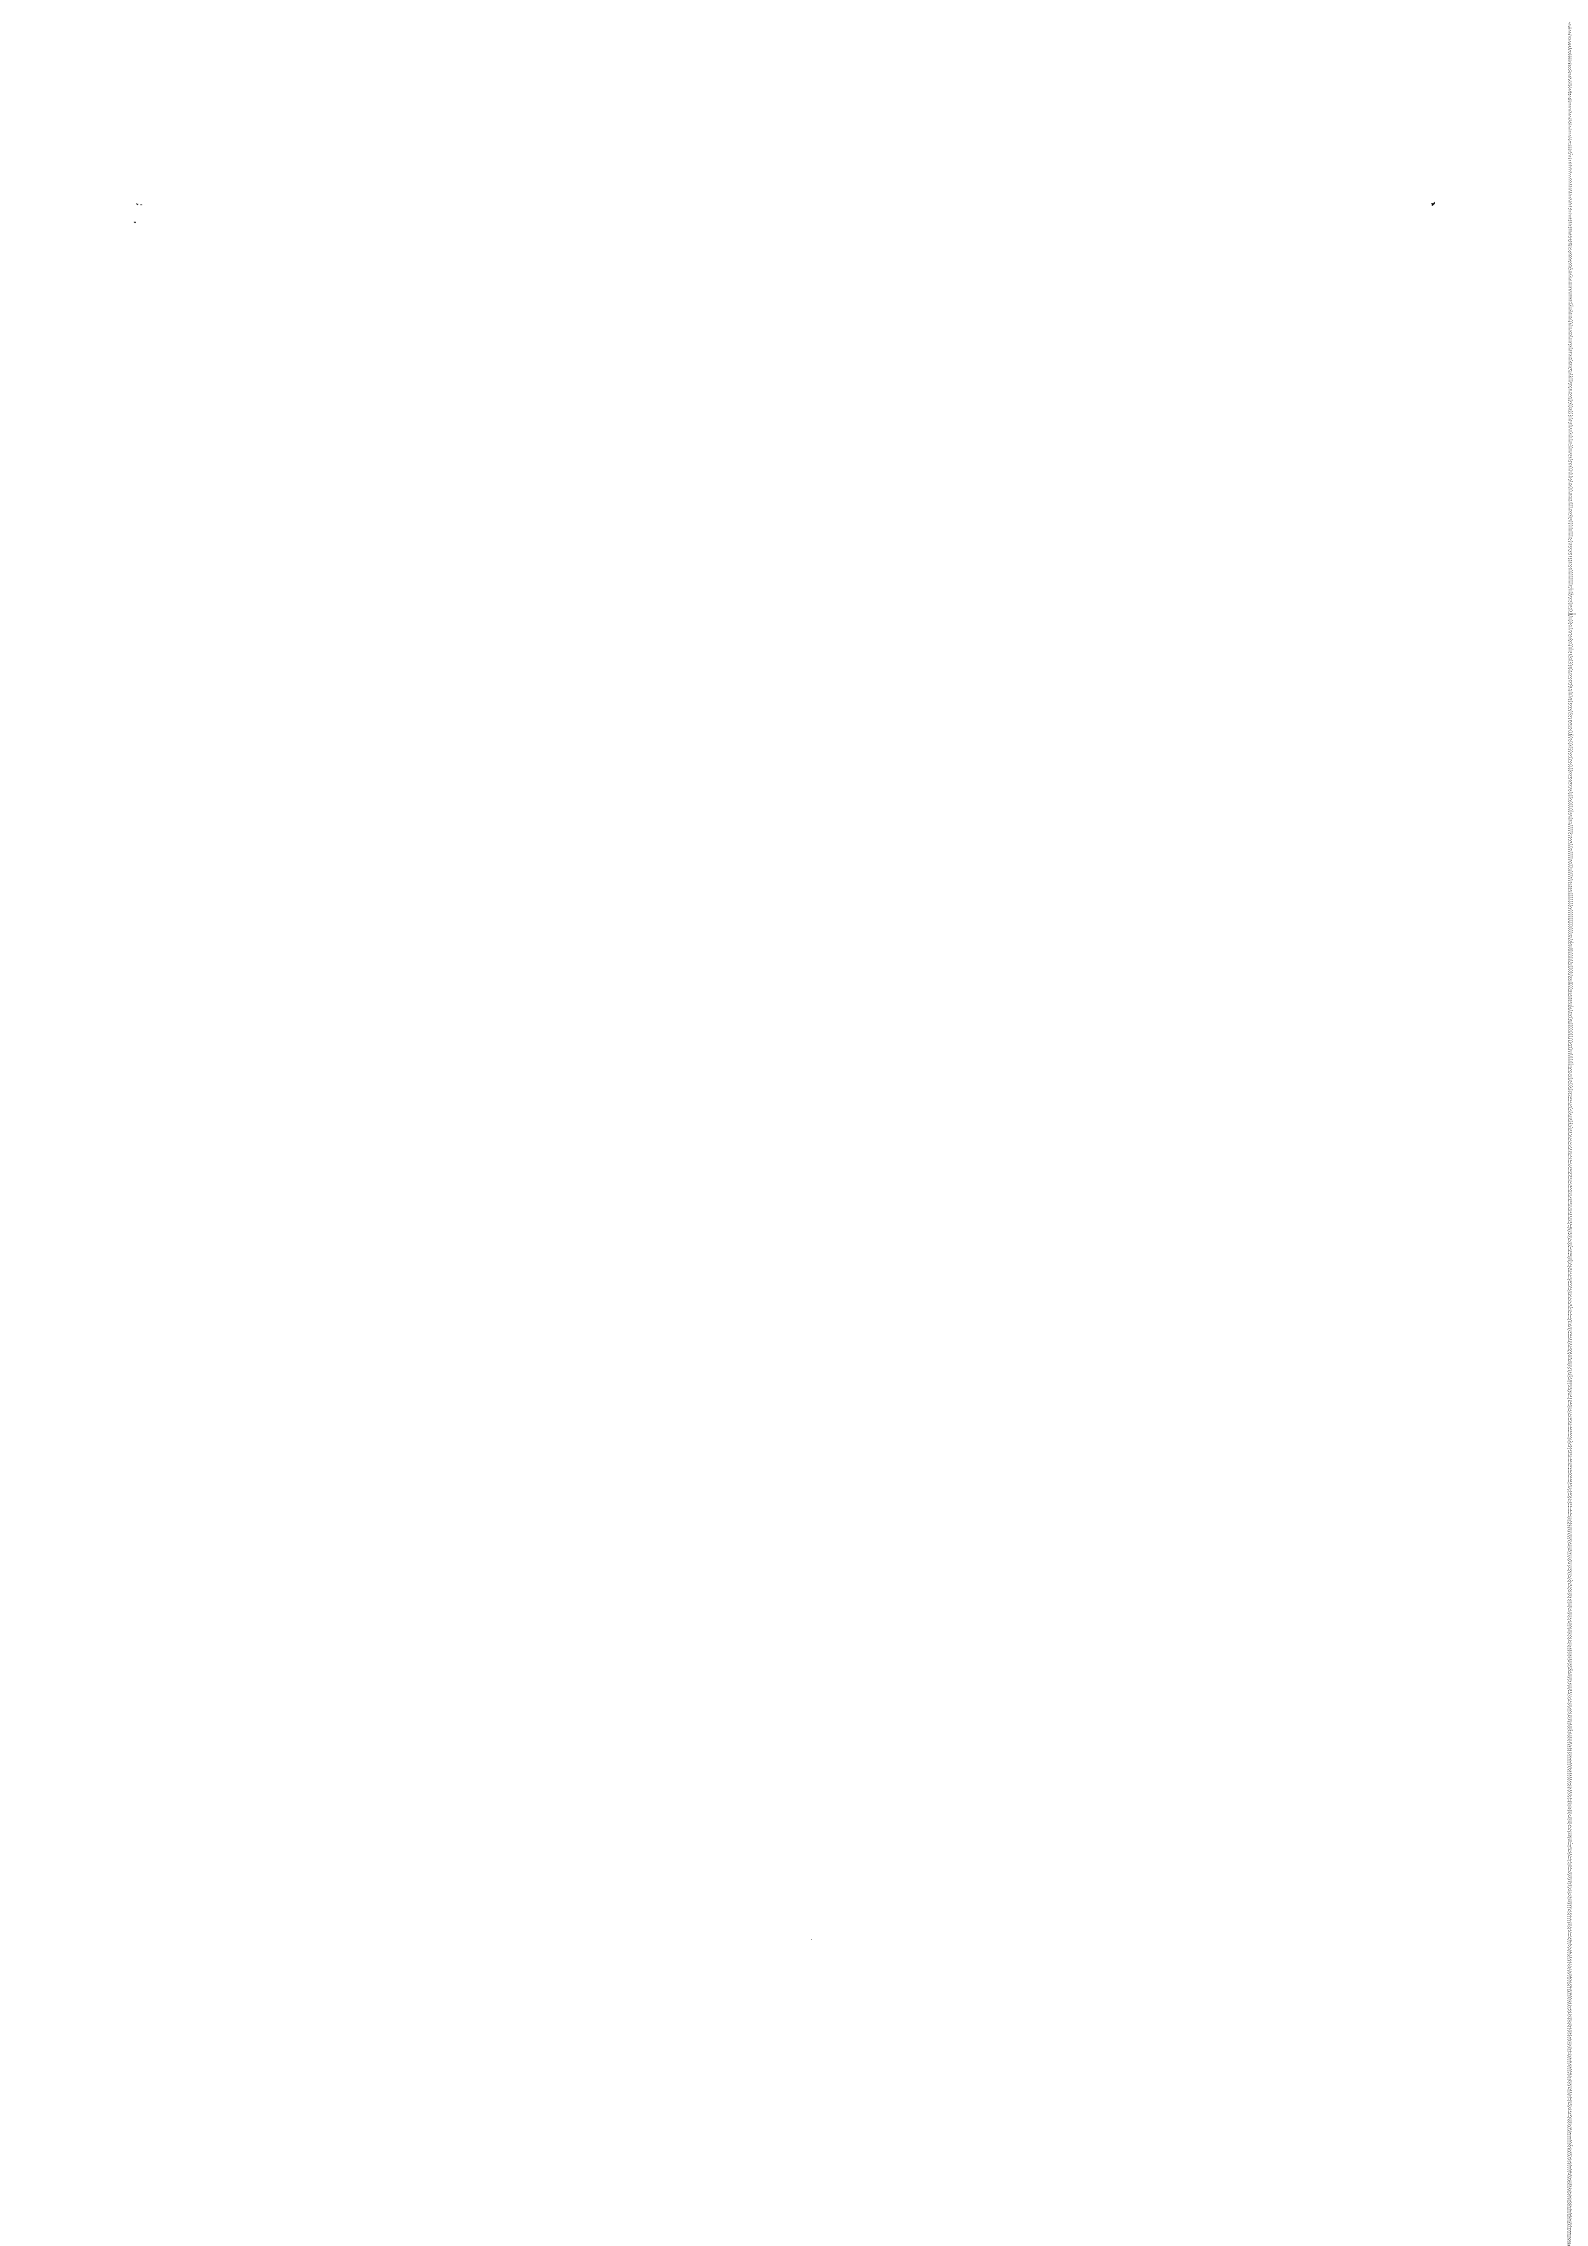

Образец на понуда

Врз основа на поканата за поднесување на понуди за доделување на договор за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел 1. Информации за понудувачот

1.1. Име на понудувачот: **ДПТУ БРАКО ДОО**

1.2. Контакт информации:

- Адреса: ул. Раштански пат бр. 2 , 1400 Велес- Република Северна Македонија
- Телефон: **043 212 560**
- Факс: **043 232 534**
- Е-пошта: sales@brako.com.mk ; blagoj@brako.com.mk
- Лице за контакт: **Благој Шалев**

1.3. Одговорно лице: **Благој Шалев**

1.4. Даночен број: **4004003114759**

Дел 2. Финансиска понуда

2.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за: **ДЕЛ 1, 2 и 3** вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, за за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** **12.145.891,00**ден (дванаесет милиона сто четириесет и пет илјади и осумстотини деведесет и еден денар)*[со букви]* денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува **2.186.260,38**денари

2.2 Ги прифаќаме начинот на плаќање и рокот на реализација на предметот на набавка утврдени во тендерската документација.

Дел 3. Рок на важност на понудата: 30 дена

На преговорите што ќе ги закаже договорниот орган, понудувачот ќе го претставува лицето:
Благој Шалев , тел 078 265 358

Дел 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

ПРИЛОГ:

- документи за регистрирана дејност
- изјава за сериозност на понудата
- Техничка понуда и листа со цени

ДПТУ БРАКО ДОО

Blagoj
Shalev

Digitally signed by
Blagoj Shalev
DN: ou=Upravitel,
o=DPTUBRAKODOO,
c=MK,
email=blagoj@brako.co
m.mk, sn=Shalev,
givenName=Blagoj,
cn=Blagoj Shalev
Date: 2020.04.09
09:07:10 +02'00'

/Управител-Благој Шалев/

ПРИЛОГ 3 - Изјава за сериозност на понудата

ДО

**Министерство за здравство
со адреса на ул. 50 Дивизија бр.14-Скопје
Република Северна Македонија**

ПРЕДМЕТ: поднесување понуда за јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот Благој Шалев врз основа на член 101 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот ДПТУ БРАКО ДОО ул. Раштански пат бр. 2 1400 Велес, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 101 став 7 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум


Велес, 09.04.2020

Овластено лице

Благој Шалев

**Blagoj
Shalev**

Digitally signed by Blagoj Shalev
DN: ou=Upravitel,
o=DPTUBRAKODOO, c=MK,
email=blagoj@brako.com.mk,
sn=Shalev, givenName=Blagoj,
cn=Blagoj Shalev
Date: 2020.04.08 12:48:59 +02'00'

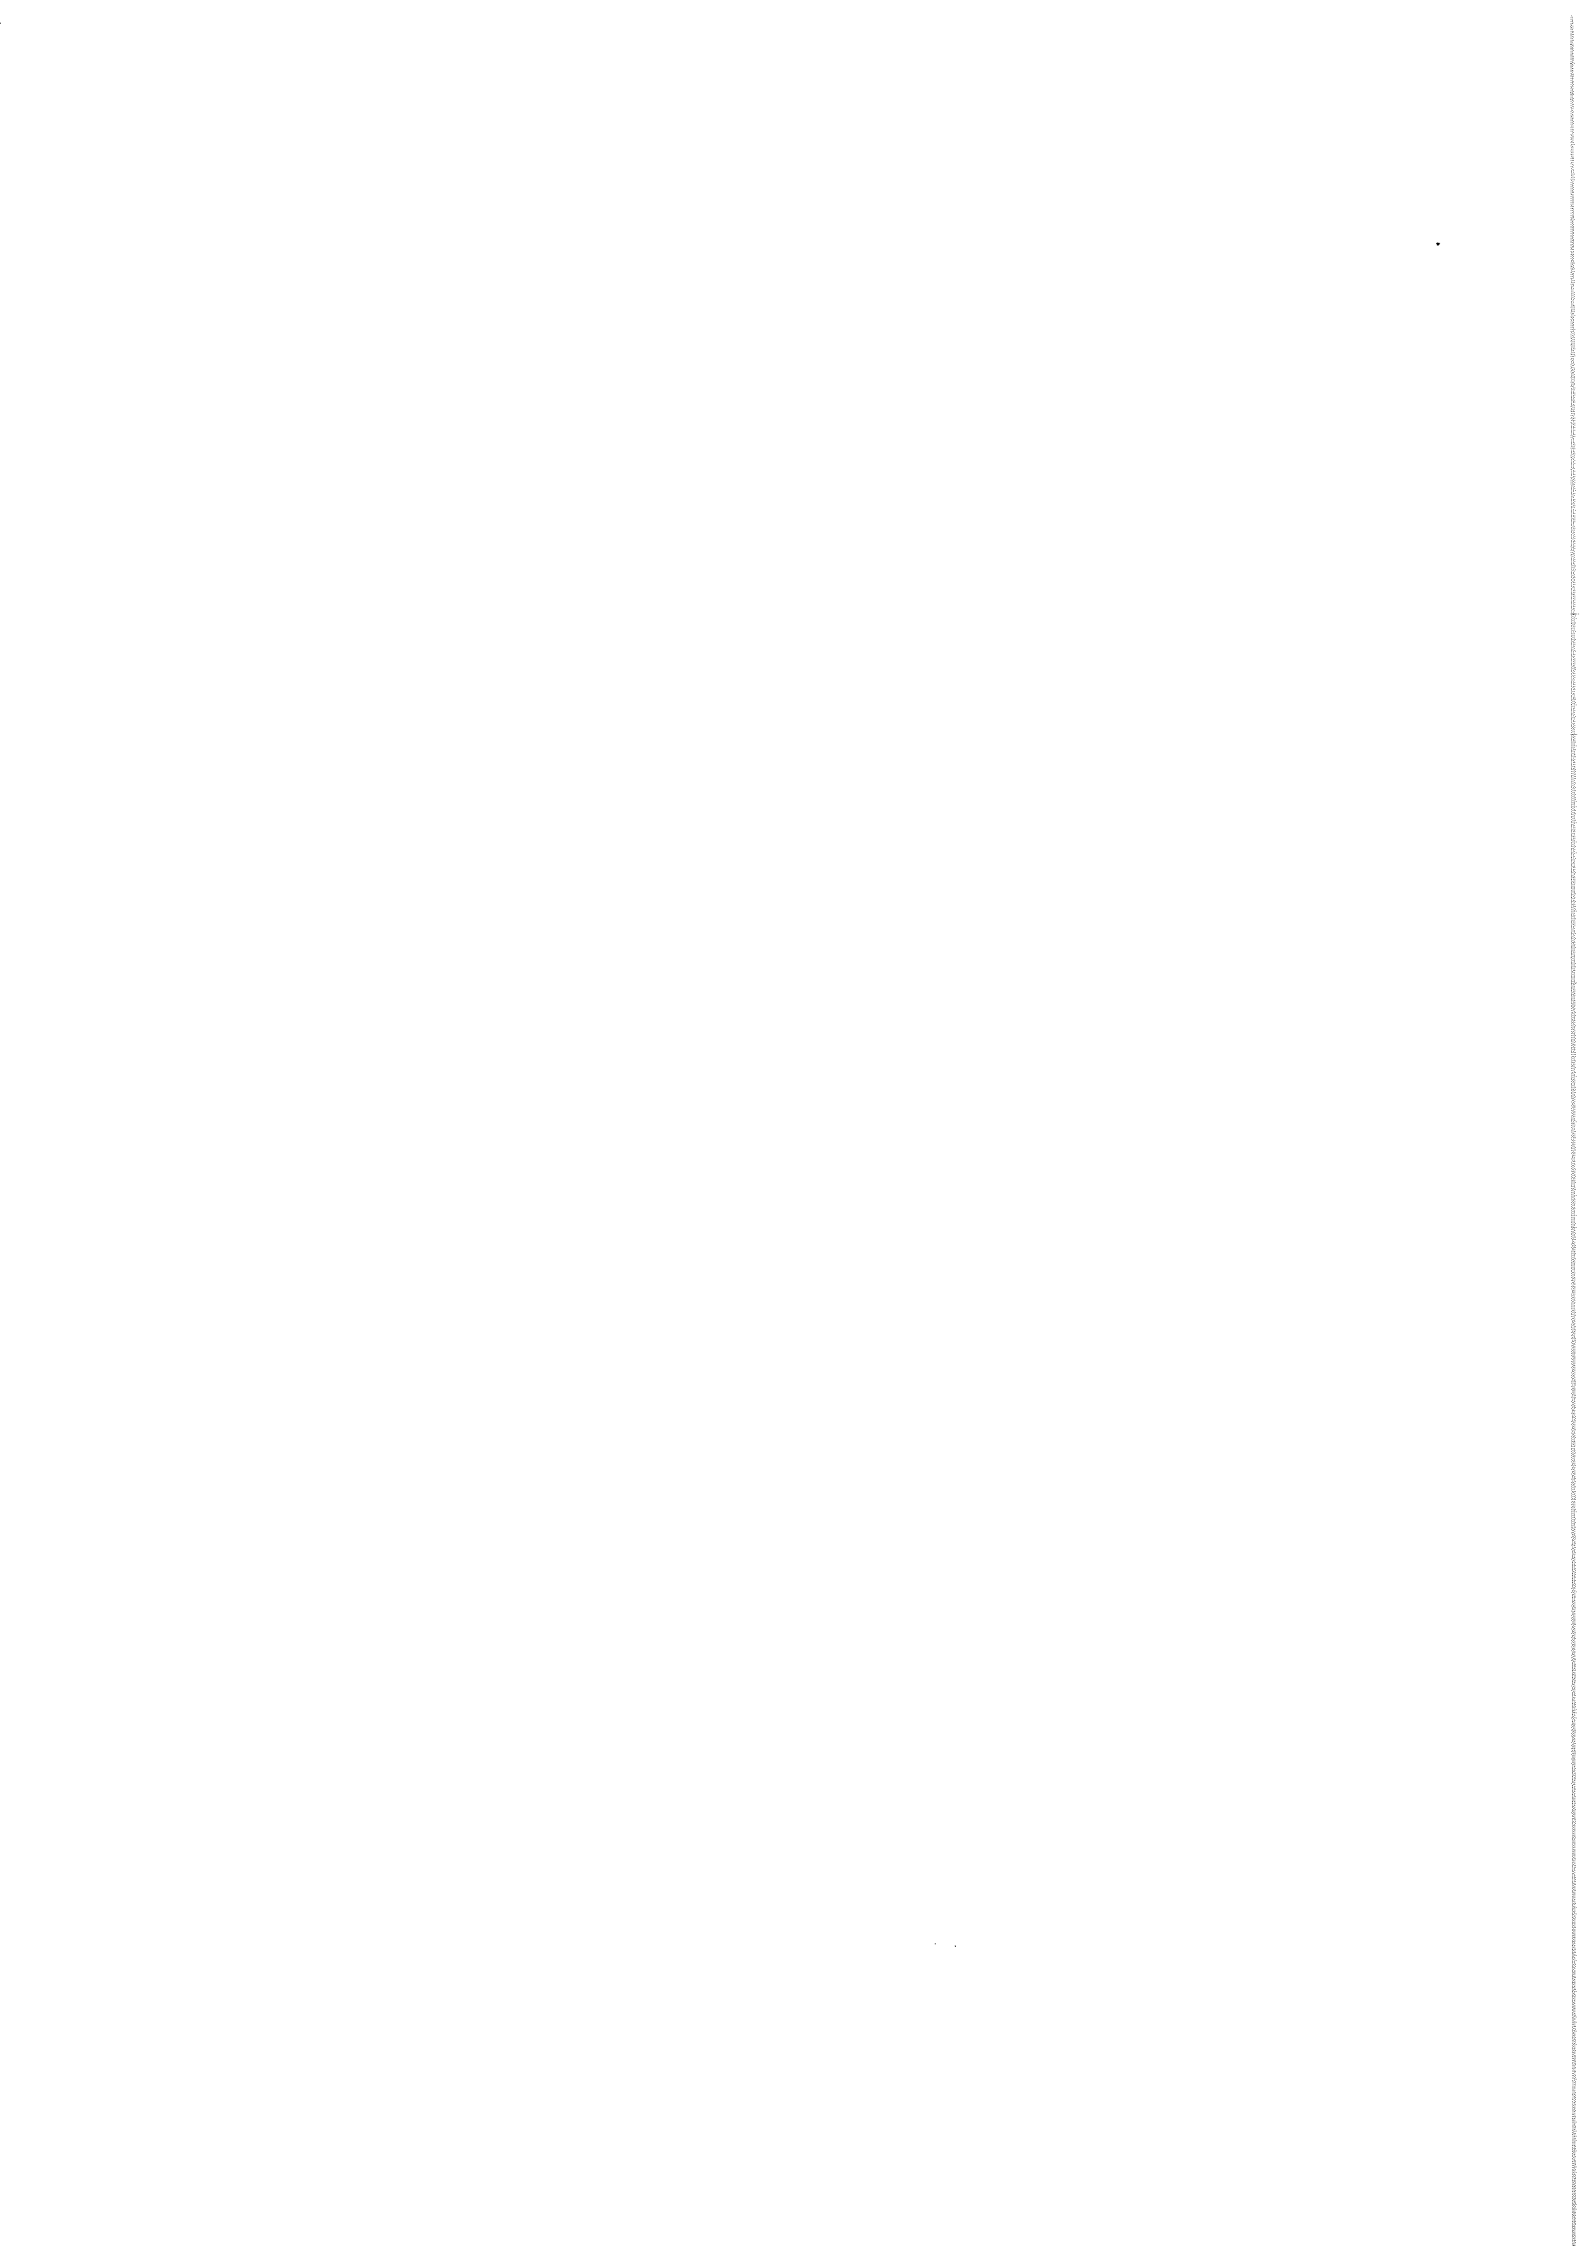

- 1 ПВЦ – дуила врата без праг 90 мм – 2050мм исполна термопан стакло 4+16+4
- 1 ПВЦ – со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1400мм

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40мм кон заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4 мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-4 0мм-3мм
- Цементни (Ветонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 14 ЛЕД светла x 18w
- 1 Прескпувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција:

Челично железо (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потоа офарбано со електростатско прашкасто фарбање со индустриска полиестерска боја отпорна на надворешни влијаниа, конструктивен S235JR, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажнен објект најмалку 3 мм
- 3. **Изработка, транспорт и монтажа на монтажнен објект – (механички персонал) –** клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (слюводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „сакс“
- 1 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1400мм

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) 40мм кон заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Ветонур) табли 20мм

ДЕЛ 2.

1. **Изработка, транспорт и монтажа на монтажнен објект – (местувачици) –** клуч на рака- димензии: должина 6000 мм – ширина 7200 мм и висина 2600 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да бидат опремени со:

Кровна конструкција (двоводен кров) ±100мм

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- Олуци
- 1 ПВЦ - врата без праг 1050 мм – 2050мм исполна панел „сакс“
- 2 ПВЦ – двокрилни со термопан стакло, 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 1400мм-1400мм

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40мм кон заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице".

Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-4 0мм-3мм
- Цементни (Ветонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 ЛЕД светла x 18w
- 1 Прескпувач
- 6 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Инвертер слит ситем за климатизација – 3.5 KW

или еквивалентни

Конструкција: Челично железо (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потоа офарбано со електростатско прашкасто фарбање со индустриска полиестерска боја отпорна на надворешни влијаниа, конструктивен S235JR, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажнен објект најмалку 3 мм

2. **Изработка, транспорт и монтажа на монтажнен објект – ходник за поврзување на објектите**

оформени од модуларни монтажни – контејнери – димензии: должина 42000 мм – ширина 2400мм и висина 2550 мм- апроксимативно (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да бидат опремени со:

Кровна конструкција Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 2 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Превинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Разводна IP табла
- Климатизација- инвертер сплит систем 2,5KW

Конструкција: Челично жезло (конструкција) заштитен со хемиска превака и потоа офарбано со електристаско пращаско фарбање со индустријска полиестерска боја отпорна на надворешни влијанија, конструктивен S235JR, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажаен објект 3мм

1.Изработка гранспорт и монтажа на топла врска кодифор за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и платорска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (сновожен кров) – или во зависност од модуларната поставеност
Кровни ребрасни панели (PFR) панели на малку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на погнуретаног најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- 6 ПВЦ - енокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм.

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PFR) најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на погнуретаног најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002.

Пол

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм, 100мм x 20мм x 3мм, 80мм x 50мм x 3мм, 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Ветолур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Превинувач

влинјаниа, конструктивен S235JR, согласно МКС EN 10025-2:2009.Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажаен објект најмалку 3мм
 Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2550мм/ должина 41000мм - апроксимативно. Поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица притоа на техничките спецификации.

***Начин на испорака за ДЕЛ 1 – во рок од 10 календарски дена од потпишување на договорот.**
 Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичња состојба.

НАПОМЕНА: То задржуваме правото на измена на динамиката согласно произвоодствените капацитети. И условите на терен за монтажа. Секој застој поради неспремен терен, објект или било која друга причина од страна на купувачот ќе биде дојден на динамичкиот план како продолжување на рокот на исполнување. Локолку се случи застој поради непредвидени случувања кои се надвор од наша Контрола како болест, временски непогоди и слично то задржуваме правото на промена на динамичкиот план на испораките и монтажајата. Купувачот има обврска да ги обезбеди сите потребни дозволи за работа во време на полицискиот час како и сите други потребни дозволи за работа во клиничкиот центар.
 Сите потребни дозволи за транспорт да се обезбедат од страна на купувачот.

ДЕЛ 1.

Ред.бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количина на/Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект - ТИП 1	251.736,00	4	1.006.944,00	181.249,92	1.188.193,92
2	Монтажен објект - ТИП 2	251.736,00	2	503.472,00	90.624,96	594.096,96
3	Монтажен објект Медицински	160.235,00	3	480.705,00	86.526,90	567.231,90
4	Топла врска - коридор 41м	919.330,00	1	919.330,00	165.479,40	1.084.809,40
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						3.434.332,18

- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Климатизација-инвертер сплит систем 2,5KW

Конструкција: Челично железо (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потоа офарбано со електростатско прашкасто фарбање со индустриска полиестерска боја отпорна на надворешни влијанија, конструктивен S235JR, согласно MKC EN 10025-2:2009. Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект 3мм

4. Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност - Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 2 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“ комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2/900/2050 мм исполна со термоман стакло 4x16x4 комплет со потребен оков
- 13 ПВЦ - еднокрилни прозори со термоман стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм

Изработени од еколошки видни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Ветолур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 12 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железо (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потоа офарбано со електростатско прашкасто фарбање со индустриска полиестерска боја отпорна на надворешни

- 3 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железо (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потоа офарбано со електростатско прашкасто фарбање со индустриска полиестерска боја отпорна на надворешни влијанија, конструктивен S235JR, согласно MKC EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2550мм/ должина 18000мм- апроксимативно.

Поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации.

5. Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажнен објект – (веще со туш кабинни – тоалетн-ТНП1) - клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) или во зависност од модуларната поставеност
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саќе“;
- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термоман стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм

Изработени од еколошки видни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабинни седишни панел PUR ѕид најмалку 40мм;

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Ветолур) табли 20мм
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 3 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци

- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Тоалет со 4 кабини и тоа:

- 3 Вц- кабини опремени со толстни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мијалници
- 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
- 1 туш кабина комплет со батерија и сноп потребен врзен материјал
- Довод

- Олов
- ПВЦ цевка
- Електричен Болер 80л
- Конекторски панел за запревање 2KW или еквивалентни

Конструкција: Челично железно (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потоа офарбано со електроштатско прашкасто фарбање со индустријска полиестерска боја отпорна на надворешни влијанија, конструктивен S235JR, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект минимум 3мм

***Начин на испорука за ДЕЛ 2 – во рок од 20 календарски дена од потпишување на договорот.**

Делените димензии и должини се дименсионални и истите ќе се утврдуваат по фактичката состојба

НАПОМЕНА: То задржуваме правото на измена на динамиката согласно произволствените капацитети И условите на терен за монтажа. Секој застој поради неспремен терен, објект или било која друга причина од страна на купувачот ќе биде доведен на динамичкиот план како продолжување на рокот на исполнување. Доколку се случи застој поради непредвидливи случувања кон се надвор од наша Контрола како болест, времевски непогоди и слично го задржуваме правото на промена на динамичкиот план на испораките и монтажата. Купувачот има обврска да ги обезбеди сите потребни дозволи за работа во време на подготвката. Сите потребни дозволи за транспорт да се обезбедат од страна на купувачот.

Толер со 4 кабин и тоа:

- 2 Вл- кабин опремени со тоалетни шклови со ниско носечко казанье комплет со вршен материјал
- 3 Мидлиници
- 3 Батериски чешки комплет со вршен материјал
- 2 туп кабин комплет со батерија и ситог потребен вршен материјал
- Довод
- Олов
- ПВЦ цевки
- Електричен Болер 80л
- Конекторски панел за запревање 2KW или еквивалентни

Конструкција: Челично железно (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потоа офарбано со електроштатско прашкасто фарбање со индустријска полиестерска боја отпорна на надворешни влијанија, конструктивен S235JR, согласно МКС EN 10025-2:2009

Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект минимум 3мм

3. **Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (медиишки персонал) –** ку'ч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со:

- Кровна конструкција (ендоводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели на малку 40мм дебелина на пластифициран лам внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на попуристанот најмалку 41 кг/м², топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исподна панел „слек“
- 1 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1400мм

Изработени од еколошка стани ПАНЕЛИ (PUR) 40мм кон заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лам внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на попуристанот најмалку 41 кг/м², топлинска спроводливост најмалку 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002.

Пол:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betolur) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 2 LED осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци

- 1 туш кабина комплет со батерија и смот потребен врзан материјал

- Довод
- Отвод
- ПВЦ цевки
- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW или еквивалентни

Конструкција: Челично железно (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потоа офарбано со електростатско прашкасто фарбање со индустриска полиестерска боја отпорна на надворешни влијанија, конструктивен S235JR, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект минимум 3мм

- Навакв/Изработка, транспорт и монтажа на монтажа на објект** – (вече со туш кабини – тоалети - **ТИП 2**) – клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (сдводен кров) или во зависност од модуларијата поставеност
- Кровни ребрасти панели** (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0.4мм надворешно 0.4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002.

- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „сакс“

- 4 ПВЦ - врати 700м-2050мм исполна панел „сакс“;

- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм;

Изработети од еколошки видни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице".

Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм, надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабини сендвич панел PUR сид намалку 40мм

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм

- Цементни (Betopur) табли 20мм

- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 3 ЛЕД осветлувања x 18w

- 1 Прекинувач

- 2 Монофазни наградни приклучоци

- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимумим 3 автоматски осигурани

- Доволна IP табла

ДЕЛ 2.

Ред.бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количина/Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект - сместувачки	456.765,00	12	5.481.180,00	986.612,40	6.467.792,40
2	Монтажен објект ходник - 42м	1.127.876,00	1	1.127.876,00	203.017,68	1.330.893,68
3	Монтажен објект медицински	160.235,00	1	160.235,00	28.842,30	189.077,30
4	Топла врска - коридор 18	472.005,00	1	472.005,00	84.960,90	556.965,90
5	Монтажен објект - ТИП 1	251.736,00	4	1.006.944,00	181.249,92	1.188.193,92
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						9.732.923,20

ДЕЛ 3.

- Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модуларијата монтажни – контејнери и ЈЗУ УК за Инфективни и фебрилни состојби, по принципот клуч на рака.

Топлата врска да биде опремена со:

Кровна конструкција (сдводен кров) – или во зависност од модуларијата поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм, надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- 2 ПВЦ дугици врати 2x 900мм x 2050мм исполна термопан стакло 4x16x4 "комплет со оков и можност за заклучување

- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2 x 900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков и можност за заклучување

- 18 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм

Изработени од еколошки видни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм, надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- Под
- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм

- Цементни (Betopur) табли 20мм

БРАКО

ДПТУ БРАКО ДОО
Ул. Раушански пат 2 - 1400, Велес
Р. Северна Македонија
Тел.: ++389 43 212 560, 212 561
Факс: ++ 389 43 232 534
www.brako.com.mk, sales@brako.com.mk

ПРИЛОГ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Технички карактеристики

1. Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтиран објект – (вент со тун каблони – тоалети, ПИЦ П - куќа на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контернерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (еневоден кров) или во зависност од модуларната поставеност
- Кровна рибреста тавана (PUR) панели 40мм дебелина на пласстифициран лим внатрешно 0,4мм наворешно 0,4мм, тежина на покурстанот 41 кг/м², топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПИЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „сакс“
- 4 ПИЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „сакс“
- 1 ПИЦ - еднокрилен прозор со термоман стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм

Изработени од еколошки зидани ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40мм кои заштитуваат топлинската енергија и имаат зручна изолација, обложени со внатрешно " лице " и наворешно фасада " лице " Дебелина на пласстифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, наворешно најмалку 0,4мм, тежина на покурстанот најмалку 41 кг/м², топлинска спроводливост најмногу 0,43(U/W/m²K) RAL 9002/9002.

• Внатрешни кабинни ѕидови панел PUR ѕид најмалку 40мм.

Под

- Чепина конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Бетонур) табли 20мм
- ПИЦ под
- Комплетна инсталација
- 3 LED осветлувања x 18w
- 1 Преклувач
- 2 Монофазни наградни приклучоци
- Разводна ПИЦ табла за монтажа на ѕид со минимално 3 автомобилски осигурачи
- Доводна IP табла

Тоалет со 4 кабини и тоат:

- 3 Вч- кабини опремени со тоалетни прибори со ниско носејќо казанче комплет со врзан материјал
- 3 Мирјалници
- 3 Ватерјски чешми комплет со врзан материјал

- ПИЦ под
 - Комплетна инсталација
 - 20 Неонски осветлувања x 18w
 - 2 Преклувач
 - 5 Монофазни наградни приклучоци
 - 1 Разводна ПИЦ табла за монтажа на ѕид со минимално 3 автомобилски осигурачи
 - Доводна IP табла
- Конструкција: Чепино жезло (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потао офарбано со електроостатско прашикасто фарбање со индустријска полиестерска боја отпорна на наводоршни влијанија, конструктивен S235JR, согласно МКС EN 10025-2:2009
- Дебелина на чепината конструкција за целниот монтиран објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 3000мм / висина 2550мм/ должина 340000мм - непроксимативно.
Детална поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица придон на техничките спецификации. Изведувачот е должен на направа разработка на скицата и работниланчнчки цртежи.

*Начн на испорака за ДЕЛ 3 – во рок од 20 календарски дена од потпишувањето на довод.

Давешите димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба

НАПОМЕНА: То задржуваме правото на измена на динамиката согласно произвоодствените капацитети И условите на терен за монтажа. Секој застој поради несовремен терен, објект или било која друга причина од страна на купувачот ќе биде додален на динамичкиот план како продолжување на рокот на исполнување. Доколку се случи застој поради непредвидени случувања кои се надвор од наша Контрола како болест, временски непогоди и слично то задржуваме правото на промена на динамичкиот план на испораките и монтажа. Купувачот има обврска да ги обезбеди сите потребни дозволи за работа во време на подизекиот час како и сите други потребни дозволи за работа во клиничкиот центар.

Сите потребни дозволи за транспорт да се обезбедат од страна на купувачот.

ДЕЛ 3

Ред.бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количина на/Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Топла врска - коридор 34м	987.200,00	1	987.200,00	177.696,00	1.164.896,00
ВКУПНО ЗА ПИКАЌАБЕ						1.164.896,00


ДПТУ БРАКО ДОО

Седил: димен: Бр. Велес
Blagoj Шалеv
ДИРЕКТОР
с-мк

Blagoj Шалеv
ДИРЕКТОР
с-мк

Седил: димен: Бр. Велес
Blagoj Шалеv
ДИРЕКТОР
с-мк

/Блатој Шалеv-Управител/



Број: 0818-50/150020190630655

Датум и време: 14.11.2019 г. 14:15:30

Дигитално потпишан од: Sistem za e-potvrdi
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 14.11.2019 во 14:15:30
Издавач на сертификатот: KibsTrust Qualified Certificate
Services
Сертификатот е валиден до: 01.05.2021
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

/Електронски издаден документ/


ПОТВРДА

за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	6904270
Назив:	Друштво за производство трговија и услуги КЕН ПАНЕЛ МОНТИНГ ДООЕЛ Скопје
Седиште:	ГОРНОВРАНОВСКА бр.186 Б СКОПЈЕ - АЕРОДРОМ, АЕРОДРОМ

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	25.11 - Производство на метални конструкции и делови на конструкции
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

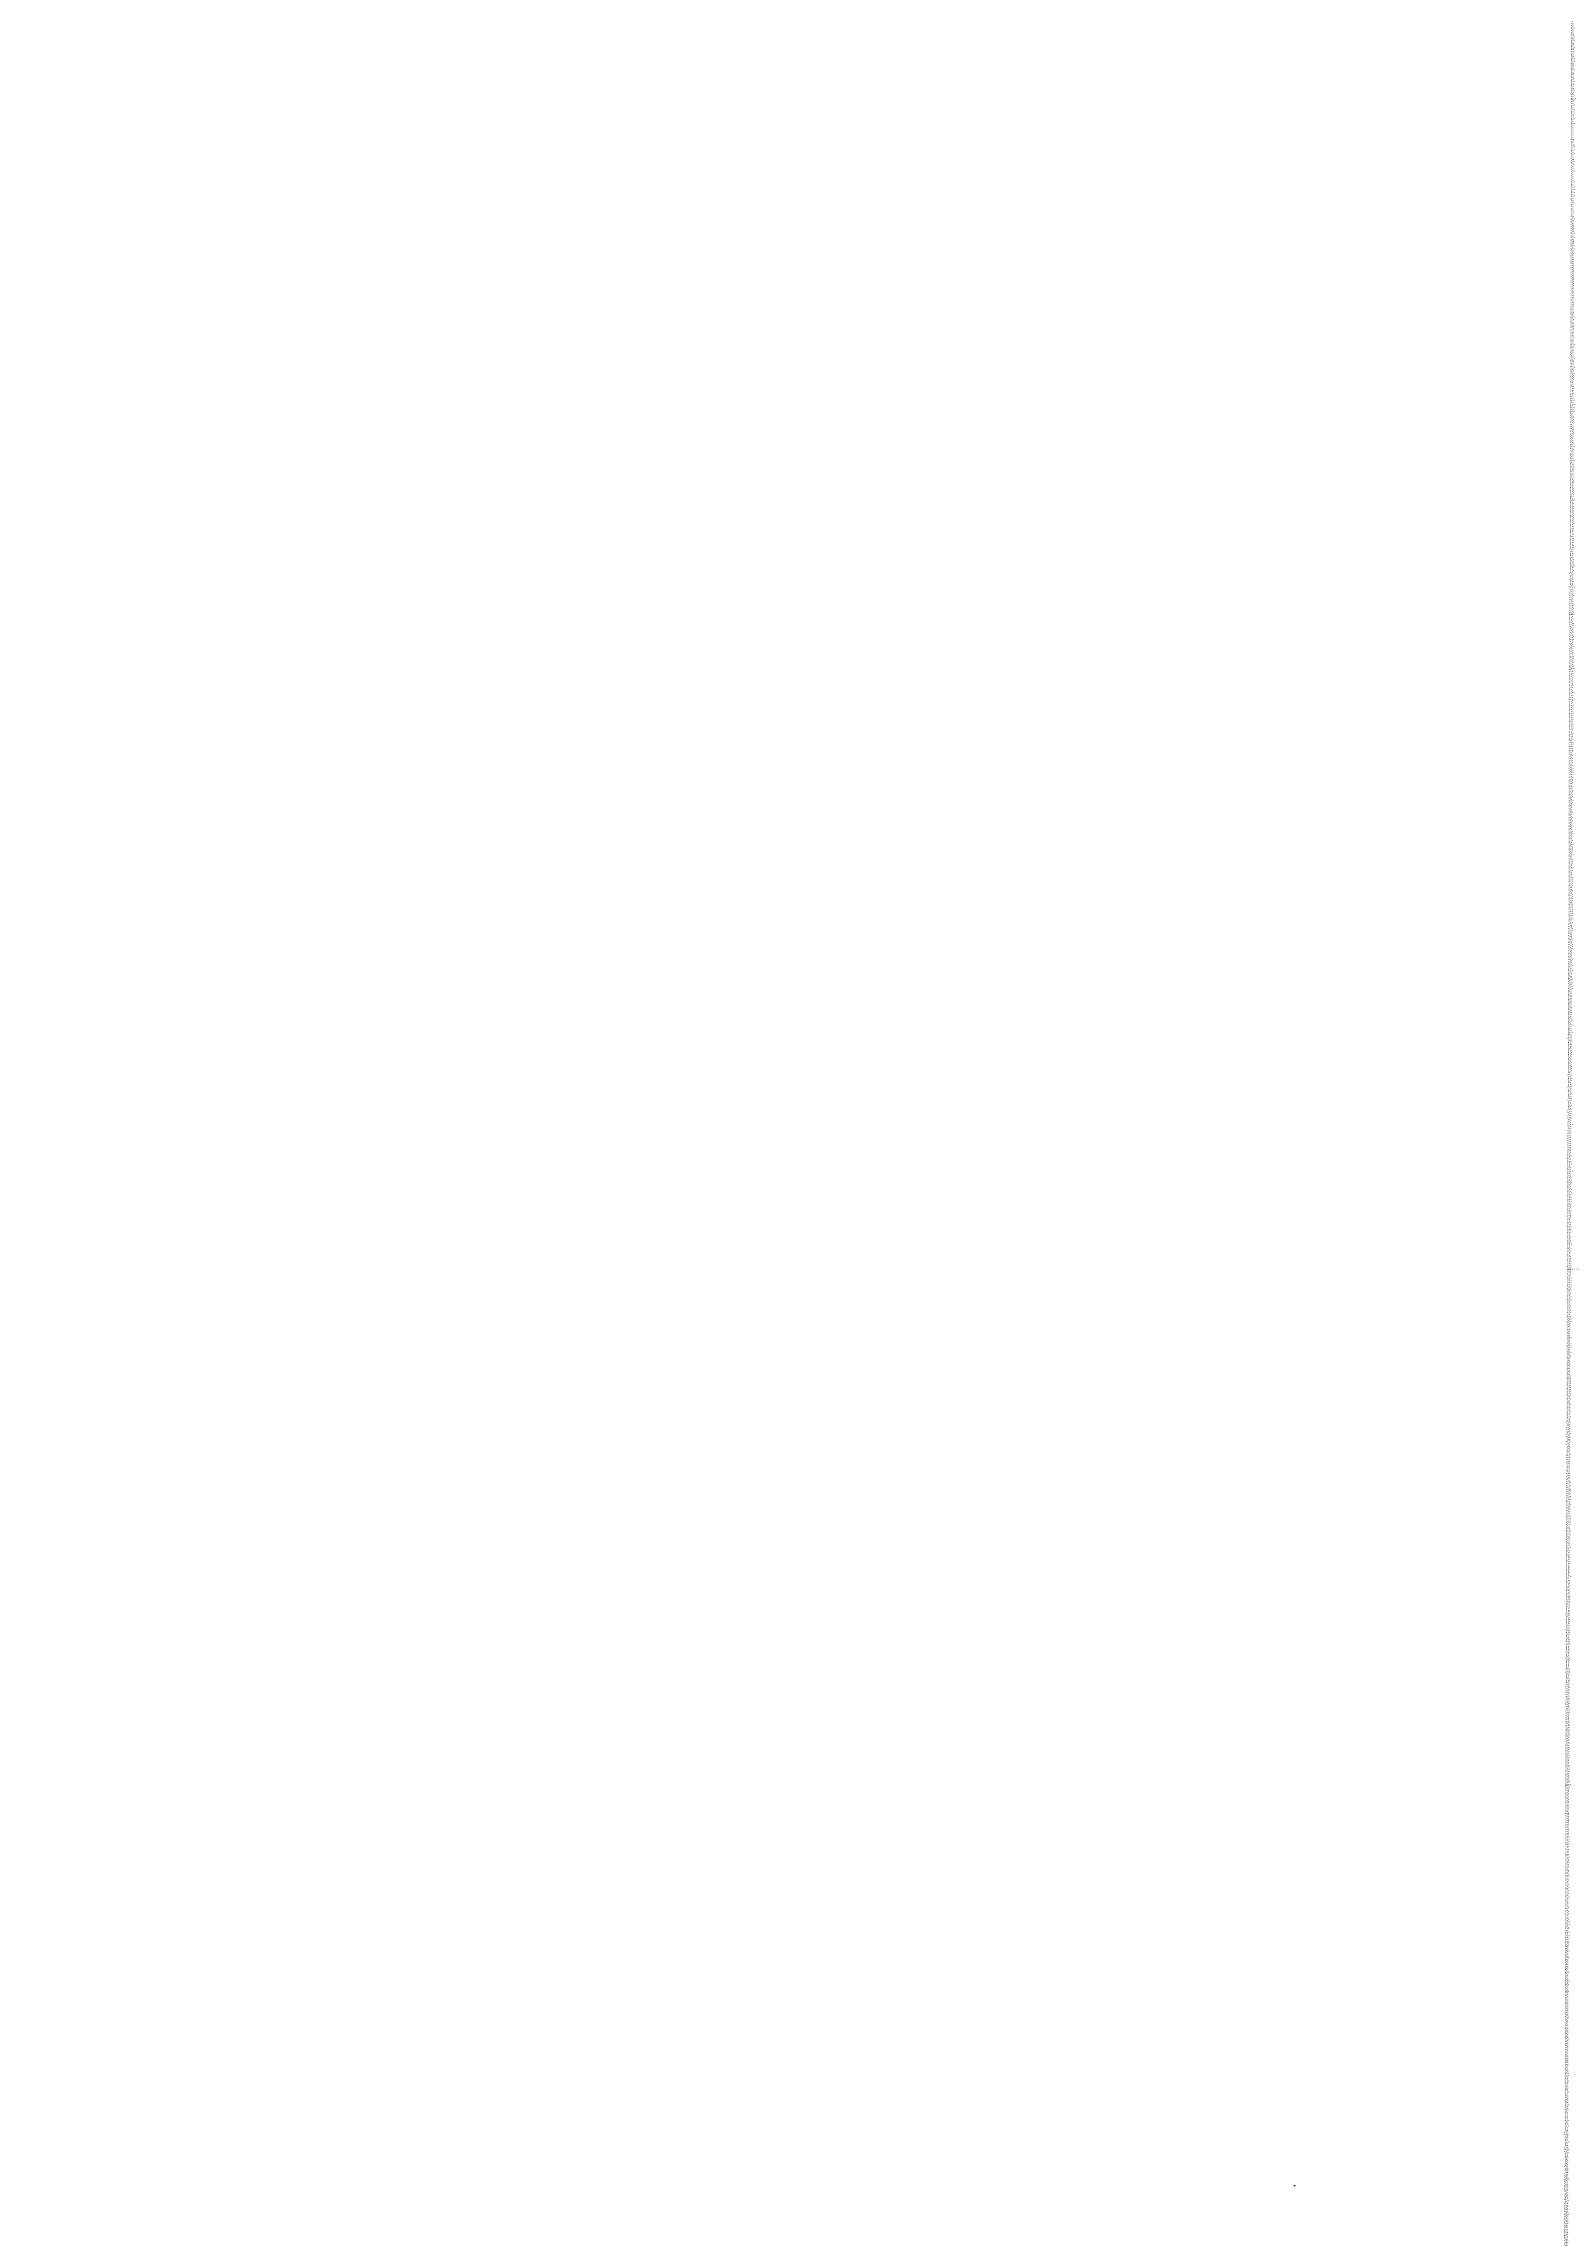



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

ПРИЛОГ 2

Образец на понуда



ИЗРАБОТУВА И ОПРЕМУВА
КЕН ПАНЕЛ МОНТИНГ
Д.о.о.е.л. 1000 Скопје
ул. Горно Лисиче бр. 186 б
Даночен број: МК 4032013522573
Жиро сметка: 210069042700135
Деп., НЛБ Тутунска банка
Контакт: +389 70 706 116
+389 78 301 868
е-маил: contact@kenpanel.mk
vlanko_serafimovski@hotmail.com

Врз основа на поканата за поднесување на понуди за доделување на договор за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел 1. Информации за понудувачот

1.1. Име на понудувачот: **КЕН ПАНЕЛ МОНТИНГ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

1.2. Контакт информации:

- Адреса: ул. Горноврановска бр. 186 б, 1000 Скопје
- Телефон: **078/301-868**
- Факс: _____
- Е-пошта: contact@kenpanel.mk и vlanko_serafimovski@hotmail.com
- Лице за контакт: **Влатко Серафимовски**

1.3. Одговорно лице:

Лидија Ѓорѓиевска



- Документи за регистрирана дејност
- Изјава за сериозност на понудата

➤ Со финансиската понуда задолжително се доставуваат и:

- Прилог – Техничка спецификација
- Потврда за регистрирана дејност
- Изјава за сериозност на понуда

ПРИЛОГ: (Документите што се приложуваат кон понудата)

ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Чл 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во

На претворите што ќе ги закаже договорниот орган, понудувачот ќе го претставува
лишето: Влатко Серафимовски, тел: 078 301 868.

Чл 3. Рок на важност на понудата: 30 дена

2.2 Ги прифаќаме начинот на плаќање и рокот на реализација на предметот на набавка
утврдени во тендерската документација.

2.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за: **ДЕЛ 1 / 2 / 3 (Дел 1, дел 2 и дел 3),**
вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, за јавна набавка на **Монтажни**
контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без
објавување оглас од причини од крајна итност 16 548 051,00 [со бројки] денари
шестнаесет милиони петстотини четириесет и осум илјади и педесет и еден [со букви] денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува 2 978 604,00 денари.

Чл 2. Финансиска понуда

1.4. Даночен број: МК 4032013522573

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Министерство за здравство

Република Северна Македонија






Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

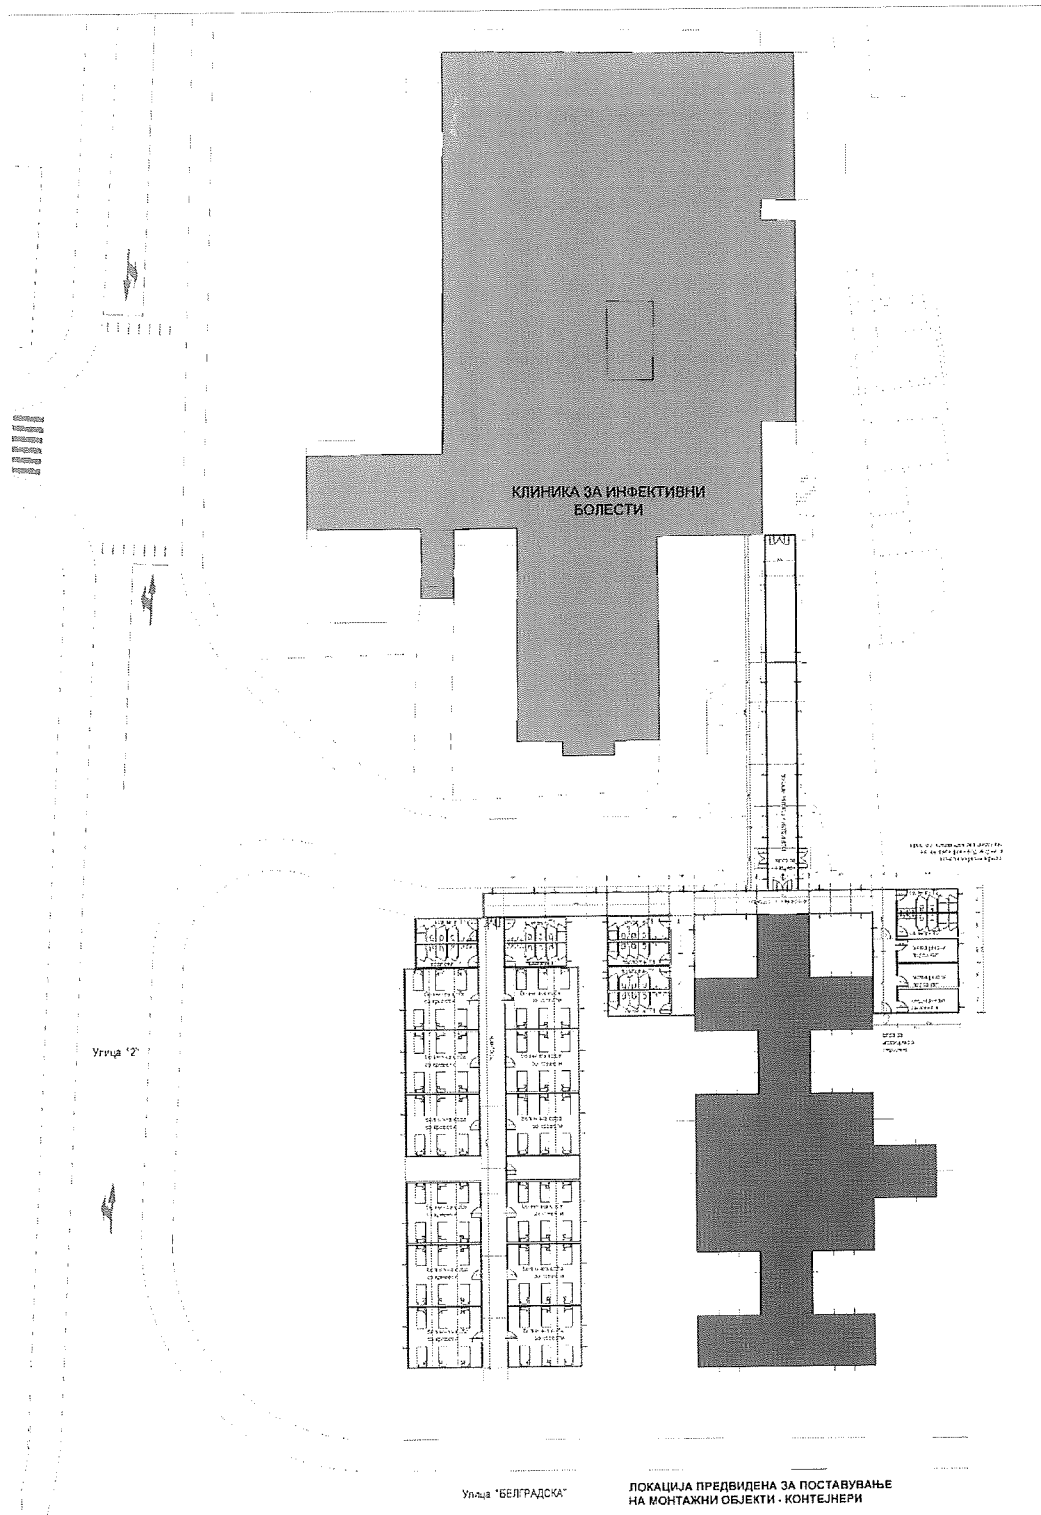

Vertical line of text or barcode on the right edge of the page.



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

ПРИЛОГ 3 - Изјава за сериозност на понудата


ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот Лидија Ѓорѓиевска[име и презиме], врз основа на член 101 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот КЕН ПАНЕЛ МОНТИНГ, ДООЕЛ СКОПЈЕ , изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 101 став 7 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Овластено лице

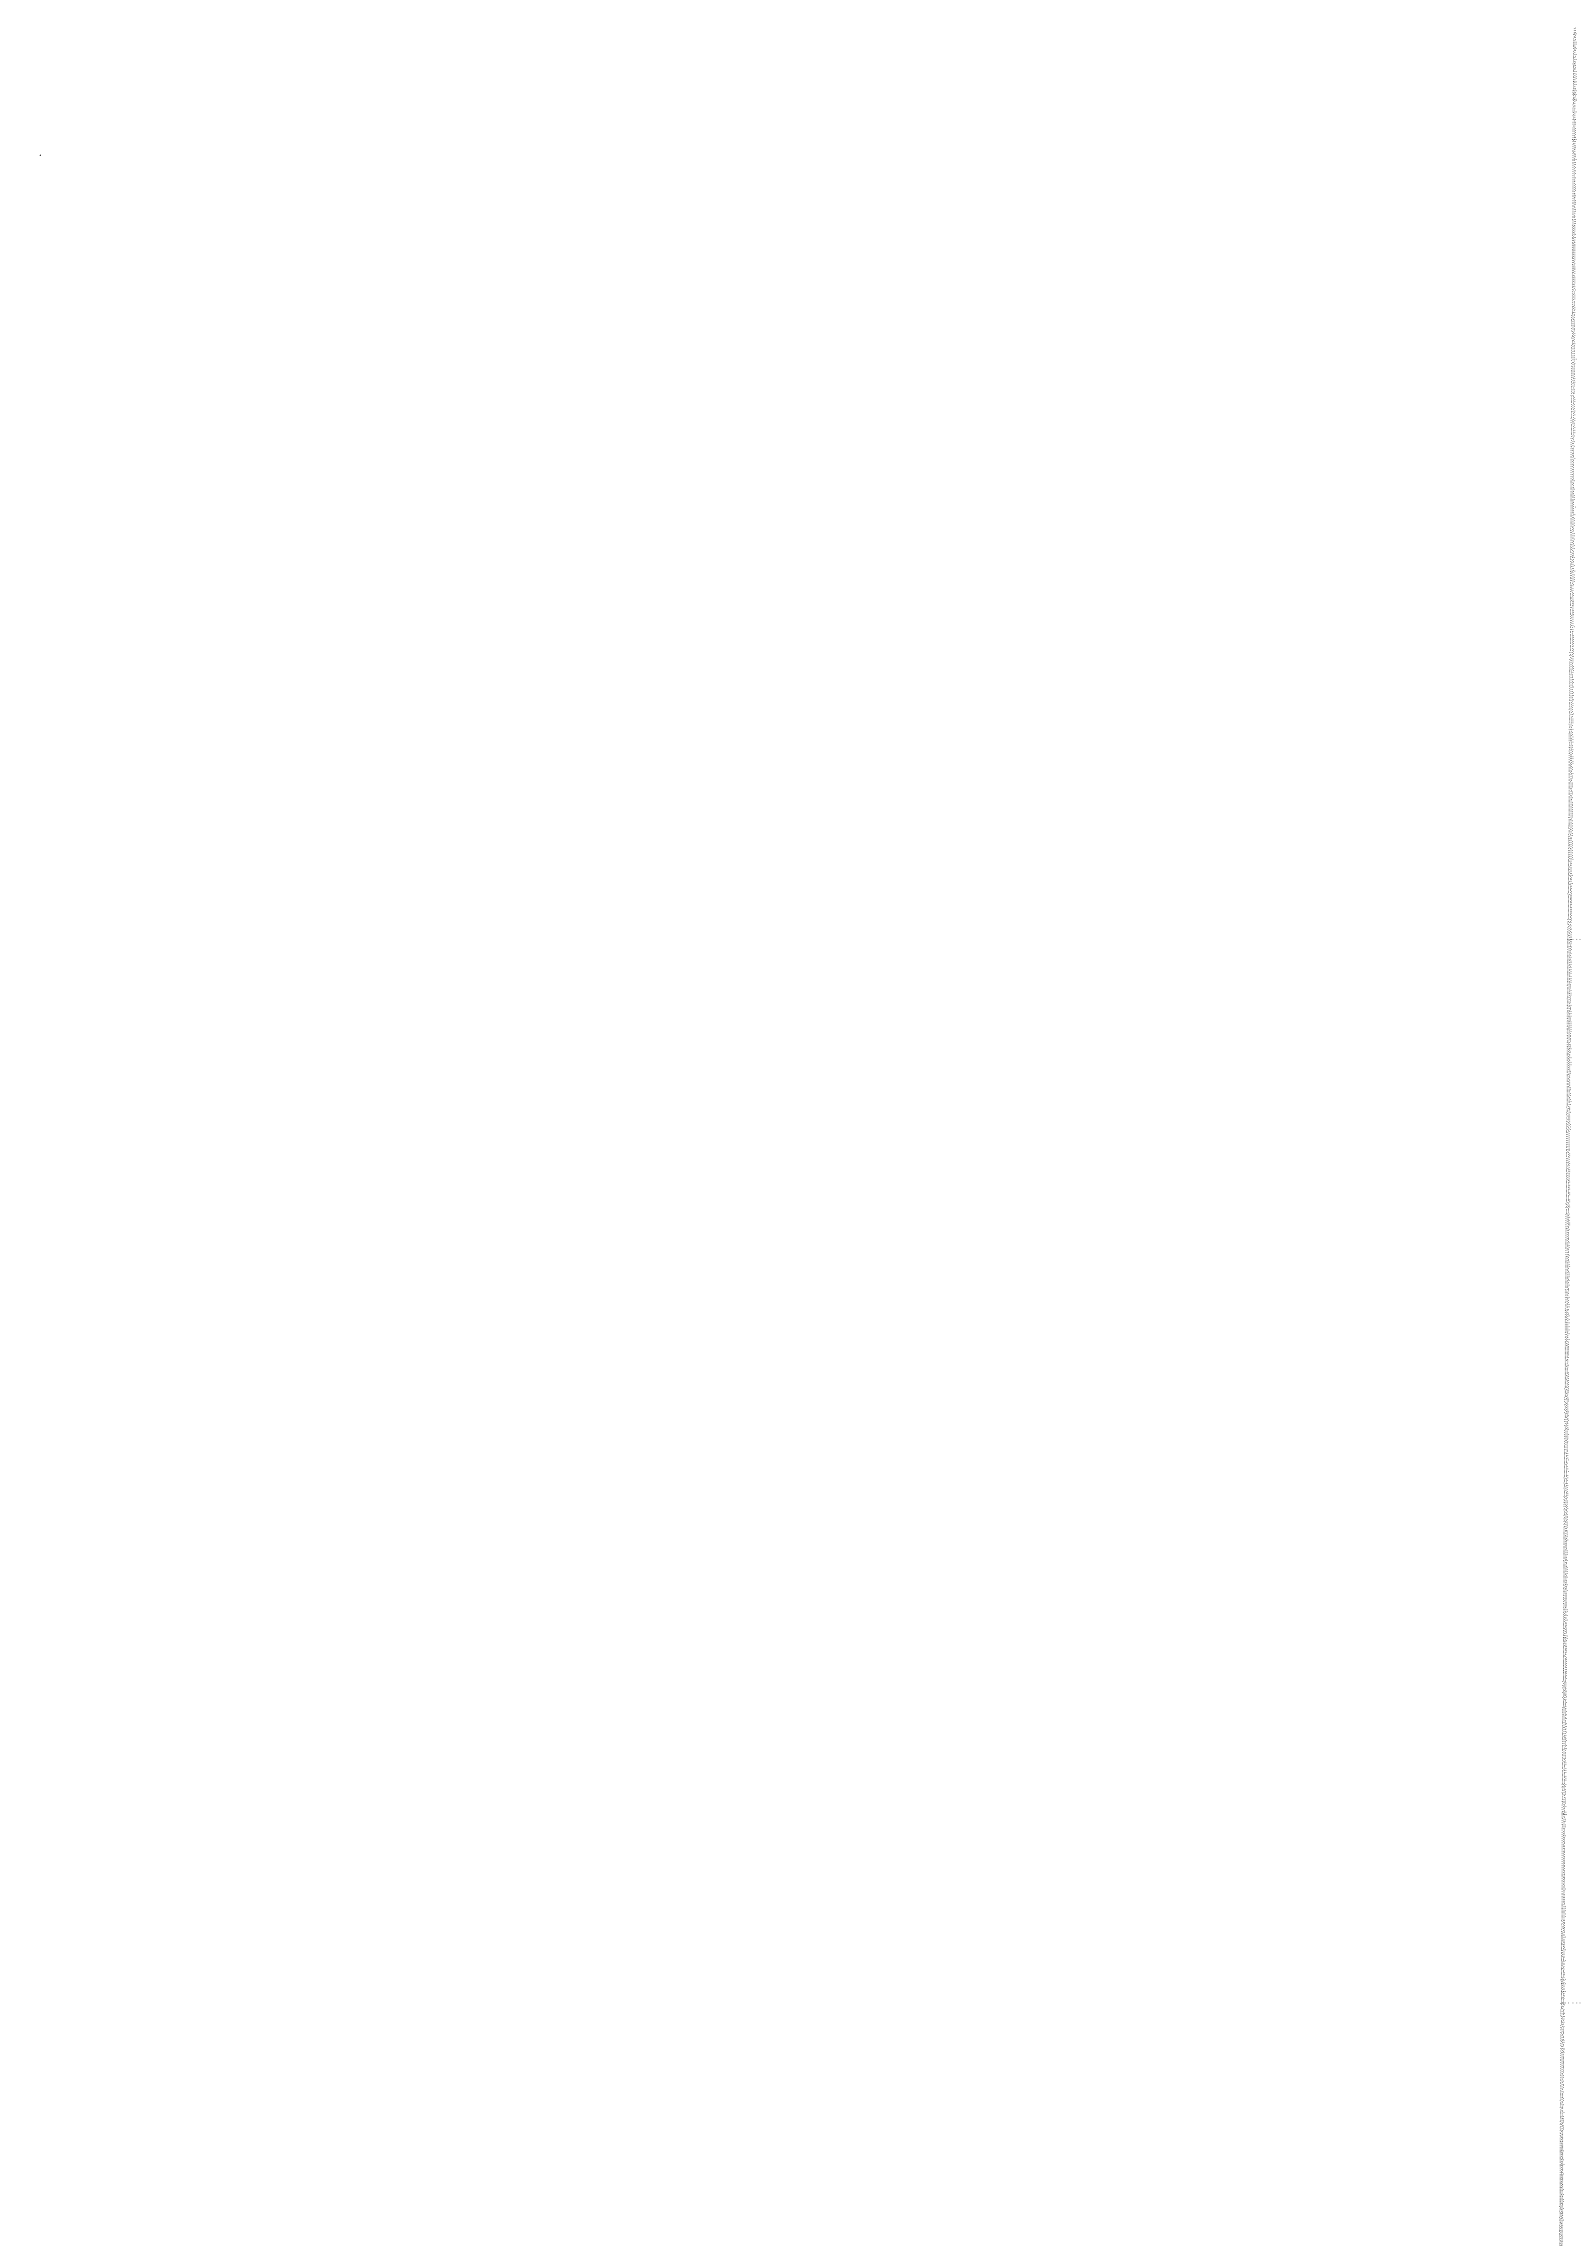



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

ПРИЛОГ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Согласно одлуките на Влада на Република Северна Македонија за мерки и препораки за заштита и превенција од Коронавирус COVID-19, а поради зголемување на бројот на заболени лица се јавува потреба од предвидување на нови болнички капацитети за згрижување на заболените лица. Министерството за здравство има потреба од наоѓања – прибирање на понуди за **Монтажни контейнери за потребите на здравствениот систем**, кои ќе се поставуваат во непосредна близина на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби при Универзитетскиот Клинички комплекс „Мирка Тереза“ во Скопје и во согласност со Извадок од Нацрт-законикот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година („Точка 10“). За таа цел, планирана е лесна, брза и монтажа изградба на медицински капацитети – болничко сместување со просторотија за медицински персонал и згрижување со медицински третман на заболени лица од Коронавирус COVID-19.

Локацијата на која е предвидено поставување на модулите за монтажа објект - контейнери, претходно на подлогата е поставено шлунак и истата е нивелирана со талиони.

На локацијата ќе биде обезбеден приклучок на водоводна и канализациона мрежа и приклучок кон електро дистрибутивната мрежа заради потребите од снабдување со електрична енергија.

Со поставувањето на модуларните монтажни објекти – контейнери се предвидува да се добије обезбеден простор за:

- (канцелариски) – за потребите на медицински персонал;
- сместувачки капацитет – болнички кревети;
- тоалети со туш кабинит;
- ходник; и
- „топла врска“

Во прилог е даден графички преглед со просторно решение и диспозиција на модулите.

Технички карактеристики:

ДЕЛ

1. **Наоѓања/зградба, транспорт и монтажа на монтажа објект** – (весе со туш кабинит – тоалети – ТИЦ 1) - клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контейнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (својовиден кров) или во зависност од модуларната поставеност

- Кровни ребрести панели (PVC) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м², топлинска спроводливост 0,43 (W/m²K) RAL 9002/9002

- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „сакс“
- 4 ПВЦ - врати 700м-2050мм исполна панел „сакс“
- 1 ПВЦ - елиокрилен прозор со термопан стакло 4х16х4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм

Изработени од еколошки златни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40мм кои заштитуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно „лице“ и надворешно фасадно „лице“. Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м², топлинска спроводливост најмногу 0,43(W/m²K) RAL 9002/9002.

Пол

- Цеолитна конструкција 100мм x 40мм x 3мм, 100мм x 20мм x 3мм, 80мм x 50мм x 3мм, 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Ветопур) таблти 20мм
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 3 LED осветлувања x 18w
- 1 Претинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на вид со минимумим 3 автоматски осигурани
- Доводна IP табла

Тоалет со 4 кабинити и тоа:

- 3 Вн- кабинити опремени со тоалетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мијалници
- 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
- 1 туш кабина комплет со батерија и сиог потребен врзен материјал
- Довод
- Олов
- ПВЦ цевки
- Електричен Болдер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW

или еквивалентни

Конструкција: Цеолитно жетезо антикорозивно споксидно премачан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челничката конструкција за целиот монтажа објект минимум 3мм



Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

2. **Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект** – (вече со туш кабини – тоалети - ТИП 2) – клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“
- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саке“;
- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм;

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Пол:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Бетонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 3 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Тоалет со 4 кабини и тоа:

- 2 Вц- кабини опремени со тоалетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мијалници
- 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
- 2 туш кабини комплет со батерија и сиот потребен врзен материјал
- Довод
- Олов
- ПВЦ цевки

3



Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW или еквивалентни

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажн објект минимум 3мм

3. **Изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект** – (мешински персонал) – клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“
- 1 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1400мм

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Пол:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Бетонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 2 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Климатизација- инвертер сплит систем 2,5KW

4



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премазан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект 3мм

4. **Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска бојница по принципот куќа на рака.

Контејнерите се опремени со:

- Кровна конструкција (снороден кров) – или во зависност од модуларната поставеност - Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
 - 2 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „сакџе“ комплет со оков и можност за заклучување
 - 1 двокрилна ПВЦ врата – 2/900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков
 - 13 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм
- Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40мм кон заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002.

Цел:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм, 100мм x 20мм x 3мм, 80мм x 50мм x 3мм, 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Ветолур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 12 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурани
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премазан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009.

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

5

Министерство за здравство
Република Северна Македонија

Ул. „50 Димитијр“ бр. 14, Скопје
Република Северна Македонија

+389 2 3112500
www.dzdravstvo.gov.mk



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2350мм/ должина 41000мм - апроксимативно. Поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации.

***Начин на исполнака за ДЕЛ 1 – во рок од 5-10 календарски дена од потпишување на договорот.** Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактична состојба.

ДЕЛ 1.

Ред. Бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количина/ Пар	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- ТИП 1	387 450,00	4	1 549 800,00	278 964,00	1 828 764,00
2	Монтажен објект - ТИП 2	385 605,00	2	771 210,00	138 817,80	910 027,80
3	Монтажен објект медицински	215 250,00	3	645 750,00	116 235,00	761 985,00
4	Топла врска- коридор 41м	1 420 650,00	1	1 420 650,00	255 717,00	1 676 367,00
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						5 177 144,00

ДЕЛ 2.

1. **Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (сметувачки) –** куќа на рака- димензии: должина 6000 мм – ширина 7200 мм и висина 2600 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да бидат опремени со:

- Кровна конструкција (двоводен кров) ±100мм
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- Олуци
- 1 ПВЦ - врата без праг 1050 мм – 2050мм исполна панел „сакџе“

6

Министерство за здравство
Република Северна Македонија

Ул. „50 Димитијр“ бр. 14, Скопје
Република Северна Македонија

+389 2 3112500
www.dzdravstvo.gov.mk



Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

- 2 ПВЦ – двокрилни со термопан стакло, 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 1400мм-1400мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-4 0мм-3мм
- Цементни (Бетонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 ЛЕД светла x 18w
- 1 Прекинувач
- 6 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Инвертер сплит систем за климатизација – 3,5 KW или еквивалентни

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или „еквивалент“, согласно MKC EN10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтаж објект најмалку 3мм

2. Изработка, транспорт и монтажа на монтаж објект – холник за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери – димензии: должина 42000 мм – ширина 2400мм и висина 2550 мм- апроксимативно (надворешна димензија) или „еквивалентно“

Контејнерите да бидат опремени со:

Кровна конструкција Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- 1 ПВЦ – душла врата без праг 90 мм – 2050мм исполна термопан стакло 4+16+4
- 1 ПВЦ – со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1400мм



Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4 мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-4 0мм-3мм
- Цементни (Бетонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 14 ЛЕД светла x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција:

Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или „еквивалент“, согласно MKC EN10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтаж објект најмалку 3мм

3. Изработка, транспорт и монтажа на топла врска коридор за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (елноводен кров) – или во зависност од модуларијата поставеност **Кровни ребрасти панели** (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- 2 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“ комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2/900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков
- 13 ПВЦ – енокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм;



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "липе" и надворешно фасадно "липе". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4mm надворешно најмалку 0.4mm, тежина на полиуретанот лим внатрешно најмалку 0.43U/(W/m²K) RAL 9002/9002; топлинска спроводливост најмногу 0.43 U/(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под

- Челична конструкција 100mm x 40mm x 3mm; 100mm x 20mm x 3mm; 80mm x 50mm x 3mm; 50mm-40mm-3mm
- Цементни (Ветолур) табли 20mm
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- Електрофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурани
- Доволна IP табла

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премачан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

• Дебелина на челичната конструкција за целиот монтаж објект најмалку 3mm
Димензии на топла врска – ширина 2400mm / висина 2550mm/ должина 18000mm-апроксимативно. Поставете на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации.

5. **Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажени објект** – (вече со тух кабини – тоалети- ТИИ 1) - клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2350 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (едноволген кров) или во зависност од модуларната поставеност
- Кровни ребрасти панели (PUR) панел 40mm дебелина на пластифициран лим внатрешно 0.4mm надворешно 0.4mm, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0.43 U/(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - врска врата 850mm – 2050mm исполна панел „саке“
- 4 ПВЦ - врати 700mm-2050mm исполна панел „саке“
- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800mm-1000mm

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "липе" и надворешно фасадно

9

Министерство за здравство
Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивовиш“ Бр. 14, Скопје
Република Северна Македонија

+389 2 3112300
www.zdravstvo.gov.mk



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

"липе". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4mm, надворешно најмалку 0.4mm, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0.43U/(W/m²K) RAL 9002/9002;

• Внатрешни кабини ѕиднич панел PUR ѕид најмалку 40mm;

Под

- Челична конструкција 100mm x 40mm x 3mm; 100mm x 20mm x 3mm; 80mm x 50mm x 3mm; 50mm-40mm-3mm
- Цементни (Ветолур) табли 20mm
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 3 ДЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурани
- Доволна IP табла

Тоалет со 4 кабин и тоа:

- 3 Вч- кабини опремени со тоалетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мијалници
- 3 Батериски чешпи комплет со врзен материјал
- 1 туш кабина комплет со батерија и смот попресен врзен материјал
- Довод
- Одвод
- ПВЦ цевки
- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW или еквивалентни

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премачан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтаж објект минимум 3mm

***Начин на испорука за ДЕЛ 2 – во рок од 10-20 календарски дена од потпишување на договорот. Давателите димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по ФАКТИЧКА СОСТОЈБА**

ДЕЛ 2.

10

Министерство за здравство
Република Северна Македонија

Ул. „50 Дивовиш“ Бр. 14, Скопје
Република Северна Македонија

+389 2 3112300
www.zdravstvo.gov.mk



Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Ред. Бр.	ОПИС	Единична цена (денари)	Коли чина /Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- сместувачки	559 650,00	12	6 715 800,00	1 208 844,00	7 924 644,00
2	Монтажен објект холник - 42 м	1 451 400,00	1	1 451 400,00	261 252,00	1 712 652,00
3	Монтажен објект медицински	209 100,00	1	209 100,00	37 638,00	246 738,00
4	Топла врска- коридор 18м	623 241,00	1	623 241,00	112 183,38	735 424,38
5	Монтажен објект- ТИП 1	387 450,00	4	1 549 800,00	278 964,00	1 828 764,00
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						12 448 222,00

ДЕЛ 3.

1. Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и ЈЗУ УК за Инфективни и фебрилни состојби, по принципот клуч на рака.

Топлата врска да биде опремена со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност
- Кровни ребрести панели (PUR) панели на малку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 2 ПВЦ дули врати 2x 900мм x 2050мм исполна термопан стакло 4x16x4 *комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2 x 900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков и можност за заклучување
- 8 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм



Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- Под
 - Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
 - Цементни (Betopur) табли 20мм
 - ПВЦ под
 - Комплетна инсталација
 - 20 Нeonски осветлувања x 18w
 - 2 Прекинувач
 - 5 Монофазни надградни приклучоци
 - 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
 - Доводна IP табла
- Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009
- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтаж објект најмалку 3mm

Димензии на топла врска – ширина 3000мм / висина 2550мм/ должина 340000мм - апроксимативно. Детална поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации. Изведувачот е должен на направи разработка на скицата и работилнички цртежи.

***Начин на испорака за ДЕЛ 3 – во рок од 10-20 календарски дена од потпишувањето на договорот. Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба**

ДЕЛ 3.


Ред. Бр.	ОПИС	Единична цена (денари)	Коли чина парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Топла врска -- коридор 3,4 м	1 611 300,00	1	1 611 300,00	290 034,00	1 901 334,00
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						1 901 334,00




Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

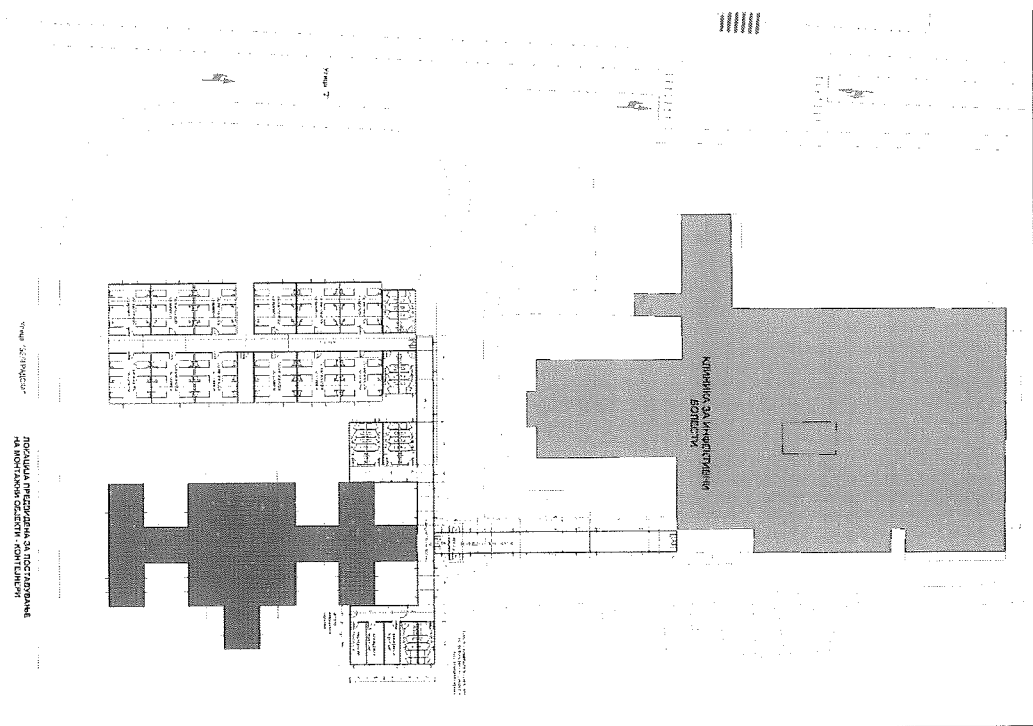

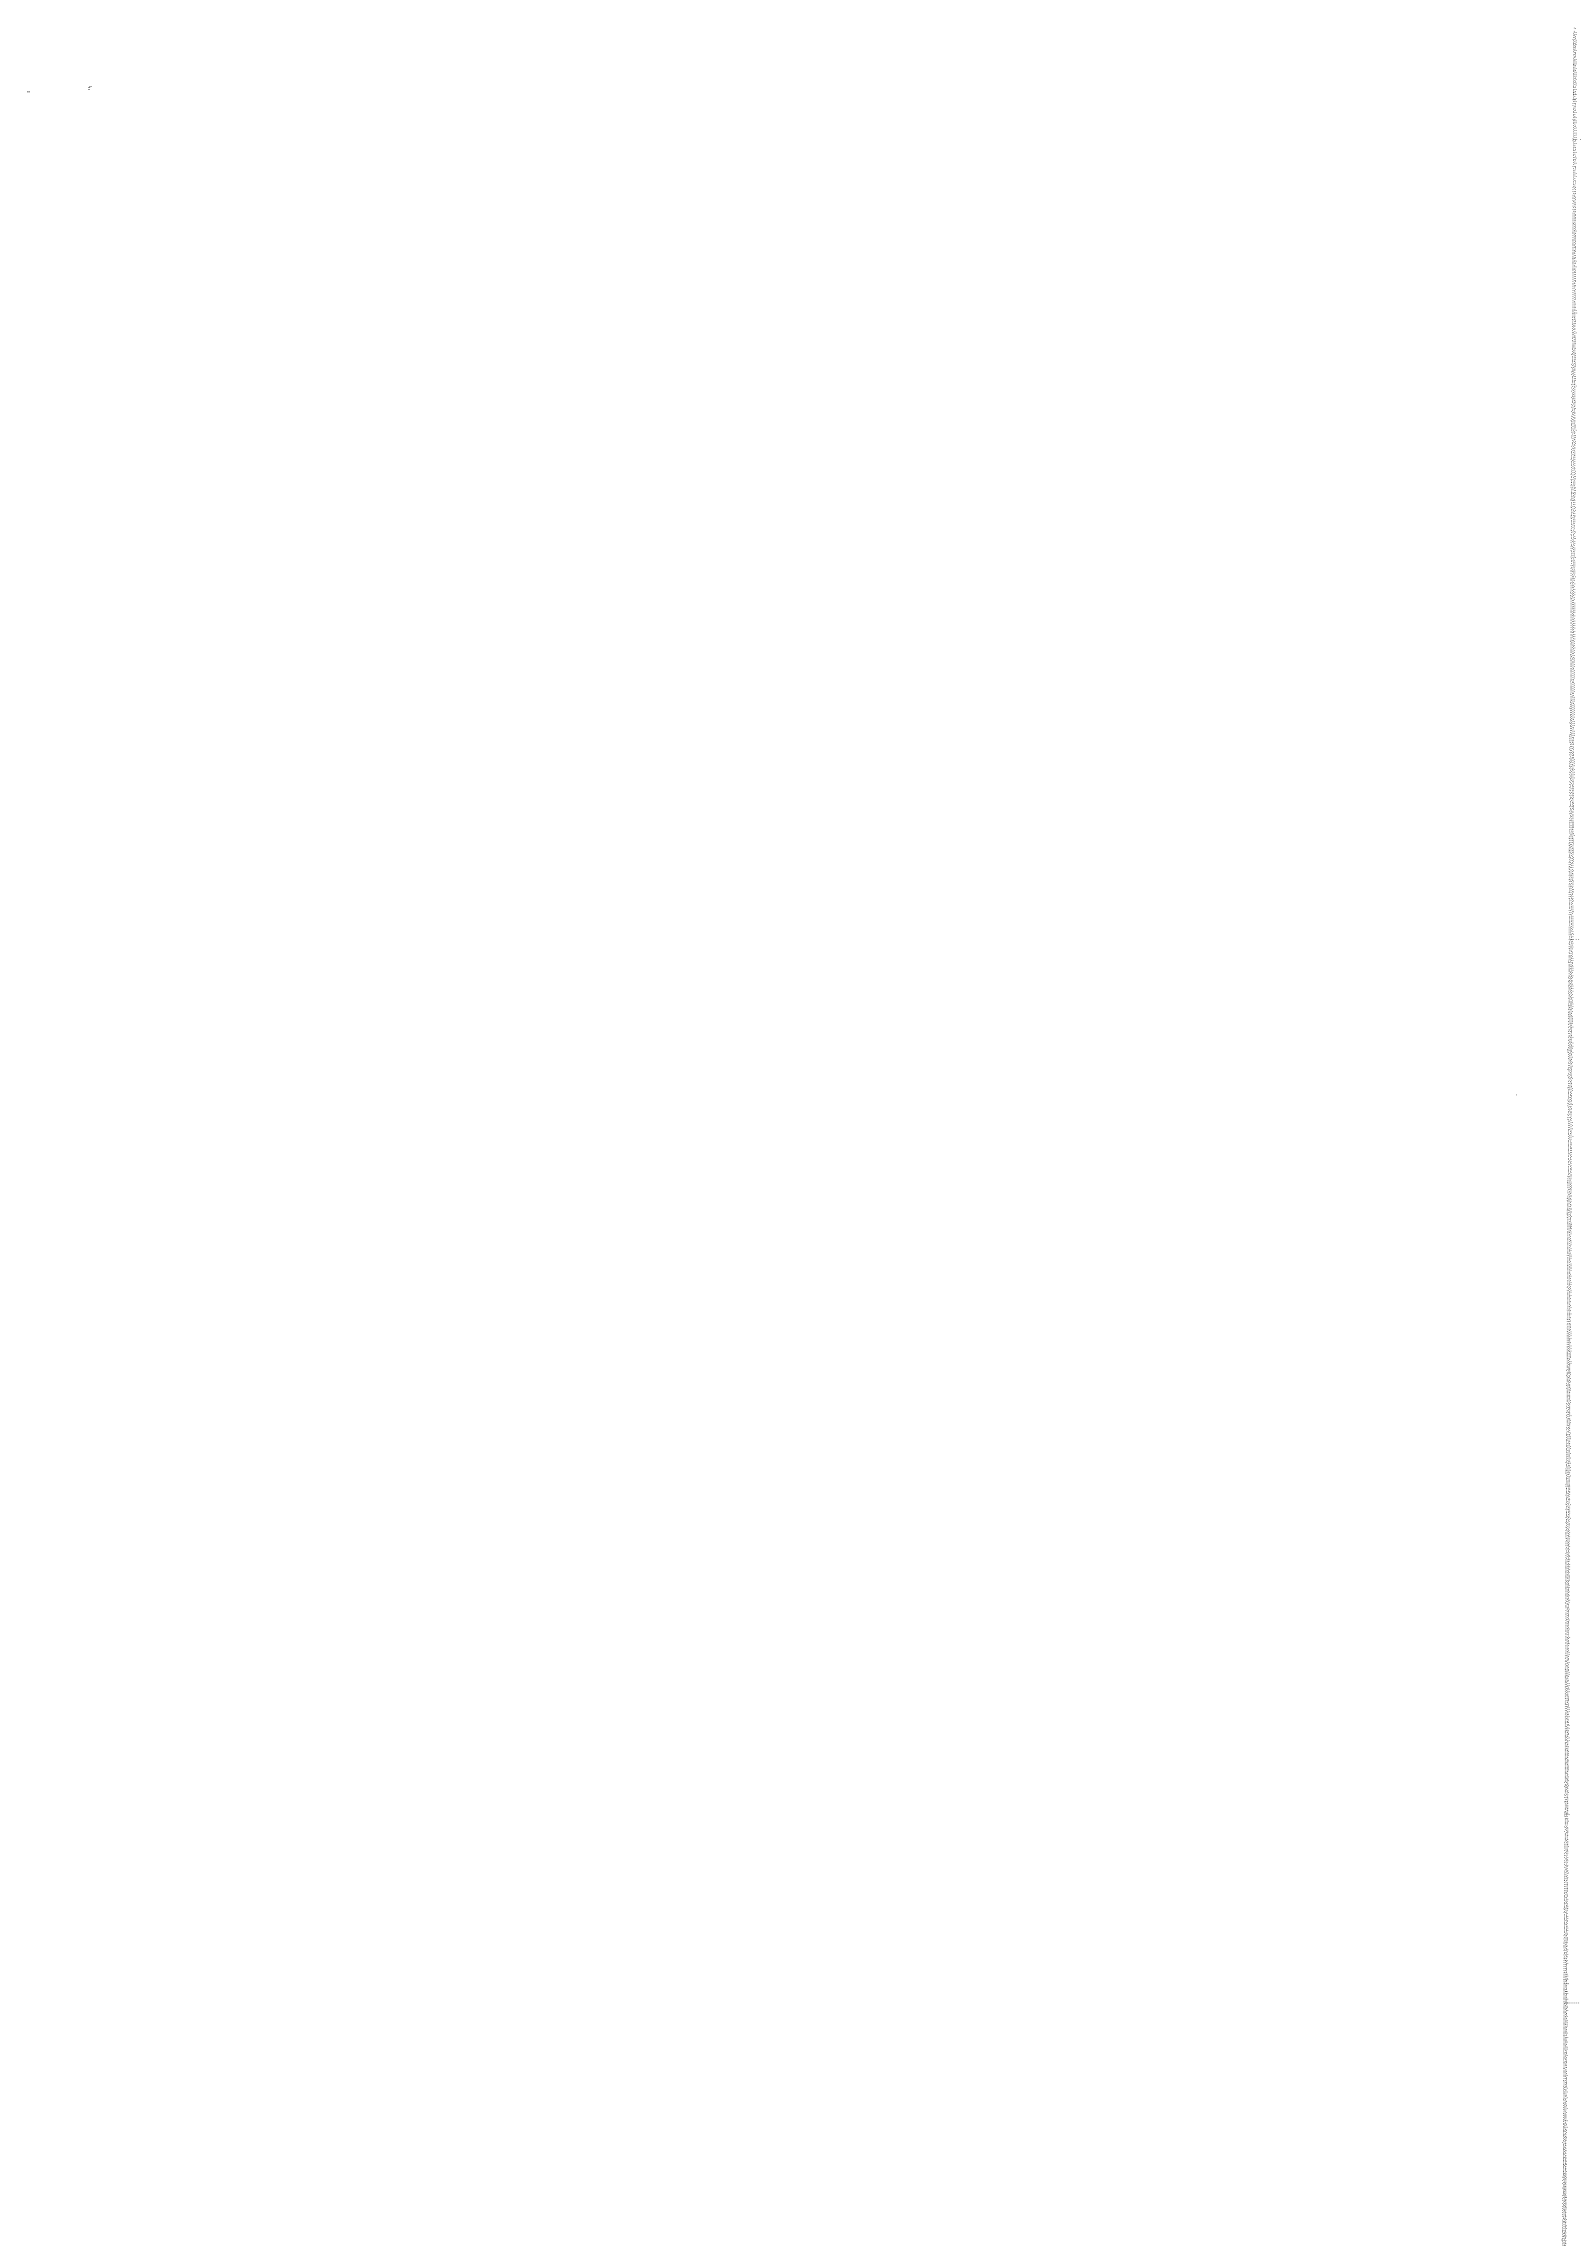



Број: 0809-50/150820200000353

Датум и време: 23.1.2020 г. 09:55:31

ПОТВРДА
за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	7285833
Назив:	Друштво за производство, трговија и услуги ЈБТ ПРОИНЖЕНЕРИНГ ДОО Валандово
Седиште:	МАРШАЛ ТИТО бр.47 ВАЛАНДОВО, ВАЛАНДОВО

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Регистрирана е општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	41.20 - Изградба на станбени и нестанбени згради
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема


Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил:

Павлина Ангелова

Овластено лице:

Ристо Матков

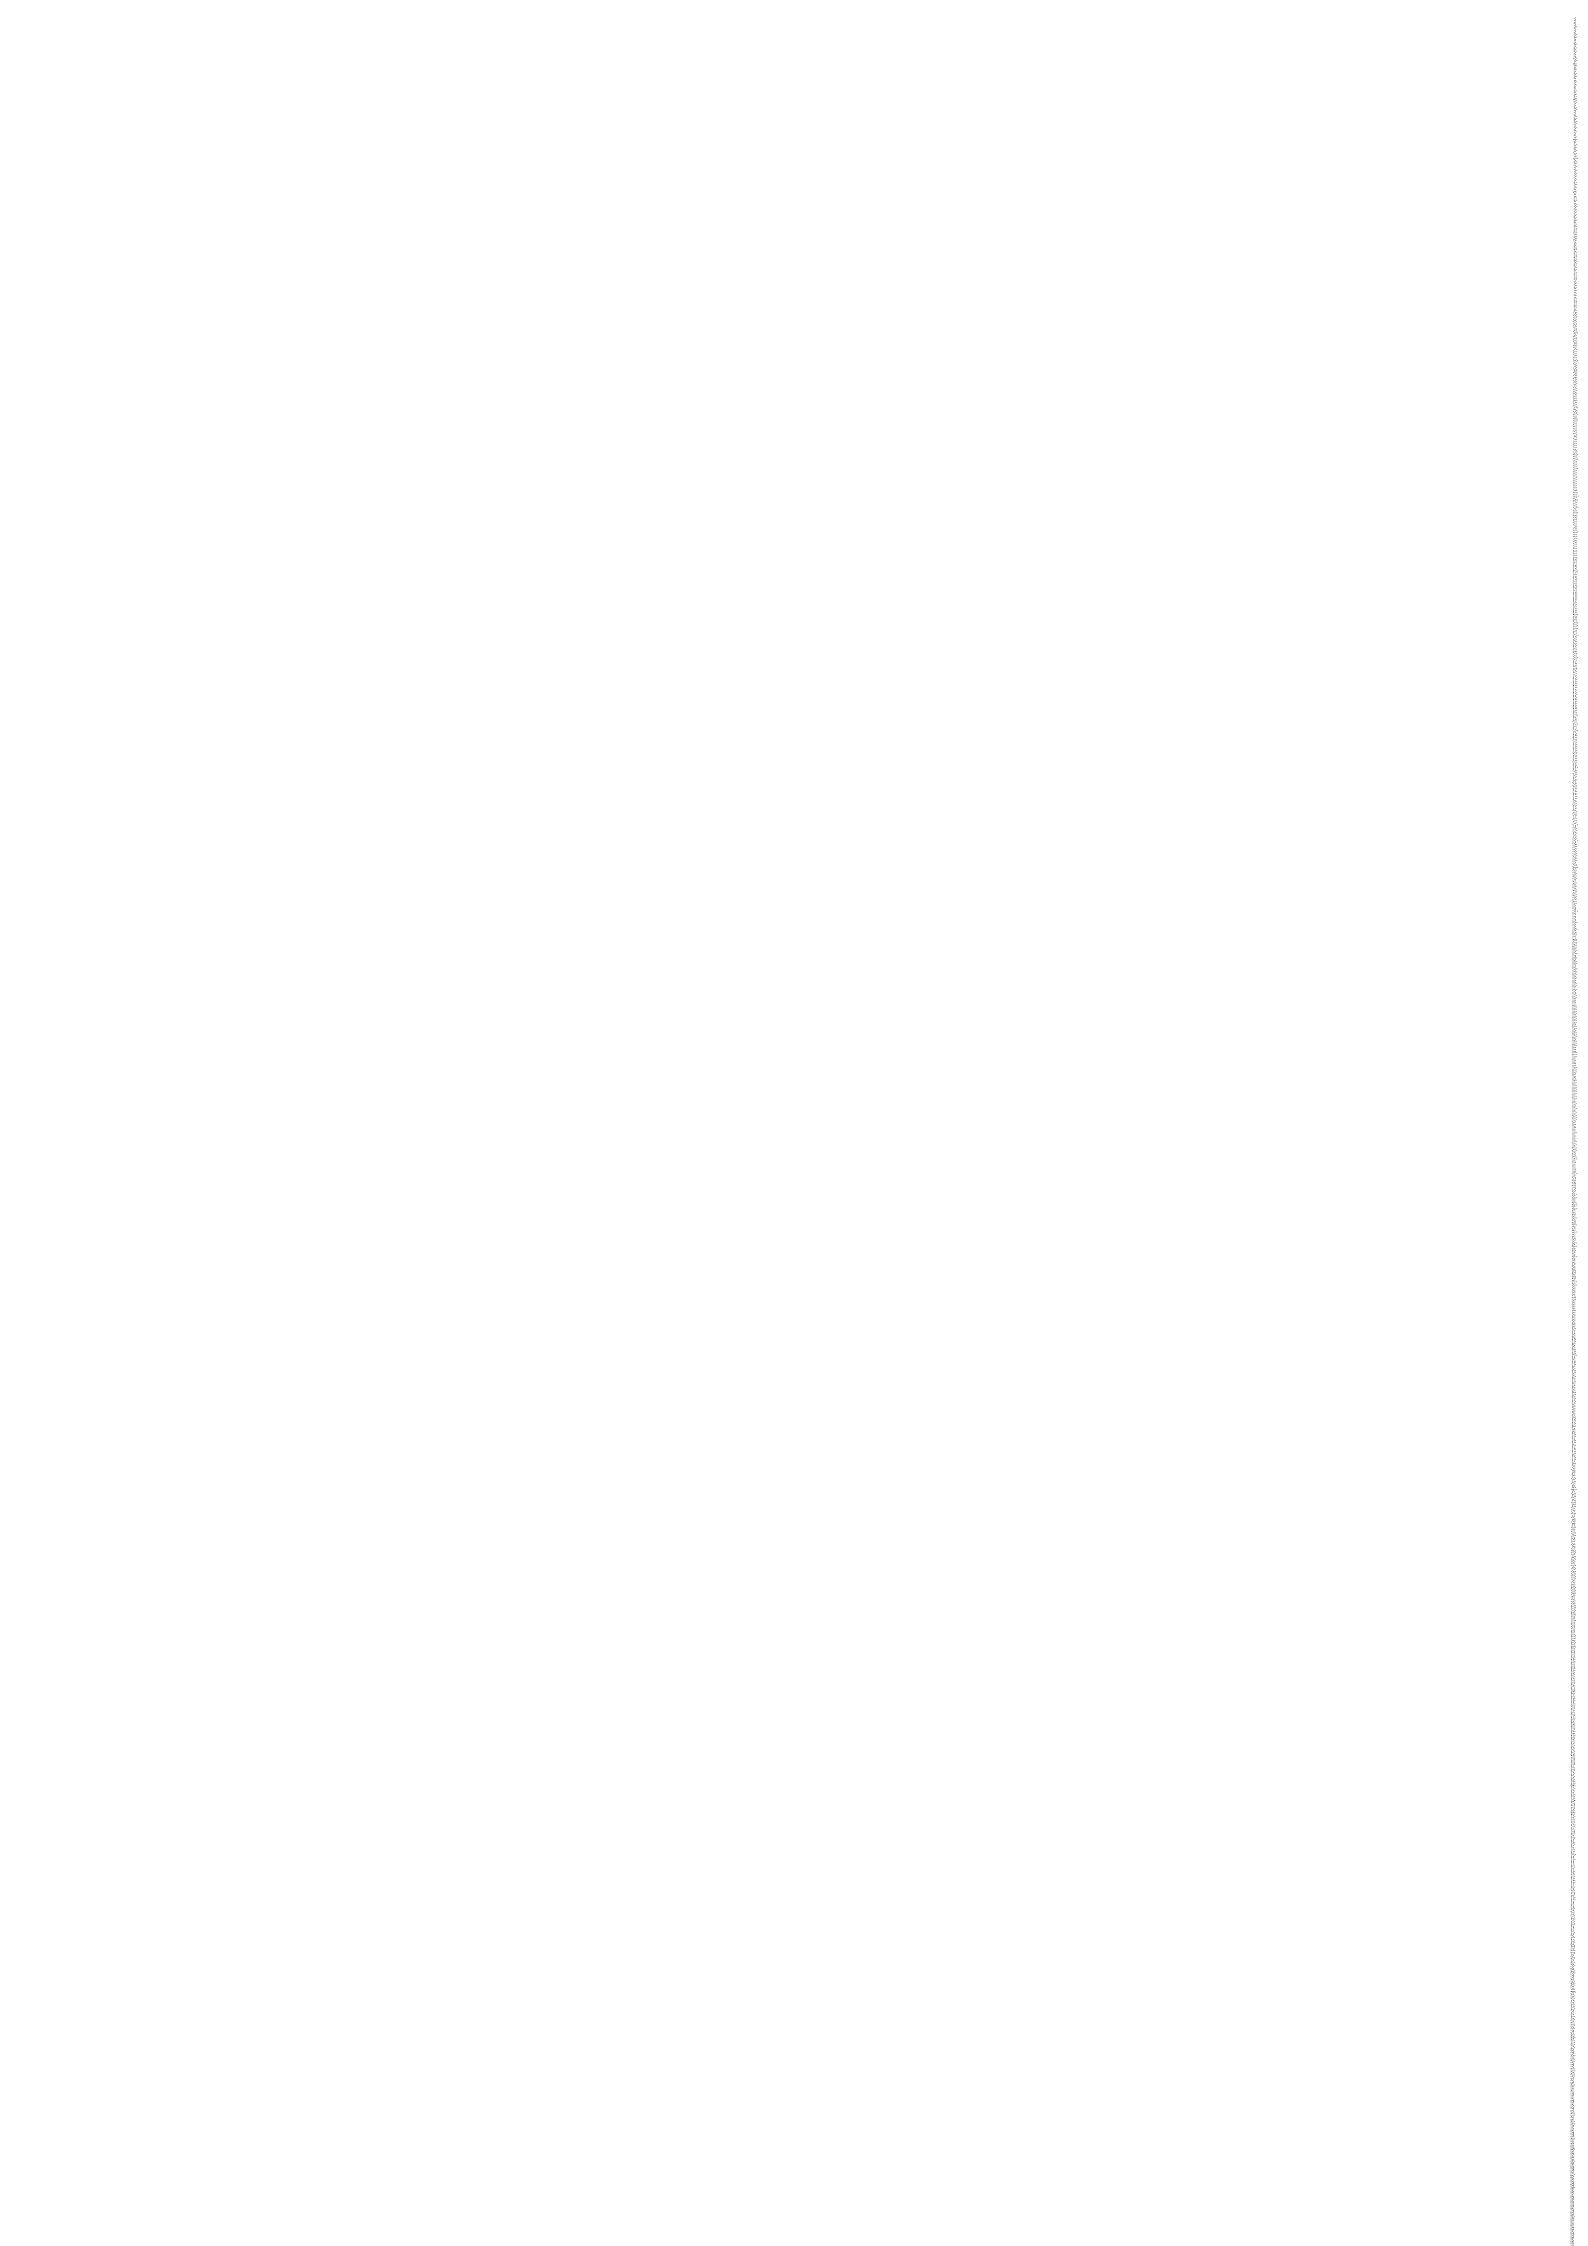

Образец на понуда

[меморандум на понудувачот]

Врз основа на поканата за поднесување на понуди за доделување на договор за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел 1. Информации за понудувачот

1.1. Име на понудувачот: ЈБТ ПРОИНЖЕНЕРИНГ ДОО Валандово

1.2. Контакт информации:

- Адреса: Маршал Тито бр 4 Валандово
- Телефон: 077 558 037
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: Роберт Исиров

1.3. Одговорно лице:

Роберт Исиров

1.4. Даночен број: 4003018503453

Дел 2. Финансиска понуда

2.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за: **ДЕЛ 1 / 2 / 3 (соодветно да се пополни)**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, за за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** 16666500 [со бројки] (шеснаесет милиони шестотини шеесет и шест илјади и петстотини денари) [со букви] денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува 2999970 денари.

2.2 Ги прифаќаме начинот на плаќање и рокот на реализација на предметот на набавка утврдени во тендерската документација.

Дел 3. Рок на важност на понудата: 30 дена

На преговорите што ќе ги закаже договорниот орган, понудувачот ќе го претставува лицето:

_____ Роберт Исиров _____, тел _____ 077 558 037 _____.

Дел 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

ПРИЛОГ: (Документите што се приложуваат кон понудата)

Со финансиската понуда задолжително се доставуваат и:

Robert Isirov

Digitally signed by Robert Isirov
Date: 2020.04.09 09:11:45 +02'00'

- документи за регистрирана дејност
- изјава за сериозност на понудата

--	--

ПРИЛОГ 3 - Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот Роберт Исиров [име и презиме], врз основа на член 101 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот ЉБТ ПРОИНЖЕНЕРИНГ ДОО Валандово, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 101 став 7 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум


9,04,2020

Овластено лице

Роберт Исиров

**Robert
Isirov**

Digitally signed
by Robert Isirov
Date: 2020.04.09
09:10:05 +02'00'

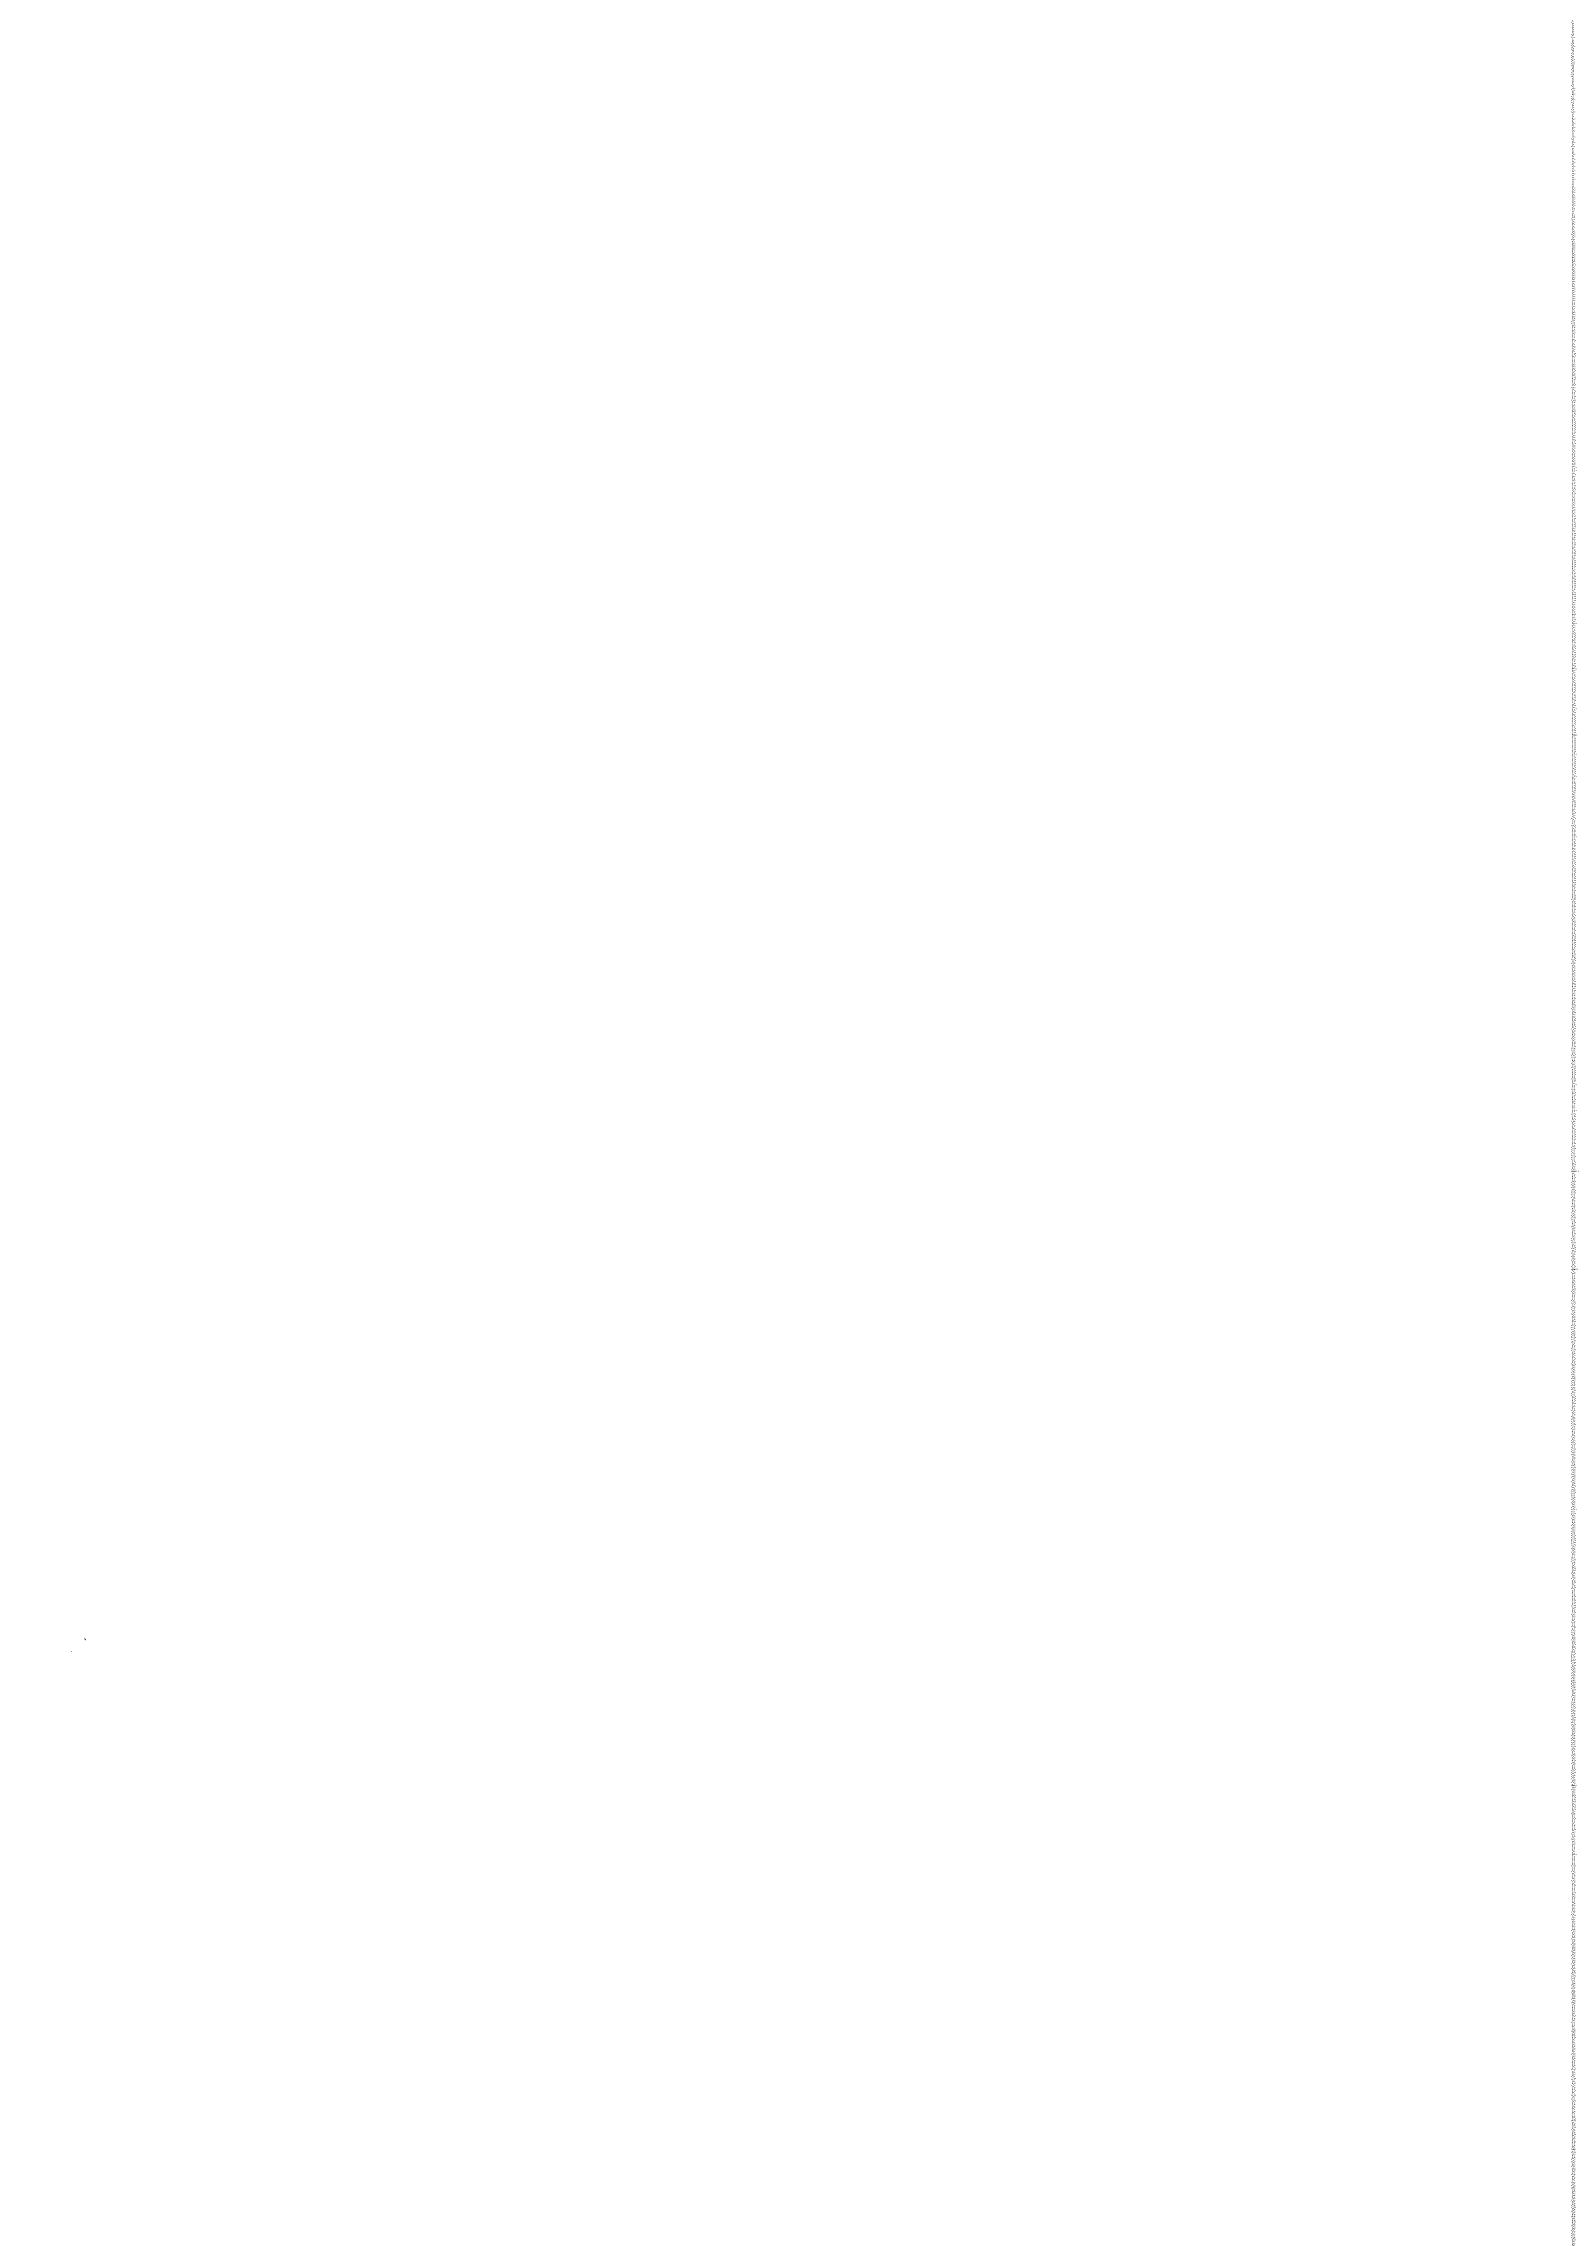

ДО: „БТ Проинженеринг ДОО Веландово“

ПОСТАПКА СО
ПРЕГОВАРАЊЕ БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС ЗА

ПРЕДМЕТ: Покана за поднесување понуда за јавна набавка на монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итноост

Почитувани,

за јавна набавка на

Министерство за здравство, со адреса на ул. 50 Дивизија бр.14, и електронска пошта kontakt@zdravstvo.gov.mk, има потреба од јавна набавка на **монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итноост**. За таа цел Министерство за здравство спроведува постапка со преговарање без објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) од Законот за јавните набавки. Ве молиме да ни доставите привична понуда електронски потпишана за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка во согласност со приложената техничка спецификација најдоцна до 09.04.2020 година до 10:00 часот следната меил адреса: vanja.andonova@zdravstvo.gov.mk.

Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем
со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итноост

Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите оригиналните образци кои се составен дел на тендерската документација.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Молиме, во понудата да наведете и лице кое во име на понудувачот ќе учествува во преговорите за реализација на набавката (име и презиме, контакт телефон).

Однапред благодариме на соработката.

Одговорно лице
Министер
Д-р Венко Филипове

Скопје, април 2020 година

1 Општи информации во врска со договорниот орган и предметот на набавка

1.1 Договорен орган е Министерство за здравство, со адреса ул. „50-та Дивизија“ бр. 14, телефон за контакт +389 2 311 2 500, контакт лице Божидар Дојановски.

1.2 Предмет на договорот за јавна набавка е јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност.**

1.3 Предметот на договорот е делив на три дела:

ДЕЛ 1: Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичката состојба);

ДЕЛ 2: Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сметувачки) формирани од по три контејнери или „екивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП 1; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичката состојба)

ДЕЛ 3: Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичката состојба).

1.3.1 Понудите кои ќе содржат рок на изведба кои ќе содржат поголем рок за изведба нема да бидат земени во предвид поради нивното на постапката (безбедноста и здравјето на граѓаните).

1.4 Договорниот орган ќе склучи договор за предметната набавка со носителот на набавката со времетраење до завршување на пандемијата Ковид 19 во Република Северна Македонија.

1.5 Техничка спецификација на набавката: **монтажни контејнери со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност.**

1.6 Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со преговарање без претходно објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) од Законот за јавните набавки.

1.7 Оваа постапка се спроведува согласно со Законот за јавните набавки донесените подзаконски акти.

2. Елементи на понуда

2.1 Понудата треба да е составена од следниве елементи:

- Образец на понуда (Прилог 2),
- Документ за регистрирана дејност,
- Изјава за сериозност на понудата (Прилог 3),

2.2 Критериуми за утврдување на способност

2.2.1. Економскиот оператор треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.3 Начин на докажување на способноста на понудувачот

2.3.1 За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави со својата понуда документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како

физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

3. Критериум за избор на најповолна понуда

Договорниот орган како критериум за избор на најповолна понуда ќе ја користи **ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЛНАТА ПОНУДА ВРЗ ОСНОВА НА ЦЕНАТА.**

3.1 Цена на понудата

3.1.1 Во цената на понудата треба да се засметани сите трошоци и попусти на вкупната цена на понудата, без ДДВ кој се искажува посебно, во денари.

3.2 Корекција на цени

3.2.1 При реализација на договорот за јавна набавка не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

4. **Начин и рок на плаќање, рок на испорака и важност на понуди**

4.1 **Се предвидува следниов начин на плаќање:**

• Плаќањето ќе се изврши по претходно изготвен записник за примопредавање од лицата задолжени за реализација на договорот назначени од Министерството за здравство и доставена фактура по испорака, монтажа и извршено примопредавање.

4.2 **Рок за реализирање на набавката**

Договорниот орган со носителот на набавката ќе склучи договор за предметната набавка со носителот на набавката со времетраење до целосно реализација на договорот согласно начин на испорака наведена во техничката спецификација.

4.3 **Период на важност на понудата**

Понудите треба да важат најмалку 30 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите, за чие времетраење понудата со сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудата што важи за пократок период од предвидениот, договорниот орган ја отфрла како неприфатлива понуда. Доколку договорниот орган процени за потребно, може да побара од понудувачот продолжување на периодот на важност на понудата.

5. **Начин на доставување на понудата**

Економскиот оператор понудата електронски потпишана треба да ја достави на следната менаџерска адреса: zupca.andonovska@zdravstvo.gov.mk, најдоцна пристигнати до 09.04.2020 година до 10:00 часот.

5.1. Секој економски оператор, може да учествува за еден или повеќе делови од постапката за јавна набавка.

ПРИЛОГ 2

Образец на понуда

[Испорачан на понудувачот]

Врз основа на поканата за поднесување на понуди за доделување на договор за јавна набавка на Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итноста и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел 1. Информации за понудувачот

1.1 Име на понудувачот: ЈБТ ПРОИНЖЕНЕРИНГ ДОО Веландово

1.2 Контакт информации:

- Адреса: Маршал Тито бр 4 Веландово
- Телефон: 077 538 037
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: Роберт Исиров

1.3 Одговорно лице:

Роберт Исиров

1.4. Даночен број: 4003018303453

Дел 2. Финансиска понуда

2.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за: **ДЕЛ 1 / 2 / 3 (соодветно да се пополни)**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусты, без ДДВ, за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итноста** 16665500 (со брзици) / (_____) шееснаесет милиони шестотини шесест и шест илјади и петстотини денари (_____) / (со букви) денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува 2999970 денари.

2.2 Ги прифаќаме начинот на плаќање и рокот на реализација на предметот на набавка утврдени во тендерската документација.

Дел 3. Рок на важност на понудата: 30 дена

На преговорите што ќе ги закаже договорниот орган, понудувачот ќе го претставува лицето:
Роберт Исиров, тел 077 558 037.

Дел 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

ПРИЛОГ: (Документите што се приложуваат кон понудата)

Со финансиската понуда задолжително се доставуваат и:

- документи за регистрирана дејност
- изјава за сериозност на понудата

ПРИЛОГ 3 - Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот Роберт Исиров [име и презиме], врз основа на член 101 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот ЈБТ ПРОИНЖЕНЕРИНГ ДОО Веландово, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последните од прекршување на оваа изјава во случаите од член 101 став 7 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

9.04.2020

Овластено лице

Роберт Исиров

ПРИЛОГ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Согласно одлуките на Владата на Република Северна Македонија за мерки и препораки за заштита и превенција од Коронавирус COVID-19, а поради зголемување на бројот на заболени лица се јавува потреба од предвидување на нови болнички капацитети за згрижување на заболените лица. Министерството за здравство има потреба од набавка – прибирање на понуди за **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем**, кои ќе се поставуваат во непосредна близина на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби при Универзитетскиот Клинички комплекс „Мајка Тереза“ во Скопје и во согласност со Извадок од Најур-записникот од Трестот и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година. („Точка 10“). За таа цел, планирана е дено, брза и монтажа на граѓаба на медицински капацитети – болничко сместување со просторија за медицински персонал и згрижување со медицински третман на заболени лица од Коронавирус COVID-19.

Локацијата на која е предвидено поставување на модулите за монтажа објект - контејнери, претходно на подлогата е поставено шпунџак и истата е нивелирана со таптон.

На локацијата ќе биде обезбеден приклучок на водоводна и канализациона мрежа и приклучок кон електро дистрибутивната мрежа заради потребите од снабдување со електроинерна енергија.

Со поставувањето на модуларните монтажни објекти – контејнери се предвидува да се добије обезбеден простор за:

- (канцелариски) – за потребите на медицински персонал;
- сместувачки капацитет – болнички кревети;
- тоалети со туш кабинни;
- холник; и
- „топла врска“

Во прилог е даден графички преглед со просторно решение и диспозиција на модулите.

Технички карактеристики:

ДЕЛ 1

• **Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект** – (вече со туш кабинни – тоалети- **ТИП 1**) - куќа на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (едноволен кров) или во зависност од модуларната поставеност
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на подустанот 41 кг/м², топлинска спроводливост 0.43 U/(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „сакс“
- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „сакс“

- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термоман стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм
- Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно „лице“ и надворешно фасадоно „лице“. Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м², топлинска спроводливост најмногу 0.43(U/W/m²K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабинни ѕиднич панел PUR ѕид најмалку 40мм.

Пол

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
 - Цементи (Ветопур) табли 20мм
 - ПВЦ под
 - Комплетна инсталација
 - 3 LED осветлувања x 18w
 - 1 Прегинувач
 - 2 Монофазни наптрални приклучоци
 - Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
 - Доволна P- табла
- Тоалет со 4 кабинни и тоза:**
- 3 Вл- кабинни опремени со толетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
 - 3 Мигалници
 - 3 Батериски чешпи комплет со врзен материјал
 - 1 туш кабина комплет со батерија и ситот потребен врзен материјал
 - Довол
 - Оваод
 - ПВЦ цевки
 - Електричен Бојлер 80л
 - Конвекторски панел за греевање 2KW

или еквивалентни

Конструкција: Челично железно антикорозивно споксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажн објект минимум 3мм

- **Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект** – (вече со туш кабинни – тоалети - **ТИП 2**) – куќа на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.
- Контејнерите да се опремени со:**

- Кровна конструкција (едноволен кров) или во зависност од модуларната поставеност

Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0.4мм надворешно 0.4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“
- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саке“;
- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм;

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм, надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабинни сендвич панел PUR ѕид намалку 40мм

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм;
- 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Бетонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 3 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурани

Топлет со 4 кабин и тоа:

- 2 Вш- кабини опремени со тоалетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мијалници
- 3 Бетериски чеми комплет со врзен материјал
- 2 туш кабини комплет со батерија и снот потребен врзен материјал
- Довод
- Одвод
- ПВЦ цевки
- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW или еквивалентни

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажаен објект минимум 3мм
- **Изработка, транспорт и монтажа на монтажаен објект – (медицински персонал)** – клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларијата поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“
- 1 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1400мм

Изработени од еколошки ѕидни ПАНЕЛИ (PUR) 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм, надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм;
- 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Бетонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 2 ЛЕД осветлувања x 18w
 - 1 Прекинувач
 - 3 Монофазни надградни приклучоци
 - 1 Монофазен надграден приклучок - клима
 - Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурани
 - Доводна IP табла
 - Климатизација- инвертер сплит систем 2,5KW
- Конструкција:** Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009
- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажаен објект 3мм

Изработка, транспорт и монтажа на топла врска коридор за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларијата поставеност - Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0.4мм надворешно најмалку 0.4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 2 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“ комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков

- 13 ПВЦ - енокрилни прозори со термопан стакло, 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм
- Изработени од еколошки силни ПАНЕЛИ (PVC) најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лине" и надворешно фасадно "лине". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмалку 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002.

Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Ветолур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 12 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурани
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009.

Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм. Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2550мм/ должина 41000мм - апроксимативно. Поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации.

***Начин на испорака за ДЕЛ 1 – во рок од 5-10 календарски дена од потпишување на договор.**

Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба.

ДЕЛ 1.

Ред. Бр.	ОПИС	Единична цена (денари)	Количина/ Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- ТИП 1	430500	4	1722000	309960	2031960
2	Монтажен објект - ТИП 2	430500	2	861000	154980	1015980
3	Монтажен објект медицински персонал	199875	3	599625	107932,5	707557,5

ВКУПНО ЗА ПЛАКАЌЕ	1	1076250	193725	1269975
4	Топла врска-коридор 41м	1076250		
				5025472,5

ДЕЛ 2.

1. Изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект – (Сметувачки) – куќ на рака-димензии, должина 6000 мм – ширина 7200 мм и висина 2600 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да бидат опремени со:

- Кровна конструкција (двоводен кров) ±100мм
- Кровни ребрасти панели (PVC) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмалку 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- Олуци
- 1 ПВЦ - врата без праг 1050 мм – 2050мм исподна панел „сакче“
- 2 ПВЦ – двокрилни со термопан стакло, 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 1400мм-1400мм

Изработени од еколошки силни ПАНЕЛИ (PVC) најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лине" и надворешно фасадно "лине". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмалку 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Под:

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-40 мм-3мм
- Цементни (Ветолур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 ДЕЛ светла x 18w
- 1 Прекинувач
- 6 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - ктима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурани
- Доводна IP табла
- Инвертер сплит систем за климатизација – 3,5 KW или еквивалентни

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или „еквивалент“, согласно МКС EN10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажн објект најмалку 3мм

2. Изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект – ходник за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери – димензии: должина 42000 мм – ширина 2400мм и висина 2550 мм- апроксимативно (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да бидат опремени со:

Кровна конструкција Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- 1 ПВЦ – дулла врата без праг 90 мм – 2050мм исполна термоман стакло 4+16+4
- 1 ПВЦ – со термоман стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1400мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4 мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-40мм-3мм
- Цементни (Ветопур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 14 ЛЕД светла x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни наградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција:

Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или „еквивалент“, согласно MKS EN10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажн објект најмалку 3мм

3. Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- 2 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“ комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2/900/2050 мм исполна со термоман стакло 4x16x4 комплет со потребен оков
- 13 ПВЦ - еднокрилни прозори со термоман стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм;

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Ветопур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 3Монофазни наградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно MKS EN 10025-2:2009

Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2550мм должина 18000мм- апроксимативно. Поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации.

- **Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект** – (вече со туш кабини – тоалети- ТИП I) - клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) или во зависност од модуларната поставеност
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“

- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „сакс“;
 - 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм
- Изработени од еколошки силни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно „лице“ и надворешно фасадно „лице“. Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмалку 0,43(W/m2K) RAL 9002/9002.
- Внатрешни кабинни седишни панел PUR сид најмалку 40мм;
- Пол**
- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
 - Цементни (Ветолур) таблаи 20мм
 - ПВЦ под
 - Комплетна инсталација
 - 3 LED осветлувања x 18w
 - 1 Прекинувач
 - 2 Монофазни надградни приклучоци
 - Разволна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурани
 - Доводна IP табла
- Таблет со 4 кабинни и тоа:**
- 3 Вк- кабинни опремени со тоглетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
 - 3 Мидлинки
 - 3 Батериски четини комплет со врзен материјал
 - 1 тучи кабинна комплет со батерија и снот потребен врзен материјал
 - Довод
 - Давол
 - ПВЦ цевки
 - Електричен Бидлер 80л
 - Конвекторски панел за загревање 2KW
- или еквивалентни
- Конструкција:** Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009
- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект минимум 3мм

*Начин на испорака за ДЕЛ 2 – во рок од 10-20 календарски дена од потпишување на договор. Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба

ДЕЛ 2.

Ред. Бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количина/Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- сместувачки	676500	12	8118000	1461240	9579240
2	Монтажен објект ходник - 42 м	1076250	1	1076250	193725	1269975
3	Монтажен објект медицински персонал	199875	1	199875	35977,5	235852,5
4	Топла врска- коридор 18м	369000	1	369000	66420	435420
5	Монтажен објект- ТИП 1	430500	4	1722000	309960	2031960
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						13352447,5

ДЕЛ 3.

- **Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и ЈЗУ УК за Инфективни и фебрилни состојби, по принципот куќа на рака.

Топлата врска да биде опремена со:

Кровна конструкција (едноволен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m2K) RAL 9002/9002
- 2 ПВЦ дугти врати 2x 900мм x 2050мм исполна термопан стакло 4x16x4 “комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2 x 900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков и можност за заклучување
- 8 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм

Изработени од еколошки силни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно „лице“ и надворешно фасадно „лице“. Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина

на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмалку 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- Под
- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Ветонур) табли 20мм
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 20 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 5 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на ѕид со минимум 3 автоматски осигурани
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железно антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009


- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажаен објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 3000мм / висина 2550мм/ должина 340000мм - апроксимативно. Детална поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации. Изведувачот е должен на направи разработка на скицата и работилнички цртежи.

***Начин на испорака за ДЕЛ 3 – во рок од 10-20 календарски дена од потпишување на договор. Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба**

ДЕЛ 3.

Ред. Бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количина парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Топла врска – коридор 34 м	922500	1	922500	166050	1088550
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						1088550

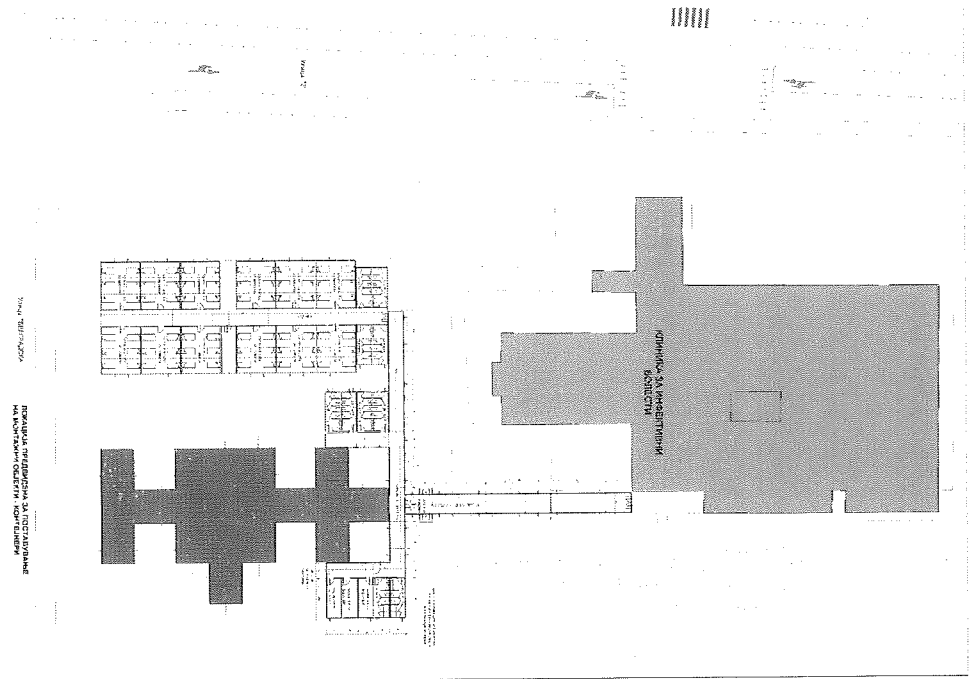

ИЗДАНИЕ

ПРОЕКТ

ПЛАНЫ

Број: 0818-50/150020200083257

Датум и време: 1.4.2020 г. 03:06:10

/Електронски издаден документ/

ПОТВРДА
за регистрирана дејност

ТЕКОВНИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5627940
Назив:	Друштво за трговија и услуги МСС-МОБИЛЕН САНИТАРЕН СЕРВИС ДООЕЛ Скопје
Седиште:	ЖДАНЕЦ бр.19/Б СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ

ПОДАТОЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНА ДЕЈНОСТ	
Предмет на работење:	Не е регистрирана општа клаузула за бизнис
Приоритетна дејност/ главна приходна шифра:	81.29 - Останати услуги на чистење, неспомнати на друго место
Други дејности во внатрешниот промет:	Нема
Евидентирани дејности во надворешниот промет:	Има
Одобренија, дозволи, лиценци, согласности:	Нема

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.



ПРИЛОГ 3 - Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаната Соња Јаневска, врз основа на член 101 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на овластено лице на понудувачот МСС-Мобилен Санитарен Сервис ДООЕЛ Скопје, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 101 став 7 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Овластено лице

Скопје, 08,04,2020

Соња Јаневска

Sonja
Janev
ska

Digitally signed by
Sonja Janevska
DN: o=MSS mobilen
sanitaren servis DOOEL
Skopje, c=MK,
email=sonjkrstic@yah
oo.com, sn=Janevska,
givenName=Sonja,
cn=Sonja Janevska
Date: 2020.04.08
19:14:57 +02'00'

Mailing address:

Zdanec 19b
1000 Skopje,
Macedonija
E-mail:sonjkrstic@yahoo.com

Mobile phone:

+389 75 273 927
Fax no:
+389 2 2461 117
Phone no:
+389 2 2461 337

Base company:

ADCO International GmbH Ratingen Germany Tel-
fax: +49 21 02 852 203;
Bank account no:
Stopanska banka s-ka 200000099484259 MKD

Company reg no:

Macedonia: 5627940
Web:www.adco.de

Дел 3. Рок на важност на понудата: 30 дена

На преговорите што ќе ги закаже договорниот орган, понудувачот ќе го претставува лицето Соња Јаневска, тел 075/273927.

Дел 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Место и датум

Овластено лице

Скопје, 08,04,2020

Соња Јаневска



ПРИЛОГ 2



Образец на понуда

Врз основа на поканата за поднесување на понуди за доделување на договор за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел 1. Информации за понудувачот

1.1. Име на понудувачот: МСС-Мобилен Санитарен Сервис ДООЕЛ Скопје

1.2. Контакт информации:

- Адреса: ул. Жданец бр. 196, Скопје
- Телефон: 02/2461-337
- Факс: 02/2461-117
- Е-пошта: sonjatoitoy@gmail.com
- Лице за контакт: Соња Јаневска

1.3. Одговорно лице: Соња Јаневска

1.4. Даночен број: 4030002440360

Sonja
Jane
vska

Digitally signed by
Sonja Janevska
DN: o=MSS mobilien
sanitaren servis
DOOEL Skopje, c=MK,
email=sonjakrstic@ya
hoo.com,
sn=Janevska,
givenName=Sonja,
cn=Sonja Janevska
Date: 2020.04.09
09:52:36 +02'00'

Дел 2. Финансиска понуда

2.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за: **ДЕЛ 1 / 2 / 3 (соодветно да се пополни)**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, за за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** 54.013.320,00 [со бројки] (педесет и четири милиони тринаесет илјади и триста дваесет) [со букви] денари. Вкупниот износ на ДДВ изнесува 8.239.320,00 денари.

2.2 Ги прифаќаеме начинот на плаќање и рокот на реализација на предметот на набавка утврдени во тендерската документација.

Mailing address:

Zdanec 19b
1000 Skopje,
Macedonija
E-mail: sonjakrstic@yahoo.com

Mobile phone:

+389 75 273 927
Fax no:
+389 2 2461 117
Phone no:
+389 2 2461 337

Base company:

ADCO International GmbH Ratingen Germany
Tel-
fax: +49 21 02 852 203,
Bank account no:
Stopanska banka s-ka 200000099484259 MKD

Company reg no:

Macedonia: 5627940
Web: www.adco.de

Digitally signed by Sonja

Sonja

DN: o=MSS mobilien

sanitaten servs DOOEL

Skopje, c=MK

Janevs

email=sonjakristic@yahoo.c

om, sn=janevska,

givenName=Sonja,

cn=Sonja Janevska

Date: 2020.04.09 09:49:59

+02:00'



ПРИЛОГ

ka

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Согласно одлуките на Владата на Република Северна Македонија за мерки и препораки за заштита и превенција од Коронавирус COVID-19, а поради епитемување на бројот на заболени лица се јавува потреба од предвидување на нови болнички капацитети за згрижување на заболените лица. Министерството за здравство има потреба од набавка – прибирање на понуди за **Монтажни контејнери за потребиите на здравствениот систем**, кои ќе се поставуваат во непосредна близина на ЈЗУ Универзитетска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби при Универзитетскиот Клинички комплекс „Мајка Тереза“ во Скопје и во согласност со Извадок од Навидт-законикот од Тринеет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година („Точка 10“). За таа цел, планирана е лесна, брза и монтажна изградба на медицински капацитети – болничко сместување со просторија за медицински персонал и згрижување со медицински третман на заболени лица од Коронавирус COVID-19. Локацијата на која е предвидено поставување на модулите за монтажен објект - контејнери, претходно на подлогата е поставено шилдунак и истага е навештирана со тампон.

На локацијата ќе биде обезбеден приклучок на водоводна и канализациона мрежа и приклучок кон електро дистрибутивната мрежа заради потребите од снабдување со електрична енергија.

Со поставувањето на модуларните монтажни објекти – контејнери се предвидува да се добие обезбеден простор за:

- (канцелариски) – за потребите на медицински персонал;
- сместувачки капацитет – болнички кревети;
- тоалети со Туш кабини;
- Холник; и
- „топла врска“

Во прилог е даден: графички цртеж со просторно решение и диспозиција на модулите.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ:

ДЕЛ I.

1. **Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (Контејнер – тоалети - Тип I)**
– КЛУЧ на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (наворешна димензија) или „еквивалентно“.

Топлетните Контејнери се опремени со:

Mailing address:	Mobile phone:	Base company:	Company reg no:
“Делтеп 139” 1000 Скопје Македонија E-mail:sonjakristic@yahoo.com	+389 75 273 527 +389 2 248 1 117 +389 2 248 1 347	ADCO International GmbH (Adco) Skopje Adi: “Чр. 21“ 01.875.209. Bank account no: Sporazikna banka s.l.a. LOMARROB991841250 AIBKD	5027940 www.adco.mk

- димензии должина 6,013м, ширина 2,328м и висина 2,400м.
 - Челичната рамка е изработена од ладно валани челични профили и покриена со обложена боја во прав во RAL 9002.
 - ѕидовите и таванот се градени од сендвич панели исполнети со камена волна (челичен лим од 0,5 мм со 5 микроли основна боја и 20 микроли боја во RAL 9002 од двете страни) и исполнети со Изолација од 40мм од волна од карпа (100-110 кг / м², класа на реакција на пожар А1, акт ДИН 4102 (EN 14509) и топлинска спроводливост 0,095 W / мК).
 - Дополнување на покривот носивост до 80 кг / м² (Снежни врнежи) а, ѕидовите можат да издржат брзина на ветерот до 102 км на час.
 - Подната конструкција се состои од ладно валани челични профили и челични плочи со дебелина од 0,9 мм. Финалната подна покривка е 3мм алуминиумски лим.
 - 2 подни одводи
 - ППР инсталација на вода 25мм и сигурносни вентили со сертификат DVGW, ПВЦ инсталација на канализација ДН 110 заштитена со метални капаци на лим.
 - 1 влезна врата од ПВЦ 900 мм x 2200 мм со PU изолација и заклучување ВКС со 3 копчиња,
 - 1 ПВЦ прозорец 600 птм x 400 птм w i t h PU изолација и двојно застаклување,
 - Електричен влез со СЕЕ индустриски приклучок 32А IP44 230 V / 50 Hz, внатрешно осветлување со 2 неонски ламби 2x36W, 2 двоцветни електрични приклучници IP44, дистрибутивна табла IP65, прекинувач 40А 0,03mA
 - 4вц-кабини , 4 мијалници (500 x 400) со подградба на иверица за заштита од вода за дополнителна стабилност, бојлер 1,5 kW 80 литри, 2 вентилатори 120 птм 30 W, електричен грејач 2KW.
- 2. Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажн објект – (Контејнер со туш кабини –**
Товлети- ТИП 2), - **клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм**
(наворешна димензија) или „еквивалентно“.
- Туш Контејнерите се опремени со:**
- димензии должина 6,013м, ширина 2,328м и висина 2,400м.
 - Челичната рамка е изработена од ладно валани челични профили и покриена со обложена боја во прав во RAL 9002.
 - ѕидовите и таванот се градени од сендвич панели исполнети со камена волна (челичен лим од 0,5 мм со 5 микроли основна боја и 20 микроли боја во RAL 9002 од двете страни) и исполнети со Изолација од 40мм од волна од карпа (100-110 кг / м², класа на реакција на пожар А1, акт ДИН 4102 (EN 14509) и топлинска спроводливост 0,095 W / мК).
 - Дополнување на покривот носивост до 80 кг / м² (Снежни врнежи) а, ѕидовите можат да издржат брзина на ветерот до 102 км на час.

- Под: Завршна подна облога е ПВЦ облога која со ѕидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Ј-форма
- Таван: Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација
- Отпрема: (на контејнер)
 - 1 Алуминиумска врата на челната страна
 - 1 прозор ПВЦ на челната страна со надворешна ролетна
 - Електро инсталацијата е изведена надградно и видливо во кабелски канали, разводна куќа надградена на таванот, надградни штекови 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници слушени во рамката на челната страна.
- 3. Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот куќа на рака.
- Контејнерите се отпремени со:**
 Надворешни Дим: отприлика 6055 x 2435 x 2591 mm,
 Внатрешни Дим: отприлика 5855 x 2235 x 2326 mm,
 Површина: отприлика 13,09 m²
- Рамка / Конструкција: Заварени подни и кровни елементи со по 4 пар ИСО / атолници за нивно меѓусебно поврзување во хоризонтала и вертикала, за лесна манипулација со кран и имаат штрафени столбови.
- Ѕидови: Сендвич Панели со Полиуретанска изолација од 60мм и боја RAL 9002 од двете страни
- Под: Завршна подна облога е ПВЦ облога која со ѕидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Ј-форма
- Таван: Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација
- Отпрема: (на контејнер)
 - 1 Алуминиумска врата на челната страна
 - 1 прозор ПВЦ на челната страна со надворешна ролетна
 - Електро инсталацијата е изведена надградно и видливо во кабелски канали, разводна куќа надградена на таванот, надградни штекови 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници слушени во рамката на челната страна.
- 5. Изработка/изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (весе со тупи кабини – “тоалети- ТИП 1 и тип 2) - куќа на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.**
- Тип-тоалетните Контејнерите се отпремени со:

- димензии должина 6,013м, ширина 2,328м и висина 2,400м.

- Челичната рамка е изработена од ладно валани челични профили и покрена со обложена боја во прав во RAL 9002.
- ѕидовите и таванот се градени од сендвич панели исполнети со камена волна (челичен лим од 0,5 мм со 5 микроли основна боја и 20 микроли боја во RAL 9002 од двете страни) и исполнети со Изолација од 40мм од волна од карпа (100-110 кг / м², класа на реакција на пожар А1, акт DIN 4102 (EN 14509) и топлинска спроводливост 0,095 w / mK).
- Надополнување на покривот носивост до 80 кг / м² (снежни врнежи) а ѕидовите можат да издржат брзина на ветерот до 102 км на час,
- Подната конструкција се состои од ладно валани челични профили и челични плочи со дебелина од 0,9 мм. Финансата подна покривка е Зми алуминиумски лим,
- 2 подни одводи
- ППР инсталација на вода 25мм и сигурносни вентили со сертифицикат DVGW, ПВЦ инсталација на канализација ДН 110 заштитена со метални капаци на лим.
- 1 влезна врата од ПВЦ 900 мм x 2200 мм со РУ изолација и заклучување ВК5 со 3 копчиња,
- 1 ПВЦ прозорец 600 mm x 400 mm w i t n РУ изолација и двојно застаклување,
- Електричен влез со СЕЕ индустриски приклучок 32А IP44
- 230 V / 50 Hz, внатрешно осветлување со 2 неонски ламби 2x36W, 2 двокреветни електрични приклучници IP44, Дистрибутивна табла 165, прекинвач 40А 0,03тА
- 3тупи кабини(800*800), 3 мигалници (500 x 400) , 3вц кабини со подграда на иверци за заштита од вода за дополнителна стабилност, бојлер 4,5 KW 300 литри, 2 вентилатори 120 mm 30 W, електричен грејач 2KW.

Табела 2

Ред. Бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Кол. чин на/ПЗ	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- сместувачки	682.000,00 ден	31	21.142.000,00 ден	3.805.560,00 ден	24.947.560,00 ден
2	Монтажен објект ходник - 42 м	4.160.000,00 ден	1	4.160.000,00 ден	748.800,00 ден	4.908.800,00 ден
3	Монтажен објект медицински персонал	682.000,00 ден	1	682.000,00 ден	122.760,00 ден	804.760,00 ден

4	Топла врска-коридор 18м	1.650.000,00 ден	1 ден	1.650.000,00 ден	297.000,00 ден	1.947.000,00 ден
5	Монтажен објект-ТИП I	980.000,00 ден	4 ден	3.920.000,00 ден	705.600,00 ден	4.625.600,00 ден
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						
						37.233.720,00 ден

ДЕЛ 3.

1. Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и ЈЗУ УК за Инфективни и фебрилни состојби, по принципот клуч на рака.

Топлата врска да биде опремена со:

Контејнерите се опремени со:

Надворешни Дим.: отприлика 6055 x 2435 x 2591 mm,
Внатрешни Дим.: отприлика 5855 x 2235 x 2326 mm,
Површина: отприлика 13,09 m²

Рамка / Конструкција:

Заварени подни и кровни елементи со по 4 пар. ИСО / аголници за нивно меѓусебно поврзување во хоризонтала и вертикала, за лесна манипулација со кран и имаат штрафени столбови.

Сидови:

Сендвич Панели со Полиуретанска изолација од 60мм и боја RAL 9002 од двете страни

Под:

Завршна подна облога е ПВЦ облога која со сидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Л-форма

Таван:

Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација

Опрема:

(на контејнер)
 - 1 Алуминиумска врата на челната страна
 - 1 прозор ПВЦ на челната страна
 - Електро инсталацијата е изведена надградно и видливо во кабелски канали, разводна кутија надградна на таванот, надградни штекови 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници слуштени во рамката на челната страна.

***Начин на испорака за ДЕЛ 3 – во рок од 10-20 календарски дена од потпишување на договорот.**

Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба

ДЕЛ 2.**ДЕЛ 2.**

1. Изработка транспорт и монтажа на монтажн објект – (сместувачки) – клуч на рака.

Контејнерите да бидат опремени со:

Надворешни Дим.: отприлика 6055 x 2435 x 2591 mm,

Внатрешни Дим.: отприлика 5855 x 2235 x 2326 mm,

Површина: отприлика 13,09 m²

Рамка / Конструкција:

Заварени подни и кровни елементи со по 4 пар. ИСО / аголници за нивно меѓусебно поврзување во хоризонтала и вертикала, за лесна манипулација со кран и имаат штрафени столбови.

Сидови:

Сендвич Панели со Полиуретанска изолација од 60мм и боја RAL 9002 од двете страни

Под:

Завршна подна облога е ПВЦ облога која со сидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Л-форма

Таван:

Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација

Опрема:

(на контејнер)
 - 1 Алуминиумска врата на челната страна
 - 1 прозор ПВЦ на челната страна со надворешна ролетна
 - Клима Уред
 - Електро инсталацијата е изведена надградно и видливо во кабелски канали, разводна кутија надградна на таванот, надградни штекови 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници слуштени во рамката на челната страна.

2. Изработка транспорт и монтажа на монтажн објект – ходник за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери – димензии: должина 42000 мм – ширина 2400мм и висина 2550 мм- апроксимативно (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со:

Надворешни Дим.: отприлика 6055 x 2435 x 2591 mm,

Внатрешни Дим.: отприлика 5855 x 2235 x 2326 mm,

Површина: отприлика 13,09 m²

Рамка / Конструкција:

Заварени подни и кровни елементи со по 4 пар. ИСО / аголници за нивно меѓусебно поврзување во хоризонтала и вертикала, за лесна манипулација со кран и имаат штрафени столбови.

Сидови:

Сендвич Панели со Полиуретанска изолација од 60мм и боја RAL 9002 од двете страни

Под: Завршна подна облога е ПВЦ облога која со ѕидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Ј-форма

Таван: Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација

Опрема: (на контејнер)

- 1 Алуминиумска врата на челната страна
- 1 прозор ПВЦ на челната страна со надворешна ролетна
- Електро инсталацијата е изведена надградно и видново во кабелски канали, разводна кутија надградна на таванот, надградни штекери 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници слуштени во рамката на челната страна.

3. **Изработка трансподт и монтажа на топла врска коплицор** за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

Надворешни Дим.: отприлика 6055 x 2435 x 2591 mm,

Внатрешни Дим.: отприлика 5855 x 2235 x 2326 mm,

Површина: отприлика 13,09 m²

Рамка / Конструкција: Заварени подни и кровни елементи со по 4 пар. ИСО / аголтени за нивно меѓусебно поврзување во хоризонтала и вертикала, за лесна манипулација со кран и имаат штрафени столбови.

Ѕидови: Сендвич Панели со Полиуретанска изолација од 60мм и боја RAL 9002 од двете страни

Под: Завршна подна облога е ПВЦ облога која со ѕидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Ј-форма

Таван: Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација

Опрема: (на контејнер)

- 1 Алуминиумска врата на челната страна
- 1 прозор ПВЦ на челната страна со надворешна ролетна
- Електро инсталацијата е изведена надградно и видново во кабелски канали, разводна кутија надградна на таванот, надградни штекери 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници слуштени во рамката на челната страна.

5. **Набавка/изработка, трансподт и монтажа на монтажен објект – (веле со твш кабини – тоалети- ГМИ 1 и тип 2)** – клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2350 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Твш-тоалетните Контејнерите се опремени со:

- димензии должина 6,013м, ширина 2,328м и висина 2,400м.

- Челичната рамка е изработена од ладно валани челични профили и покривена со обложена боја во прав во RAL 9002,

- ѕидовите и таванот се градени од сендвич панели исполнети со камена волна (челичен лим од 0,5 мм со 5 микролни основна боја и 20 микролни боја во RAL 9002 од двете страни) и исполнети со Изолација од 40мм од волна од карпа (100-110 кг / м², класа на реакција на пожар А1, акт ДИН 4102 (EN 14509) и топлинска спроводливост 0,095 W / mK),

- Надополнување на покривот носивост до 80 кг / м² (снежни врнежи) а ѕидовите можат да издржат брзина на ветерот до 102 км на час,

- Подната конструкција се состои од ладно валани челични профили и челични плочи со дебелина од 0,9 мм. Финансната подна покривка е 3мм алуминиумски лим,

-2 подни одводи

- ППР инсталација на вода 25мм и сигурносни вентили со сертификат DVGW, ПВЦ инсталација на канализација ДН 110 заштитена со метални капаци на лим.

- 1 влезна врата од ПВЦ 900 мм x 2200 мм со РУ изолација и заклучување ВКС со 3 копчиња,

- 1 ПВЦ прозорец 600 mm x 400 mm w i t Н РУ изолација и двојно застаклување,

- Електричен влез со СЕЕ индустриски приклучок 32А IP44

230 V / 50 Hz, внатрешно осветлување со 2 неонски ламби 2x36W, 2 двокреветни електрични приклучници IP44, дистрибутивна табла IP65, прекинувач 40А 0,03мА

- 3твш-кабини(800*800), 3 мидлиници (500 x 400), 3вч кабини со подградба на иверица за заштита од вода за доплонителна стабилност, бојлер 4,5 KW 300 литри, 2 вентилатори 120 mm 30 W, електричен грејач 2KW.

ДЕЛ 2.

Ред. Бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Кол нини на/П (денари)	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- објект- сметуваќи	682.000,00 ден	31	21.142.000,00 ден	3.805.560,00 ден	24.947.560,00 ден
2	Монтажен објект ходник -42 м	4.160.000,00 ден	1	4.160.000,00 ден	748.800,00 ден	4.908.800,00 ден
3	Монтажен објект медицински персонал	682.000,00 ден	1	682.000,00 ден	122.760,00 ден	804.760,00 ден

4. **Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот куќа на рака.

Контејнерите се опремени со:

Наворешни Дим.: отприлика 6055 x 2435 x 2591 mm,
Внатрешни Дим.: отприлика 5855 x 2235 x 2326 mm,
Површина: отприлика 13,09 m²

Рамка / Конструкција: Заварени подни и кровни елементи со по 4 пар. ИСО / аголници за нивно меѓусебно поврзување во хоризонтала и вертикала, за лесна манипулација со кран и имаат штрафени столбови.

Сидови: Сендвич Панели со Полиуретанска изолација од 60мм и боја RAL 9002 од двете страни

Под: Завршна подна облога е ПВЦ облога која со сидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Ј-форма

Таван: Од сендвич Панели со Полиуретанска изолација

Опрема: (на контејнер)

- 1 Алуминиумска врата на челната страна
- 1 прозор ПВЦ на челната страна
- Електро инсталацијата е изведена надградно и вилливо во кабелски канали, разводна кутија надградна на таванот, надградни штекови 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници спуштени во рамката на челната страна.

***Начин на испорака за ДЕЛ 1 – во рок од 5-10 календарски дена од потпишување на договор.**
Давените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичња состојба.

ДЕЛ 1.

Ред. Бр.	ОПИС	Единична цена (денари)	Количини на/ парче	Вкупно (денари)	18% ДПВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект- ТИП 1	950.000,00 ден	4 ден	3.800.000,00 ден	684.000,00 ден	4.484.000,00 ден
2	Монтажен објект - ТИП 2	930.000,00 ден	2 ден	1.860.000,00 ден	334.800,00 ден	2.194.800,00 ден
3	Монтажен објект медицински персонал	620.000,00 ден	3 ден	1.860.000,00 ден	334.800,00 ден	2.194.800,00 ден
4	Топла врска- коридор 41м	3.100.000,00 ден	1 ден	3.100.000,00 ден	558.000,00 ден	3.658.000,00 ден
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						12.531.600,00 ден

Ред. Бр.	ОПИС	Единична цена (денари)	Количини на парче	Вкупно (денари)	18% ДПВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Топла врска – коридор 34 м	3.600.000,00 ден	1 ден	3.600.000,00 ден	648.000,00 ден	4.248.000,00 ден
						4.248.000,00 ден

- Подната конструкција се состои од ладно валани челични профили и челични плочи со дебелина од 0,9 мм. Финалната подна покривка е 3мм алуминиумски лим,

-2 подни одводи

- ППР инсталација на вода 25мм и сигурносни вентили со сертификат DVGW, ПВЦ инсталација на канализација ДН 110 заштитена со метални капаци на лим.

- 1 влезна врата од ПВЦ 900 мм x 2200 мм со PU изолација и заклучување BKS со 3 копчиња,

- 1 ПВЦ прозорец 600 mm x 400 mm with PU изолација и двојно застаклување,

- Електричен влез со СЕЕ индустриски приклучок 32А IP44 230 V / 50 Hz, внатрешно осветлување со 2 неонски ламби 2x36W, 2 двоцветни електрични приклучници IP44, дистрибутивна табла IP65, прекинувач 40А 0,03mA

- 5туш-кабини(800*800) , 5 мијалници (500 x 400) со подградба на иверца за заштита од вода за дополнителна стабилност, бојлер 4,5 KW 300 литри, 2 вентилатори 120 mm 30 W, електричен грејач 2KW.

3. **Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (Машиниски персонал) –** клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со-опис:

Надворешни Дим.: отприлика 6055 x 2435 x 2591 mm,

Внатрешни Дим.: отприлика 5855 x 2235 x 2326 mm,

Површина: отприлика 13,09 m²

Рамка / Конструкција: Заварени подни и кровни елементи со по 4 пар. ИСО / аголници за нивно меѓусебно поврзување во хоризонтала и вертикала, за лесна манипулација со кран и имаат штрафени столбови.

Сидови: Сандвич Панели со Полиуретанска изолација од 60мм и боја RAL 9002 од двете страни

Под: Завршна подна облога е ПВЦ облога која со сидовите е споена со ПВЦ/лајсни со Л-форма

Таван: Од сандвич Панели со Полиуретанска изолација

Отпрема:

(на контејнер)

- 1 Алуминиумска врата на челната страна
- 1 прозор ПВЦ на челната страна
- Клима Уред
- Електро инсталацијата е изведена надградно и видно во кабелски канали, разводна кутија надградна на таванот, надградни штекови 2 лед тавански светилки , индустриски приклучници спуштени во рамката на челната страна.



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Бр. 23-3039/14
10 APR 2020 година

Записник од постапка со преговарање без претходно објавување на оглас од причини од крајна итност за набавка на монтажни контејнери за потребите на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија на Република Северна Македонија¹

Договорен орган: Министерство за здравство на Република Северна Македонија

Архивски број на одлуката за јавна набавка: 23-3039/2 од 07.04.2020 и 23-3039/4 од 09.04.2020

Предмет на договорот за јавна набавка: на монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија

Дата и час на преговарање: 10/04/2020 година во 11:00 часот

- Место на преговарање: Со користење на електронски средства во Министерството за здравство на РСМ

2. По отварањето на понудите и извршена Евалуација на истите, Комисијата за јавни набавки констатираше дека за оваа набавка треба да бидат повикани на преговарање за цената на предметот на набавка, Економските оператори кои ги исполнуваат барањата од тендерската документација, и тоа за:

Јавна набавка на монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија

ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);

Ред. бр.	Понудувач	Место	контактАдреса
1	Кен панел монтинг дооел Скопје	Скопје	Ул.горно Лисиче бр.186 б, 1000 Скопје
2	ЈБТ Проинженеринг	Валандово	Маршал Тито бр.4, Валандово

¹ Предмет на набавка



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

	Валандово		
3	ДПТУ Брако доо Велес	Велес	Ул. Раштански пат бр.2 , 1400 Велес
4	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	Валандово	Маршал Тито ББ , Валандово
5	МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	Скопје	Ул.Жданец бр.196 , 1000 Скопје

ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)

Ред. бр.	Понудувач	Место	Адреса
1	Кен панел монтинг дооел Скопје	Скопје	Ул.горно Лисиче бр.186 б , 1000 Скопје
2	ЈБТ Проинженеринг Валандово	Валандово	Маршал Тито бр.4 , Валандово
3	ДПТУ Брако доо Велес	Велес	Ул. Раштански пат бр.2 , 1400 Велес
4	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	Валандово	Маршал Тито ББ , Валандово
5	МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	Скопје	Ул.Жданец бр.196 , 1000 Скопје

ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

Ред. бр.	Понудувач	Место	Адреса
1	Кен панел монтинг	Скопје	Ул.горно Лисиче бр.186 б , 1000



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

	дооел Скопје		Скопје
2	ЈБТ Проинженеринг Валандово	Валандово	Маршал Тито бр.4 , Валандово
3	ДПТУ Брако доо Велес	Велес	Ул. Раштански пат бр.2 , 1400 Велес
4	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	Валандово	Маршал Тито ББ , Валандово
5	МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	Скопје	Ул.Жданец бр.196 , 1000 Скопје

ПОНУДЕНИ ЦЕНИ

ДЕЛ	Кен панел монтинг дооел Скопје	Вкупно без ддв
ДЕЛ 1	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);	4.387.410,17
ДЕЛ 2	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	10.549.340,67
ДЕЛ 3	Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	1.611.300,00

ДЕЛ	ЈБТ Проинженеринг Валандово	Вкупно без ддв



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

ДЕЛ 1	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);	4.258.875,00
ДЕЛ 2	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	11.485.125,00
ДЕЛ 3	Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	922.500,00

ДЕЛ	ДПТУ Брако доо Велес	Вкупно без ддв
ДЕЛ 1	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);	2.910.451,00
ДЕЛ 2	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	8.248.240,00
ДЕЛ 3	Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	987.200,00

ДЕЛ	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	Вкупно без ддв
ДЕЛ 1	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);	4.163.000,00



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

ДЕЛ 2	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	10.311.000,00
ДЕЛ 3	Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	922 500,00

ДЕЛ	МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	Вкупно без ддв
ДЕЛ 1	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);	10.620.000,00
ДЕЛ 2	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	31.554.000,00
ДЕЛ 3	Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	3.600.000,00

ПРВ КРУГ НА ПРЕГОВАРАЊЕ И ПОНУДЕНИ ЦЕНИ

По прашање на Комисијата за јавни набавки дали ја намалуваат понудената цена, и која ќе биде понудена цена во првиот круг од преговарањето, овластените претставници се изјаснија за следново:



Република Северна Македонија
Министерство за здравство

ДЕЛ	Преговарање за дел 1 -	Понудени цени
ДЕЛ 1	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);	Најниска почетна цена 2 910 451,00
	Во текот на преговарањето понудувачите ја намалуваа цената со следната динамика: 1. 2.870.000,00 2. 2.850.000,00 3. 2.840.00,00 4. 2.830.000,00 5. 2.800.000,00 6. 2.790.000,00 7. 2.750.000,00 8. 2.740.000,00 9. 2.730.000,00 10. 2.720.000,00 11. 2.710.000,00 12. 2.700.000,00 13. 2.690.000,00 14. 2.680.000,00 15. 2.670.000,00 16. 2.660.000,00 17. 2.650.000,00 18. 2.640.000,00 19. 2.630.000,00	



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

20. 2.620.000,00	
21. 2.610.000,00	
22. 2.590.000,00	
23. 2.580.000,00	
24. 2.570.000,00	
25. 2.560.000,00	
26. 2.550.000,00	
27. 2.540.000,00	
27. 2.530.000,00	
28. 2.510.000,00	
29. 2.500.000,00	
30. 2.490.000,00	
31. 2.480.000,00	
32. 2.470.000,00	
33. 2.460.000,00	
34. 2.450.000,00	
35. 2.440.000,00	
36. 2.430.000,00	
37. 2.420.000,00	
38. 2.410.000,00	
39. 2.400.000,00	
40. 2.390.00,00	
42. 2.380.000	
Како најниска понудена цена за ДЕЛ 1 е 2.380.000, 00 денари и економскиот оператор е должен да достави конечна понуда електронски потпишана.	



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

ДЕЛ 2		Понудени цени
ДЕЛ 2	Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	Најниска почетна цена 8.248.240 ,00
	Во текот на преговарањето понудувачите ја намалуваа цената со следната динамика: 1. 8.247.000,00 2. 8.240.000,00 3. 7.850.000,00 4. 7.830.000,00 5. 7.829. 000,00 6. 7.827.000,00 Како најниска понудена цена за ДЕЛ 2 е 7.827.000,00 денари и економскиот оператор е должен да достави конечна понуда електронски потпишана.	

ДЕЛ		Понудени цени
ДЕЛ 3	Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба). Во текот на преговарањето понудувачите ја намалуваа цената со следната динамика: 1.921.000,00 Како најниска понудена цена за ДЕЛ 3 е 921.000,00 денари и економскиот оператор е должен да достави конечна понуда електронски потпишана.	Најниска почетна цена 922.500,00



Република Северна Македонија
Министерство за здравство

Со завршувањето на првиот круг и негативното надавање завршува постапката со преговарање без претходно објавување на оглас

Комисија за јавни набавки

Љупчо Балкоски (претседател)

Вања Андонова (член)

Сандра Веловска (член)

Дамјан Христов (заменик претседател)

Елена Иванова (заменик член)

Јован Грповски (заменик член)

Мирјана Македонска – претставник на Амбасадата на Швајцарија

Записникот од преговарање користејќи електронски средства , ќе биде доставен до економските оператори по електронски пат.

Дел 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Дел 5. Технички спецификации
ДЕЛ 3.

- 1. Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и ЈЗУ УК за Инфективни и фебрилни состојби, по принципот клуч на рака.

Топлата врска да биде опремена со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 2 ПВЦ дупли врати 2x 900мм x 2050мм исполна термопан стакло 4x16x4 “комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2 x 900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков и можност за заклучување
- 18 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- Под
- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betonyr) табли 20мм
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 20 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 5 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железо (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потоа офарбано со електростатско прашкасто фарбање со индустриска полиестерска боја отпорна на надворешни влијаниа, конструктивен S235JR, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажаен објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 3000мм / висина 2550мм/ должина 34000мм - апроксимативно.

Детална поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации. Изведувачот е должен на направи разработка на скицата и работилнички цртежи.

***Начин на испорака за ДЕЛ 3 – во рок од 20 календарски дена од потпишување на договор.**

Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба

НАПОМЕНА: Го задржуваме правото на измена на динамиката согласно производствените капацитети И условите на терен за монтажа. Секој застој поради неспремен терен (денивелација поголема од +/- 30мм), објект, незавршена електро, водоводна и канализациона инсталација или било која друга причина од страна на купувачот ќе биде додаден на динамичкиот план како продолжување на рокот на исполнување. Доколку се случи застој поради непредвидени случувања кои се надвор од наша Контрола како болест, временски непогоди и слично го задржуваме правото на промена на динамичкиот план на испораките и монтажата. Купувачот има обврска да ги обезбеди сите потребни дозволи за работа во време на полицискиот час како и сите други потребни дозволи за работа во клиничкиот центар согласно законските прописи и согласно барањата на изведувачот.
Сите потребни дозволи за транспорт да се обезбедат од страна на купувачот.

ДЕЛ 3.

Ред.бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количина/ Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Топла врска - коридор 34м	921.000,00	1	921.000,00	165.780,00	1.086.780,00
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						1.086.780,00

Датум 10.04.2020

Одговорно лице

Благој Шалев

**Blagoj
Shalev**

Digitally signed by Blagoj Shalev
DN: OU=Upravitel,
O=DPTUBRAKODOO, C=MK,
E=blagoj@brako.com.mk,
SN=Shalev, G=Blagoj, CN=Blagoj
Shalev
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location
here
Date: 2020-04-10 15:09:11
Foxit Reader Version: 9.7.0

BRAKO

ДПТУ БРАКО ДОО

Ул. Раштански пат 2 - 1400, Велес

Р. Северна Македонија

Тел.: ++389 43 212 560, 212 561

Факс ++ 389 43 232 534

www.brako.com.mk; sales@brako.com.mk

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
MINISTRIA E SËNDETËSISË
СКОПЈЕ - ШКУП

Конечна понуда

Примено в Поштар	10 APR 2020		
Идентификац Adresa Org.	Број Number	Прилог Blagos	Важност Vlera
23	3039/15		

Врз основа на поканата за поднесување на понуди за доделување на договор за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел 1. Информации за понудувачот

1.1. Име на понудувачот: ДПТУ БРАКО ДОО

1.2. Контакт информации:

- Адреса: ул. Раштански пат бр. 2 1400 Велес
- Телефон: 043 212 560
- Факс: 043 232 534
- Е-пошта: sales@brako.com.mk ; blagoj@brako.com.mk
- Лице за контакт: Благој Шалев

1.3. Одговорно лице: Благој Шалев

1.4. Даночен број: 4004003114759

Дел 2. Финансиска понуда

2.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за: **ДЕЛ 2 (соодветно да се пополни)**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, за за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност 7.827.000,00 Денари**

(седуммилиониосумстотинидваесетиседумилјади) денари.

Вкупниот износ на ДДВ изнесува 1.408.860,00 денари.

2.2 Ги прифаќаме начинот на плаќање и рокот на реализација на предметот на набавка утврдени во тендерската документација.

Дел 3. Рок на важност на понудата: 30 дена

Дел 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Дел 5. Технички спецификации

ДЕЛ 2.

1. Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (сместувачки) – клуч на рака- димензии: должина 6000 мм – ширина 7200 мм и висина 2600 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да бидат опремени со:

Кровна конструкција (двоводен кров) ± 100 мм

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- Олуци
- 1 ПВЦ - врата без праг 1050 мм – 2050мм исполна панел „саке“
- 2 ПВЦ – двокрилни со термопан стакло, 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 1400мм-1400мм

Изработени од еколошки видни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-4 0мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 ЛЕД светла x 18w
- 1 Прекинувач
- 6 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Инвертер сплит ситем за климатизација – 3,5 KW

или еквивалентни

Конструкција: Челично железо (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потоа офарбано со електростатско прашкасто фарбање со индустриска полиестерска боја отпорна на надворешни влијаниа, конструктивен S235JR, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

2. Изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – ходник за поврзување на објектите оформени од модулари монтажни – контејнери – димензии: должина 42000 мм – ширина 2400мм и висина 2550 мм- апроксимативно (надворешна димензија) или „еквивалентно“

Контејнерите да бидат опремени со:

Кровна конструкција Кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- 1 ПВЦ – дупла врата без праг 90 мм – 2050мм исполна термопан стакло 4+16+4
- 1 ПВЦ – со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1400мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4 мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

Под

- Челична конструкција 100 мм x 40 мм x 3 мм; 100 мм x 20 мм x 3 мм; 80 мм x 50 мм x 3 мм; 50 мм-4 0мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 14 ЛЕД светла x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција:

Челично железо (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потоа офарбано со електростатско прашкасто фарбање со индустриска полиестерска боја отпорна на надворешни влијаниа, конструктивен S235JR, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажаен објект најмалку 3мм

3. Изработка, транспорт и монтажа на монтажаен објект – (медицински персонал) – клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 1 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1400мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 2 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Климатизација- инвертер сплит систем 2,5KW

Конструкција: Челично железо (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потоа офарбано со електростатско прашкасто фарбање со индустриска полиестерска боја отпорна на надворешни влијаниа, конструктивен S235JR, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект 3мм

4. Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор за поврзување на објектите оформени од модулари монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност **Кровни ребрасти панели** (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- 6 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм;

Изработени од еколошки видни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм

- Цементни (Betonyr) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 6 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железо (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потоа офарбано со електростатско прашкасто фарбање со индустриска полиестерска боја отпорна на надворешни влијанија, конструктивен S235JR, согласно MKC EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2550мм/ должина 18000мм- апроксимативно.
Поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации.

1. **Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажен објект – (вече со туш кабини – тоалети- ТИП 1) -** клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) или во зависност од модуларната поставеност
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саќе“;
- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40мм кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабини сендвич панел PUR сид најмалку 40мм;

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betonyr) табли 20мм
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 3 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Тоалет со 4 кабини и тоа:

- 3 Вц- кабини опремени со толетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мијалници
- 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
- 1 туш кабина комплет со батерија и сиот потребен врзен материјал
- Довод
- Одвод
- ПВЦ цевки
- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW

или еквивалентни

Конструкција: Челично железо (конструкција) заштитен со хемиска превлака и потоа офарбано со електростатско прашкасто фарбање со индустриска полиестерска боја отпорна на надворешни влијаниа, конструктивен S235JR, согласно MKC EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажаен објект минимум 3мм

***Начин на испорака за ДЕЛ 2 – во рок од 20 календарски дена од потпишување на договор.**

Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба

НАПОМЕНА: Го задржуваме правото на измена на динамиката согласно производствените капацитети И условите на терен за монтажа. Секој застој поради неспремен терен (денивелација поголема од +/- 30мм), објект, незавршена електро, водоводна и канализациона инсталација или било која друга причина од страна на купувачот ќе биде додаден на динамичкиот план како продолжување на рокот на исполнување. Доколку се случи застој поради непредвидени случувања кои се надвор од наша Контрола како болест, временски непогоди и слично го задржуваме правото на промена на динамичкиот план на испораките и монтажата. Купувачот има обврска да ги обезбеди сите потребни дозволи за работа во време на полицискиот час како и сите други потребни дозволи за работа во клиничкиот центар согласно законските прописи и согласно барањата на изведувачот. Сите потребни дозволи за транспорт да се обезбедат од страна на купувачот.

ДЕЛ 2.

Ред.бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количина/ Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект - сместувачки	433.438,00	12	5.201.256,00	936.226,08	6.137.482,08
2	Монтажен објект ходник - 42м	1.070.276,00	1	1.070.276,00	192.649,68	1.262.925,68
3	Монтажен објект медицински	152.052,00	1	152.052,00	27.369,36	179.421,36
4	Топла врска - коридор 18	447.900,00	1	447.900,00	80.622,00	528.522,00
5	Монтажен објект - ТИП 1	238.879,00	4	955.516,00	171.992,88	1.127.508,88
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						9.235.860,00

Датум 10.04.2020

Blagoj Shalev

Digitally signed by Blagoj Shalev
DN: OU=Upravitel,
O=DPTUBRAKODOO, C=MK,
E=blagoj@brako.com.mk,
SN=Shalev, G=Blagoj,
CN=Blagoj Shalev
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020-04-10 15:08:34
Foxit Reader Version: 9.7.0

Конечна понуда

[меморандум на понудувачот]

Примено E prapcar	10 APR 2020		
Орг. Единица Nësisia Org.	Број Numër	Прилог Shitose	Бованост Vlera
	23-3039	17	

Врз основа на поканата за поднесување на понуди за доделување на договор за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел 1. Информации за понудувачот

1.1. Име на понудувачот: ЉБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Валандово

1.2. Контакт информации:

- Адреса: Маршал Тито бр ББ Валандово
- Телефон: 077 558 037
- Факс: _____
- Е-пошта: _____
- Лице за контакт: Роберт Исиров

1.3. Одговорно лице:

Аристотел Исиров

1.4. Даночен број: 4003006105207

Дел 2. Финансиска понуда

2.1 Според тоа, вкупната цена на нашата понуда за: **ДЕЛ 1 (соодветно да се пополни)**, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, за за јавна набавка на **Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем со постапка со преговарање без објавување оглас од причини од крајна итност** **2.380.000,00 [со бројки]** (_____ два милиони тристотини и осумдесет илјади _____) [со букви] денари.
Вкупниот износ на ДДВ изнесува 428400 денари.

2.2 Ги прифаќаме начинот на плаќање и рокот на реализација на предметот на набавка утврдени во тендерската документација.

Дел 3. Рок на важност на понудата: 30 дена

Дел 4. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација.

Дел 5. Технички спецификации

ДЕЛ 1.

- 1. Набавка/изработка, транспорт и монтажа на монтажаен објект – (вече со туш кабини – тоалети- ТИП 1) -** клуч на рака - со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) или во зависност од модуларната поставеност
- Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саќе“;
- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм

Изработени од еколошки видни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабини сендвич панел PUR вид најмалку 40мм;

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Бетонур) табли 20мм
- ПВЦ под
- Комплетна инсталација
- 3 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Тоалет со 4 кабини и тоа:

- 3 Вц- кабини опремени со толетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мијалници
- 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал

- 1 туш кабина комплет со батерија и сиот потребен врзен материјал
- Довод
- Одвод
- ПВЦ цевки
- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW

или еквивалетни

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно МКС EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект минимум 3мм

2. **Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на монтажнен објект** – (вече со туш кабини – тоалети - **ТИП 2**) – клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите да се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) или во зависност од модуларната поставеност

Кровни ребрасти панели (PUR) панели 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, тежина на полиуретанот 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002

- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 4 ПВЦ - врати 700мм-2050мм исполна панел „саќе“;
- 1 ПВЦ - еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм-1000мм;

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) од најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм, надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43U(W/m²K) RAL 9002/9002;

- Внатрешни кабини сендвич панел PUR сид намалку 40мм

Под

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација

- 3 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Тоалет со 4 кабини и тоа:

- 2 Вц- кабини опремени со тоалетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 Мијалници
- 3 Батериски чешми комплет со врзен материјал
- 2 туш кабини комплет со батерија и сиот потребен врзен материјал
- Довод
- Одвод
- ПВЦ цевки
- Електричен Бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW

или еквивалетни

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажаен објект минимум 3мм

3. **Изработка, транспорт и монтажа на монтажаен објект – (медицински персонал)** – клуч на рака- со димензии: должина 6000 мм – ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија) или „еквивалентно“.

Контејнерите се опремени со:

Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модуларната поставеност

- Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“
- 1 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1400мм

Изработени од еколошки видни ПАНЕЛИ (PUR) 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betонур) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 2 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци

- 1 Монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Климатизација- инвертер сплит систем 2,5KW

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект 3мм

4. **Изработка транспорт и монтажа на топла врска коридор** за поврзување на објектите оформени од модулари монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница по принципот клуч на рака.

Контејнерите се опремени со:

- Кровна конструкција (едноводен кров) – или во зависност од модулариноста поставеност - Кровни ребрасти панели (PUR) панели намалку 40мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 2 ПВЦ - врата 850мм – 2050мм исполна панел „саке“ комплет со оков и можност за заклучување
- 1 двокрилна ПВЦ врата – 2/900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков
- 13 ПВЦ - еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 (хоризонтални и вертикални) 800мм - 1000мм

Изработени од еколошки сидни ПАНЕЛИ (PUR) најмалку 40mm кои заштедуваат топлинска енергија и имаат звучна изолација, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм, тежина на полиуретанот најмалку 41 кг/м³, топлинска спроводливост најмногу 0,43 U(W/m²K) RAL 9002/9002;

Под:

- Челична конструкција 100мм x 40мм x 3мм; 100мм x 20мм x 3мм; 80мм x 50мм x 3мм; 50мм-40мм-3мм
- Цементни (Betonyr) табли 20мм
- ПВЦ под

Комплетна инсталација:

- 12 Неонски осветлувања x 18w
- 2 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- 1 Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја, конструктивен S 235JR или еквивалент, согласно MKC EN 10025-2:2009;

- Дебелина на челичната конструкција за целиот монтажен објект најмалку 3мм

Димензии на топла врска – ширина 2400мм / висина 2550мм/ должина 41000мм - апроксимативно. Поставеност на коридорот и поврзување со објектите е дадено во скица прилог на техничките спецификации.

***Начин на испорака за ДЕЛ 1 – во рок од 5-10 календарски дена од потпишување на договор.**
Дадените димензии и должини се апроксимативни и истите ќе се утврдуваат по фактичка состојба.

ДЕЛ 1.

Ред. Бр.	ОПИС	Единечна цена (денари)	Количина/ Парче	Вкупно (денари)	18% ДДВ (денари)	Вкупно без ддв	Вкупно (денари)
1	Монтажен објект-ТИП 1		4				
2	Монтажен објект - ТИП 2		2				
3	Монтажен објект медицински персонал		3				
4	Топла врска-коридор 41м		1				
ВКУПНО ЗА ПЛАЌАЊЕ						2 380 000,00	

Датум 10.04.2020

Одговорно лице

Makedonski
ki
Telekom
CA,
Aristotel
Isirov

Digitally signed
by Makedonski
Telekom CA,
Aristotel Isirov
Date:
2020.04.10
13:36:20
+02'00'

ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНАТА ПОСТАПКА

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
 MINISTRIA E SHENDETESISË

1. Договорен орган (назив и адреса): Министерство за здравство на Република Северна Македонија
 2. Евидентен број на огласот за јавна набавка (на ЕСЈН): 23-3039
 3. Предмет на јавна набавка: на монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија во Република Северна Македонија
 4. Проценета вредноста на набавката: 16.900.000,00 денари без ДДВ
 5. Вид на постапка за јавна набавка: постапка со преговарање без објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) и член 55 став 6 од Законот за јавни набавки.
 6. Постапката се спроведува како групна набавка*: не
 (*Се пополнуваат ДО кои се дел од групната набавка):
 7. Членови на комисијата за јавна набавка:

- Љупчо Балкоски (претседател)
- Вања Андонова (член)
- Сандра Веловска (член)

Заменици на Комисијата за јавни набавки во состав:

- Дамјан Христов (заменик претседател)
- Елена Иванова (заменик член)
- Јован Грповски (заменик член)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
 REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
 MINISTRIA E SHENDETESISË

Бр.-Нр. 23-3039/18

10 APR 2020 20 год.-viti
 СКОПЈЕ - SHKUP

8. Надворешни стручни лица (ДА/НЕ): да
 Мирјана Македонска претставник од Амбасадата на Швајцарија/SDC

9. Постапка за резервиран договор (ДА/НЕ): не

10. Услови за учество/ недостатоци поради кои понудите ќе се отфрлат²

По разгледување на понудите кои се предмет на евалуација комисијата утврди дека понудите на следниве понудувачи содржат недостатоци поради кои нема да се разгледуваат во понатамошната евалуација на понудите:

Ред. бр.	Понудува	Образложение за причините

11. Услови за утврдување на способност

11.1 Во согласност со член 88 од Законот за јавни набавки, Комисијата изврши проверка на причините за исклучување од постапката

Листа на понудувачи кои ќе бидат исклучени од постапката поради тоа што им е објавена негативна референца до истекот на крајниот рок за поднесување на понудите³:

Ред. бр.	Понудувач

11.2 Проверка на доставените документи за утврдување на способност

11.2.1. Понудувач⁴: Кен панел монтинг дооел Скопје

Групна понуда (ДА/НЕ) (листа на членови на група)	Подизведувачи (ДА/НЕ) (листа на подизведувачи)	Поддршка (ДА/НЕ) (листа на субјекти)
Не	Не	Не

¹ Во постапките кои се спроведуваат во повеќе фази овој образец (од точка 1 до точка 14) се однесува и на Извештај за оценување на способноста на кандидатите

² Како недостатоци се сметаат: непотпишана понуда, недоставени и/или неваидни: банкарска гаранција, изјава за сериозност и договор за поднесување на групна понуда

³ Листата на понудувачи со негативна референца е автоматски генерирана од Електронскиот Систем за јавни набавки. Проверката на негативна референца за подизведувач или субјект кој дава поддршка се врши мануелно на ЕСЈН од страна на комисијата за ЈН

⁴ Соодветните табели се повторуваат онолку пати колку што има понудувачи чии понуди се разгледуваат

Документ за утврдување на способност - изјава ⁵	Доставен и валиден (ДА/НЕ)
изјава за сериозност на понудата	Да

Причини за исклучување од постапката/документи	Доставен и валиден (ДА/НЕ)
Документ за регистрирана дејност	да

Објаснување за невалидноста на доставените документи и/или објаснување за исклучување од постапката во случаи наведени во член 88, став (2), точка (г), и/или во член 88, став (4)⁶

*Комисијата од овој понудувач побара да ги појасни/дополни документите за утврдување на способност кои не се јасни/не се комплетни, (доколку документите се комплетни и валидни наведеното се брише)

Понудувач⁷: ЈБТ Проинженеринг Валандово

Групна понуда (ДА/НЕ) (листа на членови на група)	Подизведувачи (ДА/НЕ) (листа на подизведувачи)	Поддршка (ДА/НЕ) (листа на субјекти)
Не	Не	Не

Документ за утврдување на способност - изјава ⁸	Доставен и валиден (ДА/НЕ)
изјава за сериозност на понуда	Да

Причини за исклучување од постапката/документи	Доставен и валиден (ДА/НЕ)
Документ за регистрирана дејност	Да

Објаснување за невалидноста на доставените документи и/или објаснување за исклучување од постапката во случаи наведени во член 88, став (2), точка (г), и/или во член 88, став (4)⁹

*Комисијата од овој понудувач побара да ги појасни/дополни документите за утврдување на способност кои не се јасни/не се комплетни, (доколку документите се комплетни и валидни наведеното се брише)

Понудувач¹⁰: ДПТУ Брако доо Велес

Групна понуда (ДА/НЕ) (листа на членови на група)	Подизведувачи (ДА/НЕ) (листа на подизведувачи)	Поддршка (ДА/НЕ) (листа на субјекти)
Не	Не	Не

Документ за утврдување на способност - изјава ¹¹	Доставен и валиден (ДА/НЕ)
изјава за сериозност на понуда	Да

Причини за исклучување од постапката/документи	Доставен и валиден
--	--------------------

⁵ Се пополнува во случај на докажување на способноста со изјава кај поедноставена отворена постапка

⁶ Се пополнува за секој невалиден документ или исклучување - доколку има

⁷ Соодветните табели се повторуваат онолку пати колку што има понудувачи чии понуди се разгледуваат

⁸ Се пополнува во случај на докажување на способноста со изјава кај поедноставена отворена постапка

⁹ Се пополнува за секој невалиден документ или исклучување - доколку има

¹⁰ Соодветните табели се повторуваат онолку пати колку што има понудувачи чии понуди се разгледуваат

¹¹ Се пополнува во случај на докажување на способноста со изјава кај поедноставена отворена постапка

	(ДА/НЕ)
Документ за регистрирана дејност	Да

Објаснување за невалидноста на доставените документи и/или објаснување за исклучување од постапката во случаи наведени во член 88, став (2), точка (f), и/или во член 88, став (4)¹²

--

*Комисијата од овој понудувач побара да ги појасни/дополни документите за утврдување на способност кои не се јасни/не се комплетни, (доколку документите се комплетни и валидни наведеното се брише)

Понудувач¹³: ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово

Групна понуда (ДА/НЕ) (листа на членови на група)	Подизведувачи (ДА/НЕ) (листа на подизведувачи)	Поддршка (ДА/НЕ) (листа на субјекти)
Не	Не	Не

Документ за утврдување на способност - изјава ¹⁴	Доставен и валиден (ДА/НЕ)
изјава за сериозност на понуда	Да

Причини за исклучување од постапката/документи	Доставен и валиден (ДА/НЕ)
Документ за регистрирана дејност	Да

Објаснување за невалидноста на доставените документи и/или објаснување за исклучување од постапката во случаи наведени во член 88, став (2), точка (f), и/или во член 88, став (4)¹⁵

--

*Комисијата од овој понудувач побара да ги појасни/дополни документите за утврдување на способност кои не се јасни/не се комплетни, (доколку документите се комплетни и валидни наведеното се брише)

Понудувач¹⁶: МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје

Групна понуда (ДА/НЕ) (листа на членови на група)	Подизведувачи (ДА/НЕ) (листа на подизведувачи)	Поддршка (ДА/НЕ) (листа на субјекти)
Не	Не	Не

Документ за утврдување на способност - изјава ¹⁷	Доставен и валиден (ДА/НЕ)
изјава за сериозност на понуда	Да

Причини за исклучување од постапката/документи	Доставен и валиден (ДА/НЕ)
Документ за регистрирана дејност	да

Објаснување за невалидноста на доставените документи и/или објаснување за исклучување од постапката во случаи наведени во член 88, став (2), точка (f), и/или во член 88, став (4)¹⁸

--

¹² Се пополнува за секој невалиден документ или исклучување - доколку има

¹³ Соодветните табели се повторуваат онолку пати колку што има понудувачи чии понуди се разгледуваат

¹⁴ Се пополнува во случај на докажување на способноста со изјава кај поедноставена отворена постапка

¹⁵ Се пополнува за секој невалиден документ или исклучување - доколку има

¹⁶ Соодветните табели се повторуваат онолку пати колку што има понудувачи чии понуди се разгледуваат

¹⁷ Се пополнува во случај на докажување на способноста со изјава кај поедноставена отворена постапка

¹⁸ Се пополнува за секој невалиден документ или исклучување - доколку има

*Комисијата од овој понудувач побара да ги појасни/дополни документите за утврдување на способност кои не се јасни/не се комплетни, (доколку документите се комплетни и валидни наведеното се брише)

12. Врз основа на извршената проверка на приложените документи за способност на понудувачите/кандидатите и дополнително побараните објаснувања, комисијата заклучи дека следните понудувачи/кандидати не ги доставиле потребните документи не ги исполниле условите за утврдување на способност наведени во тендерската документација и со тоа нивните понуди нема да се разгледуваат во понатамошната постапка на евалуација на понудите/до нив нема да биде доставена писмена покана за поднесување на првична понуда/понуда во следната фаза од постапката:

Ред. бр.	Понудувач/Кандидат	Образложение за неутврдување на способноста на понудувачот/кандидатот
----------	--------------------	---

13. Комисијата утврди дека понудите на следниве понудувачи се предмет на понатамошна евалуација/Комисијата ја изготви следнава листа на кандидати до кои договорниот орган ќе достави покана за поднесување на понуди во следната фаза:

Ред. бр.	Понудувач/Кандидат	Дел/делови од предметот на набавката на кој се однесува понудата/пријавата за учество
1	Кен панел монтинг довел Скопје	ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба); ДЕЛ 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

Ред. бр.	Понудувач/Кандидат	Дел/делови од предметот на набавката на кој се однесува понудата/пријавата за учество
2	ЈБТ Проинженеринг Валандово	ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба); ДЕЛ 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

Ред. бр.	Понудувач/Кандидат	Дел/делови од предметот на набавката на кој се однесува понудата/пријавата за учество
3	ДПТУ Брако доо Велес	ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба); ДЕЛ 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

Ред. бр.	Понудувач/Кандидат	Дел/делови од предметот на набавката на кој се однесува понудата/пријавата за учество
4	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска

		со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба); ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).
--	--	---

Ред. бр.	Понудувач/Кандидат	Дел/делови од предметот на набавката на кој се однесува понудата/пријавата за учество
5	МСС - Мобилен Санитарен Сервис	ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба); ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

14. Критериум за избор на најповолна понуда¹⁹

1. <input type="checkbox"/> Цена _____
--

14.1 Начин на распределба на бодовите (образложение)

--

15. Разгледување на техничките понуди на понудувачите

15.1. Комисијата ги разгледа техничките понуди на понудувачите во врска со условите и барањата од техничките спецификации.

15.2 Понудувач²⁰:

Кен панел монтаж дооел Скопје

Ред.б р.	Понудено во техничките спецификации (краток опис/марка, бренд или ознака)	Дали се исполнети условите и барањата од техничките спецификации?
	ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба); ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	ДА

ЈБТ Проинженеринг Валандово

Ред.б р.	Понудено во техничките спецификации (краток опис/марка, бренд или ознака)	Дали се исполнети условите и барањата од

¹⁹ Доколку се избрани критериумите под 2 и 3 договорниот орган задолжително ги наведува елементите со максималните бодови и го објаснува начинот на кој ќе бидат распределени бодовите

²⁰ Точка 15.2 и соодветната табела се повторуваат онолку пати колку што има понудувачи чии технички понуди се разгледуваат.

		техничките спецификации?
	<p>ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);</p> <p>ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска</p> <p>ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).</p>	ДА

ДПТУ Брако доо Велес

Ред.б р.	Понудено во техничките спецификации (краток опис/марка, бренд или ознака)	Дали се исполнети условите и барањата од техничките спецификации?
	<p>ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);</p> <p>ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска</p> <p>ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).</p>	ДА

ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово

Ред.б р.	Понудено во техничките спецификации (краток опис/марка, бренд или ознака)	Дали се исполнети условите и барањата од техничките спецификации?
	<p>ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);</p> <p>ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска</p> <p>ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).</p>	ДА

МСС - Мобилен Санитарен Сервис

Ред.б р.	Понудено во техничките спецификации (краток опис/марка, бренд или ознака)	Дали се исполнети условите и барањата од техничките спецификации?
	<p>ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);</p> <p>ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска</p>	ДА

ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	
--	--

15.3 Врз основа на проверка на приложените технички понуди, комисијата заклучи дека понудите на следниве понудувачи не се во согласност со дефинираните технички карактеристики на предметот на јавна набавка, барањата и условите од техничките спецификации, како и во однос на условите за извршување или функционални карактеристики на предметот на јавна набавка наведени во тендерската документација, и со тоа нивните понуди нема да се разгледуваат во понатамошната постапка на евалуација на понудите:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за неприфатливоста на техничката понуда или дел од предметот на јавна набавка
----------	-----------	--

16. Разгледување на финансиските понуди на понудувачите

16.1 Комисијата ги разгледа следниве финансиски понуди поднесени од понудувачите во врска со цената, соодветните финансиски и други услови утврдени со тендерската документација:

16.2 Дел од предметот на јавна набавка²¹:

ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)

Понудувач	Понудена цена	Цена по извршени исправки на аритметички грешки	Цена со даден попуст	Други финансиски услови
Кен панел монтинг дооед Скопје	4.387.410,17			
ЈБТ Проинженеринг Валандово	4.258.875,00			
ДПТУ Брако доо Велес	2.910.451,00			
ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	4.163.000,00			
МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооед Скопје	10.620.000,00			

ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП 1; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)

Понудувач	Понудена цена	Цена по извршени исправки на аритметички грешки	Цена со даден попуст	Други финансиски услови
Кен панел монтинг дооед Скопје	10.549.340,67			
ЈБТ Проинженеринг Валандово	11.485.125,00			
ДПТУ Брако доо Велес	8.248.240,00			
ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	10.311.000,00			
МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооед Скопје	31.554.000,00			

ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

²¹ Точка 16.2 и соодветната табела се повторуваат онолку пати колку што има делови со понудувачи чии финансиски понуди се разгледуваат.

Понудувач	Понудена цена	Цена по извршени исправки на аритметички грешки	Цена со даден попуст	Други финансиски услови
Кен панел монтинг дооел Скопје	1.611.300,00			
ЈБТ Проинженеринг Валандово	922.500,00			
ДПТУ Брако доо Велес	987.200,00			
ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	922.500,00			
МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	3.600.000,00			

16.3 Врз основа на проверка на приложените финансиски понуди во поглед на цената, соодветните финансиски и други услови од понудата, комисијата утврди дека следниве понуди се неприфатливи:

Ред. бр.	Понудувач	Образложение за неприфатливоста на финансиската понуда или дел од предметот на јавна набавка

17. По целосна евалуација на способноста и на првичните понуди на понудувачите, комисијата предлага следниве понудувачи да се поканат да учествуваат во електронската аукција (доколку како крајна фаза се спроведува електронска аукција)

17.1 Дел од предметот на јавна набавка²²:

ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)

Понудувач	Почетна цена	Почетен ранг
Кен панел монтинг дооел Скопје	4.387.410,17	4
ЈБТ Проинженеринг Валандово	4.258.875,00	3
ДПТУ Брако доо Велес	2.910.451,00	1
ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	4.163.000,00	2
МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	10.620.000,00	5

ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)

Понудувач	Почетна цена	Почетен ранг
Кен панел монтинг дооел Скопје	10.549.340,67	3
ЈБТ Проинженеринг Валандово	11.485.125,00	4
ДПТУ Брако доо Велес	8.248.240,00	1
ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	10.311.000,00	2
МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	31.554.000,00	5

ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

Понудувач	Почетна цена	Почетен ранг
Кен панел монтинг дооел Скопје	1.611.300,00	3
ЈБТ Проинженеринг Валандово	922.500,00	1
ДПТУ Брако доо Велес	987.200,00	2
ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	922.500,00	1

²² Точка 17.1 и соодветната табела се повторуваат онолку пати колку што има делови од предметот на јавна набавка кои се евалуирани.

МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	3.600.000,00	4
--	--------------	---

18. Конечено бодување и рангирање на понудите по извршени преговори

18.1. Дел од предметот на јавна набавка²³:

ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)

Ред. бр.	Понудувач	Критериум	Вкупно
1	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	Цена	2.380.000,00
2	ДПТУ Брако доо Велес	Цена	2.910.451,00
3	ЈБТ Проинженеринг Валандово	Цена	4.258.875,00
4	Кен панел монтинг дооел Скопје	Цена	4.387.410,17
5	МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	Цена	10.620.000,00

ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП 1; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)

Ред. бр.	Понудувач	Критериум	Вкупно
1	ДПТУ Брако доо Велес	Цена	7.827.000,00
2	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	Цена	10.311.000,00
3	Кен панел монтинг дооел Скопје	Цена	10.549.340,67
4	ЈБТ Проинженеринг Валандово	Цена	11.485.125,00
5	МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	Цена	31.554.000,00

ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

Ред. бр.	Понудувач	Критериум	Вкупно
1	ДПТУ Брако доо Велес	Цена	921.000,00
2	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	Цена	922.500,00
3	ЈБТ Проинженеринг Валандово	Цена	922.500,00
4	Кен панел монтинг дооел Скопје	Цена	1.611.300,00
5	МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	Цена	3.600.000,00

19. Предлог за избор на најповолна понуда/Предлог за поништување на постапката

19.1 Комисијата согласно член 49, став (4) побара доставување на документите за утврдување способност:²⁴

Ред. бр.	Понудувач	Документи за докажување на способност Валидни (ДА/НЕ) Објаснување за невалидноста на доставени документи

19.2 Врз основа на извршеното конечно бодување и рангирање на понудите, комисијата го доставува следниов предлог за избор на најповолна понуда:



²³ Точка 18.1 и соодветната табела се повторуваат онолку пати колку што има делови од предметот на јавна набавка кои се евалуирани.

²⁴ Се пополнува во случај на поедноставена одговорена постапка

Дел/делови	Понудувач	Вкупно без ддв
ДЕЛ 1 Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	2.380.000,00
ДЕЛ 2 Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	ДПТУ Брако доо Велес	7.827.000,00
ДЕЛ 3 Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	ДПТУ Брако доо Велес	921.000,00

20. Комисијата согласно член 101, став (9) дава предлог за издавање на негативна референца на понудувачот/ите:

21. Комисија за јавни набавки

	СОСТАВ	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	ПОТПИС
1	Претседател (или заменик)	Љупчо Балкоски	
2	Член	Вања Андонова	
3	Член	Сандра Веловска	

ПРИЛОГ А – ИЗЈАВА ЗА СЕРИОЗНОСТ НА ПОНУДАТА

1. Проверка на доставени Изјави за сериозност на понудата

Ред. бр.	Понудувач	Доставена и валидна изјава (ДА/НЕ) Објаснување за невалидноста
1	Кен панел монтинг дооел Скопје	ДА
2	ЈБТ Проинженеринг Валандово	ДА
3	ДПТУ Брако доо Велес	ДА
4	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	Да
5	МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	Да

2. Проверка на доставени Банкарски гаранции

Проверка на исполнетоста на условот за доставување банкарска гаранција на понудата							
Ред. бр.	Понудувач	Барана вредност на банкарската гаранција во тендерската документација		Доставена банкарска гаранција	Банка која ја издава банкарската гаранција	Вредност на доставената банкарска гаранција	Дали вредноста на доставената банкарска гаранција е во рамки на бараното
		Процент	Износ				

ПРИЛОГ Д- ФАЗА НА ПРЕГОВАРАЊЕ ВО ПОСТАПКА СО ПРЕГОВАРАЊЕ БЕЗ ПРЕТХОДНО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС

1. Постапката се спроведува по добиено мислење од Бирото за јавни набавки²⁵: НЕ

2. Во фазата на преговарање учествуваат следниве кандидати:

Ред. бр.	Кандидати	Број на одржани состаноци
1	Кен панел монтинг дооел Скопје	1 (еден)
2	ЈБТ Проинженеринг Валандово	1 (еден)
3	ДПТУ Брако доо Велес	1 (еден)
4	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	1 (еден)
5	МСС - Мобилен Санитарен Сервис дооел Скопје	1 (еден)

3. Број на спроведени последователни фази на преговори²⁶:

4. Записниците од водените преговори со секој од избраните кандидати се дадени во прилог на извештајот и се негов составен дел.

5. Врз основа на водените преговори со избраните кандидати во фазата на преговарање видно од записниците истите изјавија дека нивната првична понуда не може повеќе да се подобри. Договорниот орган по извршената евалуација на најповолната техничка и финансиска понуда ќе побара од кандидатот кој понудил најповолни услови во текот на преговорите и чија што понуда е најдобро рангирана, резултатот од преговорите да го потврди со поднесување на конечна понуда која е дадена во прилог.

²⁵ Се пополнува доколку постапката се спроведува по соодветен основ од Законот за јавни набавки

²⁶ Се пополнува во случај на конкурентна постапка со преговарање

ПРИЛОГ 3

Извештај на надворешните стручни лица ангажирани во работата на комисијата во врска со техничките, финансиските и другите работи при евалуација на понудите

1. Договорен орган (назив и адреса): Министерство за здравство на Република Северна Македонија

2. Евидентен број на огласот за јавна набавка (на ЕСЈН): 23-3039

3. Предмет на јавна набавка: на монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија во Република Северна Македонија

4. Проценета вредноста на набавката: 16.900.000,00 денари без ДДВ

5. Вид на постапка за јавна набавка: постапка со преговарање без објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) и член 55 став 6 од Законот за јавни набавки.

6. Постапката се спроведува како групна набавка*:не
(*Се пополнуваат ДО кои се дел од групната набавка):

7. Членови на комисијата за јавна набавка:

- Љупчо Балкоски (претседател)
- Вања Андонова (член)
- Сандра Веловска (член)

Заменици на Комисијата за јавни набавки во состав:

- Дамјан Христов (заменик претседател)
- Елена Иванова (заменик член)
- Јован Грповски (заменик член)

8. Надворешни стручни лица (ДА/НЕ): да
Мирјана Македонска претставник од Амбасадата на Швајцарија/SDC

9. Постапка за резервиран договор (ДА/НЕ):не

Сите доставени валидни понуди за ДЕЛ 1, ДЕЛ 2 и ДЕЛ 3 се разгледани и истите одговараат на потребите на Клиниката.

Потпис на надворешниот член на комисијата

..... Мирјана Македонска

.....



Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/00, 44/02 и 82/08) и член 112 и член 114 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2019), Министерот за здравство, донесе:

О Д Л У К А
за доделување на договор за јавна набавка/поништување на дел

Министерство за здравство на Република Северна Македонија Скопје, отпочна постапка за набавка со преговарање без објавување на оглас согласно со член 55 став 1 точка г) и член 55 став 6 од Законот за јавни набавки, број 23-3039, со предмет на набавка **монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем за справување со состојбата од настаната епидемија**, согласно тендерската спецификација и спроведено преговарање

1. За најповолна понуда во Постапката на јавната набавка **монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем за справување со состојбата од настаната епидемија** број 23-3039, за доделување на договор за јавна набавка се избираат понудите:

Дел/делови	Понудувач	Вкупно без ддв
ДЕЛ 1 Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	2.380.000,00
ДЕЛ 2 Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП 1; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)	ДПТУ Брако доо Велес	7.827.000,00
ДЕЛ 3 Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	ДПТУ Брако доо Велес	921.000,00



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Договорниот орган во оваа постапка согласно со огласот и тендерската документација има предвидено Изјава за сериозност на понудата. Договорниот орган ја активира изјавата за сериозност на понудата ако понудувачот:

- ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност,
- не ја прифати исправката на аритметичките грешки од страна на комисијата,
- не го потпише договорот за јавна набавка согласно со условите од тендерската документација и доставената понуда или
- не ја обезбеди гаранцијата за квалитетно извршување на договорот, ако договорниот орган ја предвидел во тендерската документација.

Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Врз основа на член 77 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РСМ" бр. 24/2019) Министерството за здравство на РСМ – Скопје, преку Комисијата за јавни набавки формирана со Одлука за јавна набавка бр. 23-3039/2 од 07/04/2020 година спроведе постапка за јавна набавка на: **монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем за справување со состојбата од настаната епидемија**. Износот на средствата од потребни за реализација на набавката се обезбедени од донациската сметка на Министерството за здравство, а во согласност со Извадокот од Нацрт-записникот на Триесет и шестата седница на Влада на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година.

Согласно со член 55 став 1 точка г) и член 55 став 6 од Законот за јавни набавки се спроведе со постапка со преговарање без објавување на оглас.

По спроведување на поканата за спроведување на постапка број 23-3039, Комисијата за јавни набавки изврши отварање на пристигнатите понуди на ден 10/04/2020 година во 11.00 часот со користење на електронски средства и во просториите на Министерството за здравство на Република Северна Македонија, на која со свои понуди учествуваа следните економски оператори:

РБ	Понудувач
1	Кен панел монтинг доел Скопје
2	ЈБТ Проинженеринг Валандово
3	ДПТУ Брако доо Велес
4	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово
5	МСС - Мобилен Санитарен Сервис доел Скопје



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

За начинот на работата и постапката спроведена од Комисијата за јавни набавки за наведената постапка состави Записник од јавното отварање на понудите .

По целосната проверка на документацијата, а согласно утврдените критериуми за избор на најповолен понудувач, Комисијата за јавни набавки изготви и до Министерот достави Извештај од спроведена постапка, со кој предлага Министерот на Министерство за здравство на РСМ – Скопје како овластен да донесе Одлука за избор на најповолен понудувач согласно член 112 од законот за понудите кои во целост ги исполниле условите од огласот (тендерската документација) и неизбор согласно член 114 за останатите понуди, за што го дава и следното образложение.

Имајќи го во предвид горенаведеното, а по оцена на сите факти и докази приложени кон списите на предметот, а особено предлогот на Комисијата за јавни набавки, се одлучи како во диспозитивот на оваа долука.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Против ова Решение незадоволниот понудувач има право да поднесе жалба согласно Законот за јавни набавки. Жалбата се поднесува лично или по препорачана пошта истовремено до Договорниот орган и до Државната комисија за жалби по јавни набавки, согласно Законот за јавни набавки.

Одговорно лице

Министер

Доц. Д-р Венко Филипче



Изработиле:

Тања Пехчевска

Вања Андонова

ДОГОВОР

за набавка на работи - монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија во Република Северна Македонија

Склучен во Скопје, помеѓу:

1. Министерство за здравство, со седиште на ул. Водњанска бб Скопје, со ЕМБС 4219759 и ЕДБ 4030990253804, застапувано од Министерот за здравство Доц.др Венко Филипче (во понатамошниот текст: Договорен орган) од една страна, и

2. ДПТУ БРАКО ДОО, со седиште на ул. Раштански пат бр. 2, 1400 Велес, со ЕДБ МК 4004003114759 и ЕМБС5789885, претставуван од Управител Благој Шалев (во понатамошниот текст: Носител на набавката) од друга страна.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е регулирање на правата и обврските помеѓу договорните страни во врска со набавка на работи - монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија во Република Северна Македонија објавена со постапка со преговарање без објавување на оглас од причини од крајна итност - член 55 став (б), согласно дел 2 и дел 3 од техничка спецификација и листа на единечни цени дадена во прилог на овој договор (во понатамошниот текст: работи).

Предметот на овој договор е по спроведена постапка за доделување на договор за работи а во согласност со прифатена понуда на Носителот на набавката и во согласност со техничката спецификацијата и листата на единечни цени, кои се составен дел од овој Договор.

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација и листата на единечни цени.

Член 2

Работите кои се предмет на овој договорот ги вклучува сите работи кои се наведени во дел 2 и дел 3 од техничките спецификации (Прилог 1), а кои се составен дел од овој договор.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вредноста на овој договор поединечно за дел 2 и дел 3 од набавката изнесува:

Дел/делови	Понудувач	Вкупно без ддв
ДЕЛ 2 Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12	ДПТУ Брако доо Велес	7.827.000,00

монтажни единици (сместувачки) формиран од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ;1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)		
ДЕЛ 3 Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).	ДПТУ Брако доо Велес	921.000,00

Вкупната вредноста на овој договор за дел 2 и дел 3 од набавката без пресметан ДДВ изнесува 8.748.000,00 (осум милиони седумсто четириесет и осум илјади) денари.

На вредноста на овој договор не се пресметува ДДВ, бидејќи средствата се обезбедени од проект ослободен од ДДВ за што ќе биде приложена дополнителна документација.

Цената е постигната како резултат од добиена конечна понуда на ден 10.04.2020 година.

НАЧИН, МЕСТО И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 4

Носителот на набавката е должен работите од дел 2 и дел 3 да ги изврши најдоцна во рок од 20 (давесет) календарски денови, а рокот за изведба тече од наредниот календарски ден од денот на склучување на договор и тоа во согласност со техничката спецификација (Прилог 2).

Доколку Носителот на набавката не го изврши работите во дадениот рок и со тоа ја прекрши изјавата за сериозност на понудата, договорниот орган во ЕСЈН ќе објави негативна референца што резултира со исклучување на Носителот на набавката од сите идни постапки за јавни набавки во период од шест месеци од денот на објавувањето.

Ако Договорниот орган има оправдано сомнение дека работите нема да бидат изведени во рокот, има право да побара од Носителот на набавката да превземе соодветни мерки и работи кои не се наведени во техничката спецификација.

Носителот на набавката се обврзува по налог на Договорниот орган да изврши монтажа и транспорт на предметот на набавката на локација предвидена во налогот и истата услуга е пресметана во понудата на Носителот на набавката.

Носителот на набавката е должен предметот на договорот односно работите да ги започне на следниов начин така што да започне со изведба наредниот календарски ден по склучување на договорот. Носителот на набавката е должен да ги извршува работите согласно техничката спецификација.

Договорот за јавна набавка на работи односно предметот на набавката се склучува на износ на проценетата вредност согласно член 3 од договорот на јавната набавка добиена по конечно поднесување на понуда.

Цените се задолжителни и не може да се менуваат во периодот на важност на овој Договор.

Член 5

Договорот се смета за реализиран со реализирање на работите предвидени во техничката спецификација.

НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Носителот на набавката се обврзува да пристапи кон извршување на работите. Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го извршува стручно, професионално и навремено, во согласност со потребите Планот на динамика (Прилог 2).

Во случај на некавалитетно и несоодветно извршување на работите, Договорниот орган има право со претходно писмено известување да го раскине договорот.

Начин на плаќање е по уредно доставена одобрена фактура со прилог на уредно пополнет и потпишана записник за примопредавање во рок кој не може да биде пократок од законски определениот рок за плаќање фактури односно 30 (триесет) дена.

Фактурата и записникот за примопредавање се доставува до Архивата на Договорниот орган.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

Член 7

Носителот на набавката е должен да го извршува предметот на договорот, согласно техничката спецификација со листа на единечни цени за секоја работа утврдена во членот 2, како и согласно начинот и рокот согласно јавната набавка и согласно укажувањата од договорниот орган доколку ги има.

Член 8

Како релевантен доказ за извршената работа е уредно доставен записник за примопредавање и истиот треба да биде пополнета во два примероци и потпишан од овластените лица на двете договорни страни.

Член 9

Договорниот орган е должен плаќањето за извршената работа предмет на овој договор да го изврши согласно начинот и рокот утврдени во член 6 од договорот.

Член 10

Договорниот орган има право да му укаже на Носителот на набавката доколку има забелешки на начинот на извршување на предмет на договорот, а Носителот на набавката е должен веднаш на лице место да постапи по истите, без право на посебен надоместок.

КВАНТИТАТИВНА И КВАЛИТАТИВНА КОНТРОЛА

Член 11

Носителот на набавката е должен да ги изврши работите кои се предмет на набавката квалитетно и навремено без одлагање, согласно барањата на договорниот орган и планот за динамика (Прилог 2).

Носителот на набавката е потребно да назначи раководител на проектот односно техничко лице кој ќе биде достапен на Договорниот орган.

Член 12

Во текот на извршувањето на работите, од страна на овластените лица определен од Договорниот орган, се проверуваат карактеристиките и квалитетот на работите, односно дали истите соодветствуваат со договорените карактеристики и квалитет утврдени со техничките спецификации и понудата на Носителот на набавката.

Договорниот орган има право, веднаш да го известува Носителот на набавката доколку постојат недостатоци при извршувањето на работите.

Примопредавање

Член 13

По завршувањето на работите, договорните страни ќе состават Записник за примопредавање на работите во кој се констатира дали работите се извршени согласно техничките спецификации. Записникот ќе биде потпишан од страна на овалстените лица за надзор од страна на Договорниот орган и техничкото лице назначено од страна на Носителот на набавката.

Доколку овалстените лица од Договорниот орган констатираат дека некои од работите не се извршени или монтирани согласно техничките спецификации, Носителот на набавката ќе треба да ги доработи на свој трошок, во спротивно ќе бидат активирани калузулите за издавање на негативна референца, договорна казна и надомест на штета.

ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Член 14

Договорните страни се должни да ги исполнат обврските кои произлегуваат од овој договор.

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни обврската или ќе задоцни со нејзиното исполнување, другата договорна страна има право да бара и надомест на штетата што ја претрпел поради тоа.

Одговорноста на Носителот на набавката за штетат направена со намера или крајно невнимание не може да се исклучи.

Во случај на измама или намерно неисполнување, како и неисполнување поради крајно невнимание, Договорниот орган има право да бара од Носителот на набавката надомест на целокупната штета што настанала поради повреда на договорот, без оглед на тоа што Носителот на набавката не знаел за посебните околности поради кои настанале тие.

ВИША СИЛА

Член 15

Договорниот орган и носителот на набавката се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој договор коишто се предизвикани од виша сила.

Во случај на настапување на виша сила договорните страни ќе договорат нови услови за негово исполнување или ќе го раскинат договорот.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 16

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине Договорот.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 17

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на извршувањето на овој договор.

СОПСТВЕНОСТ НА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКАТА

Член 18

По престанување на потребата на Министерството за Здравство за надминување на состојбата со Ковид 19 во Република Северна Македонија, сопственоста на предметот на набавката ќе биде регулиран согласно Извадокот од Нацрт-записникот на Триесет и шестата седница на Влада на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020

година, а за истото до Владата на Република Северна Македонија ќе се достави Информација во која ќе се утврдат актуелните потреби на сите страни вклучително и донаторот, а во согласност со позитивната законска регулатива на Република Северна Македонија.

ДОГОВОРНА КАЗНА

Член 19

Договорниот орган има право на договорна казна во износ од 0,5% дневно, но не повеќе од 20% од вкупната вредност на договорот доколку Носителот на набавката доцни со исполнување на обврските или неуредно ги исполнува обврските од договорот, согласно роковите и условите утврдени во истиот.

Договорната казна ќе се пресметува од моментот на настанување на условите предвидени со ставот 1 на овој член за што Договорниот орган веднаш писмено ќе го извести Носителот на набавката.

Во случај на доцнење, Носителот на набавката се обврзува покрај договорната казна да ја надомести и штетата на Договорниот орган, настаната поради доцнење или неуредно исполнување.

Договорниот орган има право да бара договорна казна и кога нејзиниот износ ја надминува висината на штетата што ја претрпел, како и кога не претрпел никаква штета. Ако штетата што ја претрпел Нарачателот е поголема од износот на договорната казна, тој има право да бара разлика до целосниот надомест на штетата.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 20

За се што не е предвидено со овој договор важат позитивните законски норми.

Член 21

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои договорните страни не би можеле да ги решат спогодбено ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

Член 22

Можните измени настанати по потпишување на овој договор, договорните страни ќе ги договорат спогодбено и писмено ќе ги приклучат кон овој договор со анекси.

Член 23

Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување.

Член 24

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

Прилози:

Прилог 1 – Техничка спецификација

Прилог 2 – План на динамика

ДОГОВОРЕН ОРГАН
Министерство за здравство
Министер

Доц. Др. Венко Филипче

НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА
ДПТУ БРАКО ДОО
Управител

Благој Шалев

ДОГОВОР

за набавка на работи - монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија во Република Северна Македонија

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Бр.-Нр. 23-3039/26

Склучен во Скопје, помеѓу:

13/04/ 2020 год.-viti

1. Министерство за здравство, со седиште на ул. Водњанска бб Скопје, со ЕМБС 4219759 и ЕДБ 4030990253804, застапувано од Министерот за здравство Доц.др Венко Филипче (во понатамошниот текст: Договорен орган) од една страна, и
2. Друштво за производство градежништво трговија и услуги ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ увоз-извоз Валандово, со седиште на ул. Маршал Тито бб Валандово, со ЕДБ 4003006105207 и ЕМБС 6101577, претставуван од Управител Аристотел Исиров (во понатамошниот текст: Носител на набавката) од друга страна.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е регулирање на правата и обврските помеѓу договорните страни во врска со набавка на работи - монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија во Република Северна Македонија објавена со постапка со преговарање без објавување на оглас од причини од крајна итност - член 55 став (б), согласно дел 1 од техничка спецификација и листа на единечни цени дадена во прилог на овој договор (во понатамошниот текст: работи).

Предметот на овој договор е по спроведена постапка за доделување на договор за работи а во согласност со прифатена понуда на Носителот на набавката и во согласност со техничката спецификацијата и листата на единечни цени, кои се составен дел од овој Договор.

Детален опис на предметот на договорот е даден во техничката спецификација и листата на единечни цени.

Член 2

Работите кои се предмет на овој договорот ги вклучува сите работи кои се наведени во дел 1 од техничките спецификации (Прилог 1), а кои се составен дел од овој договор.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вредноста на овој договор поединечно за дел 1 од набавката изнесува:

Дел/делови	Понудувач	Вкупно без ддв
ДЕЛ 1 Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	2.380.000,00

Вкупната вредноста на овој договор за дел 1 од набавката без пресметан ДДВ изнесува 2.380.000,00 (два милиони триста и осумдесет илјади) денари.

На вредноста на овој договор не се пресметува ДДВ, бидејќи средствата се обезбедени од проект ослободен од ДДВ за што ќе биде приложена дополнителна документација.

Цената е постигната како резултат од добиена конечна понуда на ден 10.04.2020 година.

НАЧИН, МЕСТО И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 4

Носителот на набавката е должен работите од дел 2 и дел 3 да ги изврши најдоцна во рок од 20 (давесет) календарски денови, а рокот за изведба тече од наредниот календарски ден од денот на склучување на договор и тоа во согласност со техничката спецификација (Прилог 2).

Доколку Носителот на набавката не го изврши работите во дадениот рок и со тоа ја прекрши изјавата за сериозност на понудата, договорниот орган во ЕСЈН ќе објави негативна референца што резултира со исклучување на Носителот на набавката од сите идни постапки за јавни набавки во период од шест месеци од денот на објавувањето.

Ако Договорниот орган има оправдано сомнение дека работите нема да бидат изведени во рокот, има право да побара од Носителот на набавката да превземе соодветни мерки и работи кои не се наведени во техничката спецификација.

Носителот на набавката се обврзува по налог на Договорниот орган да изврши монтажа, демонтажа и транспорт на предметот на набавката на локација предвидена во налогот и истата услуга е пресметана во понудата на Носителот на набавката.

Носителот на набавката е должен предметот на договорот односно работите да ги започне на следниов начин така што да започне со изведба наредниот календарски ден по склучување на договорот. Носителот на набавката е должен да ги извршува работите согласно техничката спецификација.

Договорот за јавна набавка на работи односно предметот на набавката се склучува на износ на проценетата вредност согласно член 3 од договорот на јавната набавка добиена по конечно поднесување на понуда.

Цените се задолжителни и не може да се менуваат во периодот на важност на овој Договор.

Член 5

Договорот се смета за реализиран со реализирање на работите предвидени во техничката спецификација.

НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 6

Носителот на набавката се обврзува да пристапи кон извршување на работите. Носителот на набавката е должен предметот на набавката да го извршува стручно, професионално и навремено, во согласност со потребите Планот на динамика (Прилог 2).

Во случај на некавалитетно и несоодветно извршување на работите, Договорниот орган има право со претходно писмено известување да го раскине договорот.

Начин на плаќање е по уредно доставена одобрена фактура со прилог на уредно пополнет и потпишана записник за примопредавање во рок кој не може да биде пократок од законски определениот рок за плаќање фактури односно 30 (триесет) дена.

Фактурата и записникот за примопредавање се доставува до Архивата на Договорниот орган.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

Член 7

Носителот на набавката е должен да го извршува предметот на договорот, согласно техничката спецификација со листа на единечни цени за секоја работа утврдена во членот 2, како и согласно начинот и рокот согласно јавната набавка и согласно укажувањата од договорниот орган доколку ги има.

Член 8

Како релевантен доказ за извршената работа е уредно доставен записник за примопредавање и истиот треба да биде пополнета во два примероци и потпишан од овластените лица на двете договорни страни.

Член 9

Договорниот орган е должен плаќањето за извршената работа предмет на овој договор да го изврши согласно начинот и рокот утврдени во член 6 од договорот.

Член 10

Договорниот орган има право да му укаже на Носителот на набавката доколку има забелешки на начинот на извршување на предмет на договорот, а Носителот на набавката е должен веднаш на лице место да постапи по истите, без право на посебен надоместок.

КВАНТИТАТИВНА И КВАЛИТАТИВНА КОНТРОЛА

Член 11

Носителот на набавката е должен да ги изврши работите кои се предмет на набавката квалитетно и навремено без одлагање, согласно барањата на договорниот орган и планот за динамика (Прилог 2).

Носителот на набавката е потребно да назначи раководител на проектот односно техничко лице кој ќе биде достапен на Договорниот орган.

Член 12

Во текот на извршувањето на работите, од страна на овалстените лица определен од Договорниот орган, се проверуваат карактеристиките и квалитетот на работите, односно дали истите соодветствуваат со договорените карактеристики и квалитет утврдени со техничките спецификации и понудата на Носителот на набавката.

Договорниот орган има право, веднаш да го извести Носителот на набавката доколку постојат недостатоци при извршувањето на работите.

Примопредавање

Член 13

По завршувањето на работите, договорните страни ќе состават Записник за примопредавање на работите во кој се констатира дали работите се извршени согласно техничките спецификации. Записникот ќе биде потпишан од страна на овалстените лица за надзор од страна на Договорниот орган и техничкото лице назначено од страна на Носителот на набавката.

Доколку овалстените лица од Договорниот орган констатираат дека некои од работите не се извршени или монтирани согласно техничките спецификации, Носителот на набавката ќе треба да ги доработи на свој трошок, во спротивно ќе бидат активирани калузулите за издавање на негативна референца, договорна казна и надомест на штета.

ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Член 14

Договорните страни се должни да ги исполнат обврските кои произлегуваат од овој договор.

Кога една од договорните страни не ќе ја исполни обврската или ќе задоцни со нејзиното исполнување, другата договорна страна има право да бара и надомест на штетата што ја претрпел поради тоа.

Одговорноста на Носителот на набавката за штетат направена со намера или крајно невнимание не може да се исклучи.

Во случај на измама или намерно неисполнување, како и неисполнување поради крајно невнимание, Договорниот орган има право да бара од Носителот на набавката надомест на целокупната штета што настанала поради повреда на договорот, без оглед на тоа што Носителот на набавката не знаел за посебните околности поради кои настанале тие.

ВИША СИЛА

Член 15

Договорниот орган и носителот на набавката се согласни ниту една договорна страна да не биде одговорна кон друга за губиток, повреда или неизвршување на одредбите од овој договор коишто се предизвикани од виша сила.

Во случај на настапување на виша сила договорните страни ќе договорат нови услови за негово исполнување или ќе го раскинат договорот.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 16

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине Договорот.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Член 17

Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на извршувањето на овој договор.

СОПСТВЕНОСТ НА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКАТА

Член 18

По престанување на потребата на Министерството за Здравство за надминување на состојбата со Ковид 19 во Република Северна Македонија, сопственоста на предметот на набавката ќе биде регулиран согласно Извадокот од Нацрт-записникот на Триесет и шестата седница на Влада на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година, а за истото до Владата на Република Северна Македонија ќе се достави Информација во која ќе се утврдат актуелните потреби на сите страни вклучително и донаторот, а во согласност со позитивната законска регулатива на Република Северна Македонија.

ДОГОВОРНА КАЗНА

Член 19

Договорниот орган има право на договорна казна во износ од 0,5% дневно, но не повеќе од 20% од вкупната вредност на договорот доколку Носителот на набавката доцни со исполнување на обврските или неуредно ги исполнува обврските од договорот, согласно роковите и условите утврдени во истиот.

Договорната казна ќе се пресметува од моментот на настанување на условите предвидени со ставот 1 на овој член за што Договорниот орган веднаш писмено ќе го извести Носителот на набавката.

Во случај на доцнење, Носителот на набавката се обврзува покрај договорната казна да ја надомести и штетата на Договорниот орган, настаната поради доцнење или неуредно исполнување.

Договорниот има право да бара договорна казна и кога нејзиниот износ ја надминува висината на штетата што ја претрпел, како и кога не претрпел никаква штета. Ако штетата што ја претрпел Нарачателот е поголема од износот на договорната казна, тој има право да бара разлика до целосниот надомест на штетата.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 20

За се што не е предвидено со овој договор важат позитивните законски норми.

Член 21

Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои договорните страни не би можеле да ги решат спогодбено ќе ги решава надлежниот суд во Скопје.

Член 22

Можните измени настанати по потпишување на овој договор, договорните страни ќе ги договорат спогодбено и писмено ќе ги приклучат кон овој договор со анекси.

Член 23

Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување.

Член 24

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои 2 (два) за Договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.

Прилози:

Прилог 1 – Техничка спецификација

Прилог 2 – План на динамика

ДОГОВОРЕН ОРГАН
Министерство за здравство
Министер

Доц. Др. Венко Филипче



НОСИТЕЛ НА НАБАВКАТА
ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ
Управител

Аристотел Исиров



ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за здравство**

I.1.2) Адреса: **Ул. 50-та Девизија бр.14**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Тања Пехчевска**, адреса на е-пошта: **tanja.pehcevska@zdravstvo.gov.mk**
телефон/факс: **071 387-196/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија, а во согласност со Извадок од Нацрт-записникот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година, („Точка 10“).

II.2) Дали договорот е поврзан со кризна состојба? **Да**
Кризна состојба : **Covid - 19**

II.3) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Реализирање, со какви било средства, утврдени од договорниот орган**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Министерство за здравство на РСМ - Клинички центар Мајка Тереза во непосредна близина на ЈЗУ У Клиника за инфективни и фебрилни состојби Скопје

II.4) Секторски договор **Не**

II.5) Централно тело **Не**

II.6) Групна набавка **Не**

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
45000000-7	Градежни работи

II.9) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: **Сите делови**

Дел број	Опис на делот за набавка
2	ДЕЛ: 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)
3	ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

П.10) Времетраење на договорот:

Или се планира да започне **13.04.2020**
се планира да заврши **13.08.2020**

П.11) Динамичен систем **Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
доколку поради крајна итност, предизвикана како резултат на настани кои договорниот орган не можел да ги предвиди, роковите за другите постапки не може да се применат

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување
Согласно одлуките на Влада на Република Северна Македонија за мерки и препораки за заштита и превенција од Коронавирус ЦОВИД-19, а поради зголемување на бројот на заболени лица се јавува потреба од предвидување на нови болнички капацитети за згрижување на заболените лица.
Министерството за здравство има потреба од набавка – прибирање на понуди за монтажни објекти – контејнери, кои ќе се поставуваат во непосредна близина на ЈЗУ Универзитеска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби при Универзитетскиот Клинички комплекс „Мајка Тереза“ во Скопје. За таа цел, планирана е лесна, брза и монтажна изградба на медицински капацитети – болничко сместување со просторија за медицински персонал и за згрижување на пациенти со медицински третман на заболени од Коронавирус ЦОВИД-19. Постапката е делива по делови кои се составени од веќе наведените елементи согласно итните потреби за ставање во функција на монтажната болница, а поради итната потреба од зголемување на болничките капацитети за лекување на пациенти кои се заболени со Коронавирус ЦОВИД -19.

III.2) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.3) Меѓународна објава: **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **13.04.2020**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **23-3039/25**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **5**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес**

Адреса на носителот на набавката: **РАШТАНСКИ ПАТ 2**

Град или населено место: **ВЕЛЕС**

Држава: **Република Македонија**

IV.2.1) Групна понуда **Не**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на набавката со ДДВ **16.900.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор без вклучен ДДВ **8.748.000,00**

IV.3.3) ДДВ: **0%**

IV.3.4) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **8.748.000,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **18.05.2020**

ДОКУМЕНТИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на постапка на која се однесува известувањето **05-2020-50100**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за здравство**

I.1.2) Адреса: **Ул. 50-та Девизија бр.14**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Тања Пехчевска**, адреса на е-пошта: **tanja.pehcevska@zdravstvo.gov.mk**
телефон/факс: **071 387-196/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија, а во согласност со Извадок од Нацрт-записникот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година, („Точка 10“).

II.2) Дали договорот е поврзан со кризна состојба? **Да**
Кризна состојба : **Covid - 19**

II.3) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Министерство за здравство на РСМ - Клинички центар Мајка Тереза во непосредна близина на ЈЗУ У Клиника за инфективни и фебрилни состојби Скопје

II.4) Секторски договор **Не**

II.5) Централно тело **Не**

II.6) Групна набавка **Не**

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: **Не**

II.9) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: **Сите делови**

Дел број	Опис на делот за набавка
2	ДЕЛ 2. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: 12 монтажни единици (сместувачки) формирани од по три контејнери или „евивалентно“; вкупно 4 тоалети ТИП ; 1 – ходник со апроксимативна должина од 42 м и „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба)
3	ДЕЛ 3. Набавка/Изработка, транспорт и монтажа на „топла врска“ со апроксимативна должина од 18 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба).

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

II.11) Динамичен систем **Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување: **доколку поради крајна итност, предизвикана како резултат на настани кои договорниот орган не можел да ги предвиди, роковите за другите постапки не може да се применат**

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување **Согласно одлуките на Влада на Република Северна Македонија за мерки и препораки за заштита и превенција од Коронавирус ЦОВИД-19, а поради зголемување на бројот на заболени лица се јавува потреба од предвидување на нови болнички капацитети за згрижување на заболените лица. Министерството за здравство има потреба од набавка – прибирање на понуди за монтажни објекти – контејнери, кои ќе се поставуваат во непосредна близина на ЈЗУ Универзитеска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби при Универзитетскиот Клинички комплекс „Мајка Тереза“ во Скопје. За таа цел, планирана е лесна, брза и монтажна изградба на медицински капацитети – болничко сместување со просторија за медицински персонал и за згрижување на пациенти со медицински третман на заболени од Коронавирус ЦОВИД-19. Постапката е делива по делови кои се составени од веќе наведените елементи согласно итните потреби за ставање во функција на монтажната болница, а поради итната потреба од зголемување на болничките капацитети за лекување на пациенти кои се заболени со Коронавирус ЦОВИД -19.**

III.2) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.3) Меѓународна објава: **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **13.04.2020**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **23-3039/25**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **5**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес**

Адреса на носителот на набавката: **РАШТАНСКИ ПАТ 2**

Град или населено место: **ВЕЛЕС**

Држава: **Република Македонија**

IV.2.1) Групна понуда **Не**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на набавката со ДДВ **16.900.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор без вклучен ДДВ **8.748.000,00**

IV.3.3) ДДВ: **0%**

IV.3.4) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **8.748.000,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **19.10.2020**

ДОКУМЕНТИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на постапка на која се однесува известувањето **05-2020-50100**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за здравство**

I.1.2) Адреса: **Ул. 50-та Девизија бр.14**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Тања Пехчевска**, адреса на е-пошта: **tanja.pehcevska@zdravstvo.gov.mk**
телефон/факс: **071 387-196/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи - Здравство

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

Монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија, а во согласност со Извадок од Нацрт-записникот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година, („Точка 10“).

II.2) Дали договорот е поврзан со кризна состојба? **Да**
Кризна состојба : **Covid - 19**

II.3) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Министерство за здравство на РСМ - Клинички центар Мајка Тереза во непосредна близина на ЈЗУ У Клиника за инфективни и фебрилни состојби Скопје

II.4) Секторски договор **Не**

II.5) Централно тело **Не**

II.6) Групна набавка **Не**

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: **Не**

II.9) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Број на делови за кои можат да се поднесат понуди: **Сите делови**

Дел број	Опис на делот за набавка
1	ДЕЛ 1. Набавка/Изработка, транспорт на следните монтажни објекти: вкупно 4 тоалети ТИП 1; 2 тоалети ТИП 2; 3 канцеларии и топла врска со апроксимативна должина од 41 м (точните должини ќе се утврдат на фактичка состојба);

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

II.11) Динамичен систем **Не**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас**

Оправданост за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување:
доколку поради крајна итност, предизвикана како резултат на настани кои договорниот орган не можел да ги предвиди, роковите за другите постапки не може да се применат

Дополнително образложение за изборот на постапката со преговарање без претходно објавување
Согласно одлуките на Влада на Република Северна Македонија за мерки и препораки за заштита и превенција од Коронавирус ЦОВИД-19, а поради зголемување на бројот на заболени лица се јавува потреба од предвидување на нови болнички капацитети за згрижување на заболените лица. Министерството за здравство има потреба од набавка – прибирање на понуди за монтажни објекти – контејнери, кои ќе се поставуваат во непосредна близина на ЈЗУ Универзитеска клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби при Универзитетскиот Клинички комплекс „Мајка Тереза“ во Скопје. За таа цел, планирана е лесна, брза и монтажна изградба на медицински капацитети – болничко сместување со просторија за медицински персонал и за згрижување на пациенти со медицински третман на заболени од Коронавирус ЦОВИД-19. Постапката е делива по делови кои се составени од веќе наведените елементи согласно итните потреби за ставање во функција на монтажната болница, а поради итната потреба од зголемување на болничките капацитети за лекување на пациенти кои се заболени со Коронавирус ЦОВИД -19

III.2) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.3) Меѓународна објава: **Не**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **13.04.2020**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **23-3039/26**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **5**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за производство градежништво трговија и услуги ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ увоз-извоз Валандово**

Адреса на носителот на набавката: **МАРШАЛ ТИТО бб**

Град или населено место: **ВАЛАНДОВО**

Држава: **Република Македонија**

IV.2.1) Групна понуда **Не**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на набавката со ДДВ **16.900.000,00**


IV.3.2) Вредност на склучениот договор без вклучен ДДВ **2.380.000,00**

IV.3.3) ДДВ: **0%**

IV.3.4) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **2.380.000,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **19.10.2020**

ДОКУМЕНТИ



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Арх бр. 23-3039/28

29-04-2020

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Согласно Одлука за јавна набавка, број 23-3090/2 од 07.04.2020 година, донесена од страна на Министерот за здравство каде утврдена е потреба за доделување на договор за јавна набавка на монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија, а во согласност со Извадок од Нацрт-записникот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година („Точка 10“) и врз основа на Договорот за набавка на работи - монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија во Република Северна Македонија, бр.23-3039/26 од 13.04.2020 година и се изготвува:

ЗАПИСНИК

за примопредавање на објект – монтажни контејнери во рамките на Клинички центар Мајка Тереза-Скопје (непосредно до Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби)

Составен на ден 24.04.2020 година година на објект- монтажните контејнери кои се предмет на овој Договор во рамките на Клинички центар Мајка Тереза-Скопје.Овој записник служи како потврда за прием на објектот и состојбата во која се предава на крајниот корисник – договорниот орган.

Согласно договорот за набавка на работи - монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем бр.23-3039/26 од 13.04.2020 година, носителот на набавката му го предава објектот - монтажни контејнери во рамките на Клинички центар Мајка ТерезаСкопје (непосредно до УК за инфективни болести и фебрилни состојби) на договорниот орган за негово понатамошно опремување за вршење на дејноста.

Носителот на набавката целосно ги реализира работите предвидени во техничката спецификација согласно член 5 од договорот и со тоа договорот се смета за уредно испорачан.

Во име на договорниот орган Министерство за здравство записникот ќе го потпише лицето Ана Ивановска врз основа на Одлука за јавна набавка, број 23-3090/2 од 07.04.2020 година и Друштво за производство градежништво трговија и услуги ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ увоз-извоз Валандово, со седиште на ул.Маршал Тито бб,Валандово, со ЕДБ 4003006105207 и ЕМБС 6101577 , претставуван од Управител Аристотел Исиров (Носител на набавката) од друга страна.

Во прилог на овој записник приложена е и скица од објектот и технички спецификации од производител за вградениот материјал (сидови и кровен покривач).



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Краток опис на фактичката ситуација во објектот на денот на примопревањето

Предадениот објект се сосостои од:

1. **4 (четири) монтажни објекти ТИП 1** со димензии: должина 6000 мм ,ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија). Изработени се од:
 - Конструкција од челични профили со исполна од сендвич (PUR) панели 50мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, топлинска спроводливост 0,44 U(W/m²K), RAL 9002/9002
 - Кровна конструкција (едноводен кров) од кровни ребрасти панели (PUR) панели 50 мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, топлинска спроводливост 0,44 U(W/m²K) RAL 9002/9002
 - 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“со оков и можност за заклучување
 - 2 ПВЦ - врати за кабини 700м-2050мм исполна панел „саќе“со оков и можност за заклучување
 - 1 алуминиумски-еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4, димензии 800мм-1000мм,со внатрешна ролетна (перде) и надворешен комарник.
 - Под од цементни (Betonyр) табли 20мм обложен со ПВЦ во ролна на лепак.
 - Комплетна инсталација
 - 3 ЛЕД осветлувања x 18w
 - 1 Прекинувач
 - 2 Монофазни надградни приклучоци
 - Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
 - Доводна IP таблаОбјектите се опремени со:
 - 2 (две) ВЦ кабини опремени со толетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
 - 2 (два) мијалници со 6 (шест) батериски чешми комплет со врзен материјал
 - 2 (две) туш кабини комплет со батерија комплет со врзен материјал
 - Довод / Одвод со ПВЦ цевки
 - Електричен бојлер 80л
 - Конвекторски панел за загревање 2KW
2. **2(два) монтажни објекти ТИП 2** со димензии: должина 6000 мм ,ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија). Изработени се од:



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

- Конструкција од челични профили со исполна од сендвич (PUR) панели 50мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, топлинска спроводливост 0,44 U(W/m²K), RAL 9002/9002
- Кровна конструкција (едноводен кров) од кровни ребрасти панели (PUR) панели 50 мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, топлинска спроводливост 0,44 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“со оков и можност за заклучување
- 2 ПВЦ -врати за кабини 700м-2050мм исполна панел „саќе“со оков и можност за заклучување
- 1 алуминиумски-еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 со димензии 800мм-1000мм. со внатрешна ролетна (перде) и надворешен комарник
- Под од елементни (Betonyr) табли 20мм обложен со ПВЦ во ролна на лепак
- Комплетна инсталација
- 3 ЛЕД осветлувања x 18w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Објектите се опремени со:

- 2(две) ВЦ кабини опремени со толетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 2(два) мијалници со 6 (шест) батериски чешми комплет со врзен материјал
- 2 (две)туш кабини комплет со батерија комплет со врзен материјал
- Довод / Одвод со ПВЦ цевки
- Електричен бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW

3. **3(три) монтажни објекти -медицински** со димензии: должина 6000 мм ,ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија). Изработени се од:

- Конструкција од челични профили со исполна од сендвич (PUR) панели 50мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, топлинска спроводливост 0,44 U(W/m²K), RAL 9002/9002
- Кровна конструкција (едноводен кров) од кровни ребрасти панели (PUR) панели 50 мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, топлинска спроводливост 0,44 U(W/m²K) RAL 9002/9002
- 1 ПВЦ влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

- 1 алуминиумски-еднокрилен прозор со термопан стакло 4x16x4 со димензии 800мм-1000мм со внатрешна ролетна (перде) и надворешен комарник
 - Под од цементни (Betонур) табли 20мм обложен со ПВЦ во ролна на лепак
 - Комплетна инсталација
 - 2 ЛЕД осветлувања x 18w
 - 1 Прекинувач
 - 3 Монофазни надградни приклучоци
 - 1 Монофазен надграден приклучок - клима
 - Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
 - Доводна IP табла
 - Климатизација- инвертер сплит систем 2,5KW
4. **Топла врска-коридор** за поврзување на објектите оформени од модулари монтажни контејнери со димензии: должина 42000 м, ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија). Изработени се од:
- Конструкција од челични профили со исполна од сендвич (PUR) панели 50мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, топлинска спроводливост 0,44 U(W/m²K), RAL 9002/9002
 - Кровна конструкција (едноводен кров) од кровни ребрасти панели (PUR) панели 50 мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, топлинска спроводливост 0,44 U(W/m²K) RAL 9002/9002
 - 2 (две) ПВЦ - влезна врата 850мм – 2050мм исполна панел „саќе“ со оков и можност за заклучување
 - 1 (една) двокрилна ПВЦ врата – 2/900/2050 мм исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков
 - 13 алуминиумски-еднокрилни прозори со термопан стакло 4x16x4 со димензии 800мм-1000мм со внатрешна ролетна (перде) и надворешен комарник
 - Под од цементни (Betонур) табли 20мм обложен со ПВЦ во ролна на лепак
 - Комплетна инсталација
 - 12 ЛЕД осветлувања x 18w
 - 2 Прекинувач
 - 2 Монофазни надградни приклучоци
 - Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со минимум 3 автоматски осигурачи
 - Доводна IP табла



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Објектот е отстапен во присуство на:

Предал:

Примил:

За Носител на набавката
ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ увоз-извоз
Валандово


Министерство за здравство, Овластено лице

Аристотел Исиров

Ана Ивановска

(име и презиме) и потпис

(име и презиме) и потпис на овластеното лице






Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

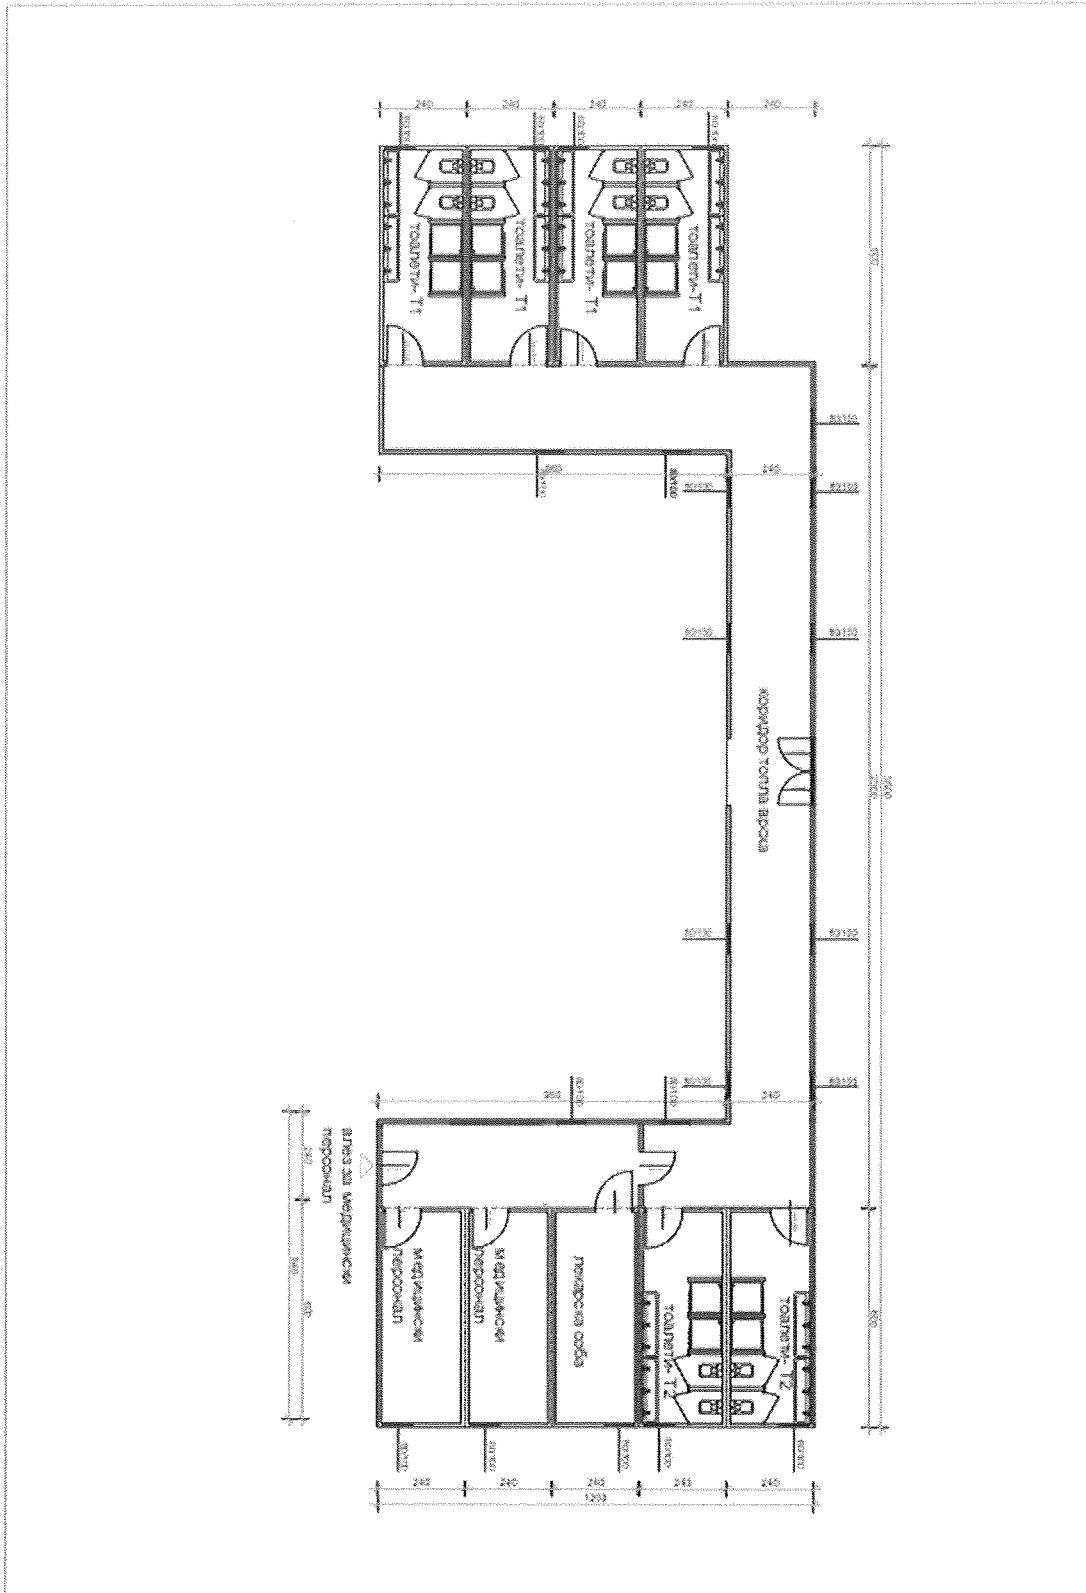



PANELCO S.A
30 Vasileos Georgiou Str., P.O. Box 15233
Greece
14

EN 14509:2013

Metal faced insulating panel for use in buildings

Reference:PSR-50

Insulation: PUR Density: 37,90 Kg/m³ Thickness:50 mm

Mass:9,46 Kg/m

Facings:

External: Steel 0,40 mm S280GD (EN 10346) Coating: SP 25 µm

Internal: Steel 0,40 mm S280GD (EN 10346) Coating: SP 25 µm

Use: Roofs

Thermal transmittance:0,44 W/m² K

Thermal conductivity: 0,021 W/mK

Mechanical resistance:

Tensile Strength 0,10 MPa

Shear Strength 0,09 MPa

Reduced long term shear strength 0,036 MPa

Shear Modulus (core) 2,2 MPa

Compressive strength (core) 0,10 MPa

creep coefficient t=2000 h 1,10 t=100000 h 1,80

Bending resistance in the span (Tested span 2,8 m)

- +ve bending 2,02 kNm/m

- +ve bending, elevated temperature 1,95 kNm/m

- -ve bending 2,02 kNm/m

- -ve bending elevated, temperature 1,95 kNm/m

Bending resistance at an internal support

- +ve bending 1,82 kNm/m

- +ve bending, elevated temperature 1,77 kNm/m

- -ve bending 1,64 kNm/m

- -ve bending elevated, temperature 1,59 kNm/m

Wrinkling strength (external face)

- in span 116,09 MPa

- in span, elevated temperature 112,60 MPa

- at central support 111,25 MPa

- at central support, elevated temperature 107,91 MPa

Wrinkling strength (internal face)

- in span 116,09 MPa

- at Internal support 100,24 MPa

Reaction to fire: F

Fire resistance NPD

External Fire Performance: FROOF

Water permeability: NPD

Air permeability: NPD

Water vapour permeability: Impermeable

Airborne sound insulation: NPD

Resistance to point load: NPD

Repeated access load 2000 cycles: NPD

Durability: PASS



PANELCO S.A
30 Vasileos Georgiou Str., P.O. Box 15233
Greece
14

EN 14509:2013

Metal faced insulating panel for use in buildings

Reference:PSCW-50

Insulation: PUR Density: 37,90 Kg/m³ Thickness: 50 mm

Mass: 8,61 Kg/m

Facings:

External: Steel 0,40 mm S320GD (EN 10346) Coating: SP 25 µm

Internal: Steel 0,40 mm S280GD (EN 10346) Coating: SP 25 µm

Use: External Walls

Thermal transmittance: 0,44 W/m² K

Thermal conductivity: 0,021 W/mK

Mechanical resistance:

Tensile Strength 0,10 MPa

Shear Strength 0,09 MPa

Shear Modulus (core) 2,2 MPa

Compressive strength (core) 0,10 MPa

Bending resistance in the span (Tested span 2,8 m)

- +ve bending 2,02 kNm/m

- +ve bending, elevated temperature 1,95 kNm/m

- -ve bending 2,02 kNm/m

- -ve bending elevated, temperature 1,95 kNm/m

Bending resistance at an internal support

- +ve bending 1,82 kNm/m

- +ve bending, elevated temperature 1,77 kNm/m

- -ve bending 1,64 kNm/m

- -ve bending elevated, temperature 1,59 kNm/m

Wrinkling strength (external face)

- in span 116,09 MPa

- in span, elevated temperature 112,60 MPa

- at central support 111,25 MPa

- at central support, elevated temperature 107,91 MPa

Wrinkling strength (internal face)

- in span 116,09 MPa

- at central support 100,24 MPa

Reaction to fire: F

Fire resistance NPD

Water permeability: NPD

Air permeability: NPD

Water vapour permeability: Impermeable

Airborne sound insulation: NPD

Sound absorption: NPD

Durability: PASS



Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Согласно Одлука за јавна набавка, број 23-3090/2 од 07.04.2020 година, донесена од страна на Министерот за здравство каде утврдена е потреба за доделување на договор за јавна набавка на монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија, а во согласност со Извадок од Нацрт-записникот од Триесет и шестата седница на Владата на Република Северна Македонија одржана на 6 април 2020 година („Точка 10“) и врз основа на Договорот за набавка на работи - монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија во Република Северна Македонија, бр.23-3039/25 од 13.04.2020 година и се изготвува:

ЗАПИСНИК

за примопредавање на објект – монтажни контејнери во рамките на Клинички центар Мајка Тереза-Скопје (непосредно до Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби)

Составен на ден 05.05.2020 година година на објект- монтажните контејнери кои се предмет на овој Договор во рамките на Клинички центар Мајка Тереза-Скопје.Овој записник служи како потврда за прием на објектот и состојбата во која се предава на крајниот корисник – договорниот орган.

Согласно договорот за набавка на работи - монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем бр.23-3039/25 од 13.04.2020 година, носителот на набавката му го предава објектот - монтажни контејнери во рамките на Клинички центар Мајка ТерезаСкопје (непосредно до УК за инфективни болести и фебрилни состојби) на договорниот орган за негово понатамошно опремување за вршење на дејноста.

Носителот на набавката целосно ги реализира работите предвидени во техничката спецификација согласно член 5 од договорот и со тоа договорот се смета за уредно испорачан.

Во име на договорниот орган Министерство за здравство записникот ќе го потпише лицето Ана Ивановска врз основа на Одлука за јавна набавка, број 23-3090/2 од 07.04.2020 година и ДПТУ Брако ДОО,со седиште на ул.Раштански пат бр.2, 1400 Велес,со ЕДБ МК 4004003114759 и ЕМБС 5789885,претставуван од Управител Благој Шалев од друга страна.

Во прилог на овој записник приложена е и скица од објектот.



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

Краток опис на фактичката ситуација во објектот на денот на примопревањето

ДЕЛ 2.

Предадениот објект се сосостои од:

- 1. 12 (дванаесет) монтажни сместувачки објекти** со димензии: должина 6000 мм, ширина 7200 мм и висина 2600 мм (надворешна димензија) .

Изработени се од:

- Конструкција: челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја
- Кровна конструкција (двоводен кров) со покривање со кровни ребрасти панели (PUR) панели д=50мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм и надворешно 0,4мм.
- Олуци
- 1 (една) ПВЦ врата без праг 110/210 см исполна панел „саќе“
- 2 (две) ПВЦ двокрилни прозори со димензии 150/150 см, со термопан стакло 4x16x4
- Сидови од сидни ПАНЕЛИ (PUR) со д=50mm, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм, надворешно 0,4мм, RAL 9002/9002
- Под од цементни (Betонур) табли 20мм обложени со ПВЦ во ролна на лепак

Комплетна инсталација:

- 6 (шест) ЛЕД светла x 18w
- 1 (еден) прекинувач
- 6 (шест) монофазни надградни приклучоци
- 1 (еден) монофазен надграден приклучок - клима
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со 4 (четири) автоматски осигурачи
- Доводна IP табла
- Инвертер ситем за климатизација – 3,5 KW

- 2. 1 (еден) ходник** за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни контејнери со димензии: должина 44000мм, ширина 2400мм и висина 2550 мм (надворешна димензија)

Изработени се од:

- Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја
- Кровна конструкција (двоводен кров) ±100мм со покривање со кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 50мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм
- Олуци
- 1 (една) ПВЦ дупла врата без праг 2x90/205 см исполна термопан стакло 4+16+4
- 1 (еден) ПВЦ еднокрилен прозор 90/150 см со термопан стакло 4x16x4



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

- Сидови од сидни ПАНЕЛИ (PUR) со $d=50\text{mm}$, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, RAL 9002/9002
- Под од цементни (Betonyр) табли 20мм обложен со ПВЦ во ролна на лепак.
Комплетна инсталација:
 - 14 ЛЕД светла x 18w
 - 1 Прекинувач
 - 3 Монофазни надградни приклучоци
 - Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со 4 автоматски осигурачи
 - Доводна IP табла
- 3. 1(еден) монтажен објект -медицински со димензии: должина 6000 мм ,ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија). Изработен од:**
Изработени се од:
 - Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја
 - Кровна конструкција (двоводен кров) $\pm 100\text{mm}$ со покривање со кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 50мм дебелина на пластифициран лим внатрешно најмалку 0,4мм надворешно најмалку 0,4мм
 - Олуци
 - 1 ПВЦ - врата без праг 110/210 см исполна панел „саке“
 - 1 ПВЦ – двокрилен прозор со димензии 150/150 см, со термопан стакло(4x16x4)
 - Сидови од сидни ПАНЕЛИ (PUR) со $d=50\text{mm}$, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, RAL 9002/9002
 - Под од цементни (Betonyр) табли 20мм обложен со ПВЦ во ролна на лепак.
Комплетна инсталација:
 - 2 ЛЕД светла x 18w
 - 1 Прекинувач
 - 3 Монофазни надградни приклучоци
 - 1 Монофазен надграден приклучок - клима
 - Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со 4 автоматски осигурачи
 - Доводна IP табла
 - Инвертер ситем за климатизација – 3,5 KW



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

4. 1 (еден) коридор-топла врска за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни – контејнери и шаторска конструкција за полска болница со димензии :должина 18400мм, ширина 2400мм и висина 2550 мм (надворешна димензија)

Изработени се од:

- Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја
- Кровна конструкција (двоводен кров) ± 100 мм со покривање со кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 50мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм
- Олуци
- 6 ПВЦ еднокрилни прозори 90/100 см со термопан стакло 4x16x4
- Сидови од сидни ПАНЕЛИ (PUR) со $d=50$ мм, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, RAL 9002/9002
- Под од цементни (Betonyр) табли 20мм обложен со ПВЦ во ролна на лепак.

Комплетна инсталација:

- 9 неонски светла x 18w
- 2 Прекинувач
- 3 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со 4 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

5. 4 (четири) монтажни објекти ТИП 1 со димензии должина 6000 мм ,ширина 2400 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија).

Изработени се од:

- Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја
- Кровна конструкција (двоводен кров) ± 100 мм со покривање со кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 50мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм
- Олуци
- 1 ПВЦ влезна врата 100/205 см исполна панел „саке“
- 4 ПВЦ врати за кабини 40/205 см исполна панел „саке“;
- 1 ПВЦ еднокрилен прозор 75/110 см со термопан стакло 4x16x4
- Сидови од сидни ПАНЕЛИ (PUR) со $d=50$ мм, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, RAL 9002/9002
- Внатрешни кабини сендвич панел (PUR) сид
- Под од цементни (Betonyр) табли 20мм обложен со ПВЦ во ролна на лепак.

Комплетна инсталација:



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

- 3 ЛЕД светла x 9w
- 1 Прекинувач
- 2 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со 4 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Објектите се опремени со:

- 3 (три) ВЦ кабини опремени со толетни школки со ниско носечко казанче комплет со врзен материјал
- 3 (три) мијалници со батериски чешми комплет со врзен материјал
- 1 (една) туш кабини комплет со батерија комплет со врзен материјал
- Довод / Одвод со ПВЦ цевки
- Електричен бојлер 80л
- Конвекторски панел за загревање 2KW

ДЕЛ 3.

1. **1(еден) коридор-топла врска** за поврзување на објектите оформени од модуларни монтажни контејнери и ЈЗУ УК за Инфективни и фебрилни состојби со димензии:должина 34000 мм ,ширина 3000 мм и висина 2550 мм (надворешна димензија)Изработени се од:
 - Конструкција: Челично железо антикорозивно епоксидно премачкан со 4 слоја боја
 - Кровна конструкција (двоводен кров) ± 100 мм со покривање со кровни ребрасти панели (PUR) панели најмалку 50мм дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм
 - Сидови од сидни ПАНЕЛИ (PUR) со $d=50$ mm, обложени со внатрешно "лице" и надворешно фасадно "лице". Дебелина на пластифициран лим внатрешно 0,4мм надворешно 0,4мм, RAL 9002/9002
 - Под од цементни (Betonyр) табли 20мм обложен со ПВЦ во ролна на лепак.
 - Олуци
 - 2 (две) двокрилна ПВЦ врата 2x 90/ 205см исполна термопан стакло 4x16x4 ,комплет со оков и можност за заклучување
 - 1 (една) двокрилна ПВЦ врата 2x 90/ 205см исполна со термопан стакло 4x16x4 комплет со потребен оков и можност за заклучување
 - 18 (осумнаесет) ПВЦ еднокрилни прозори 90/110 см со термопан стакло 4x16x4Комплетна инсталација:
 - 17 неонски светла x 18w
 - 2 Прекинувач



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

- 5 Монофазни надградни приклучоци
- Разводна ПВЦ табла за монтажа на сид со 4 автоматски осигурачи
- Доводна IP табла

Објектот е отстапен во присуство на:

Предал:

Примил:

За Носител на набавката
ДПТУ БРАКО ДОО, Велес

Министерство за здравство, Овластено лице

Благој Шалев

Ана Ивановска

(име и презиме)

и потпис

(име и презиме) и потпис

Стефанија Стоичковска

(име и презиме) и потпис




Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

ДЕЛ 2

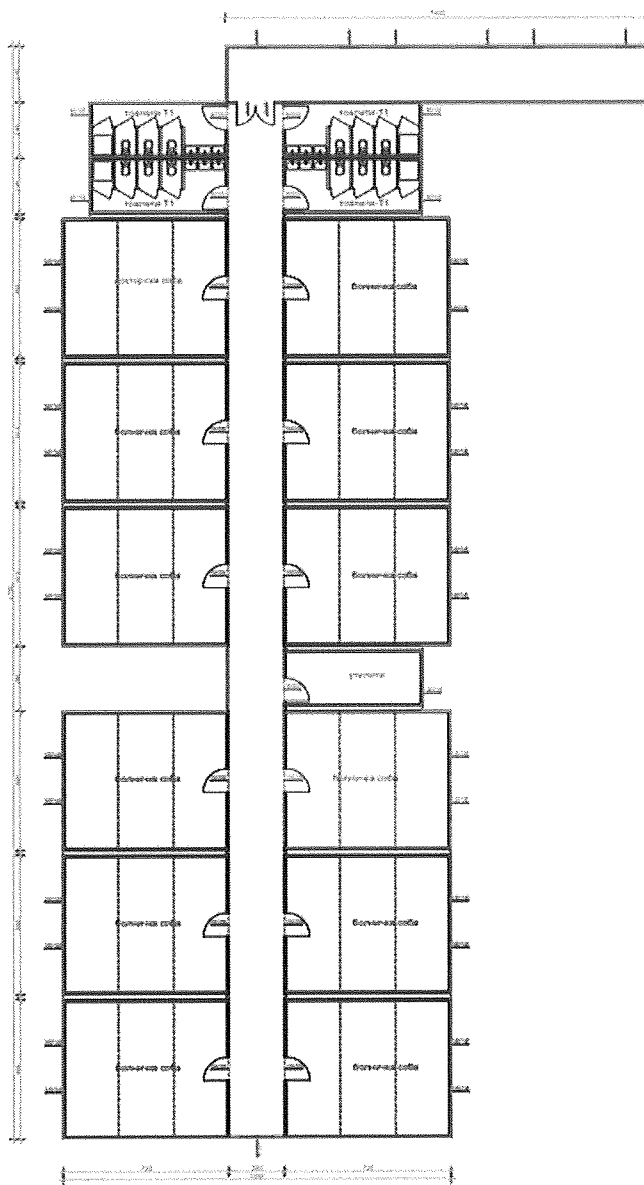




Република Северна Македонија

Министерство за здравство

Единица за имплементација на проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ

ДЕЛ 3



Бр.-Нр. 23-3920/1
22-05-2020

20 год.-viti
СКОПЈЕ - SHKUP

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за организација и работа на државната управа ("Службен Весник на Република Северна Македонија" бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) и финансискиот план на Министерството за здравство за 2020 година, Министерот за здравство, донесе

РЕШЕНИЕ

за обезбедување на средства

1. Министерството за здравство обезбедува наменски средства на **ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Валандово, во износ од 2.380.000,00 денари без ДДВ за ф-ра бр.30-04/2020** за Дел 1 Набавка/Изработка, транспорт на монтажни контејнери во рамките на Клинички центар Мајка Тереза – Скопје (непосредно до УК за Инфективни болести и фебрилни состојби) за потребите на здравствениот систем според Договор архивски бр.23-3039/26 од 13.04.2020 година.
2. Средствата од точка 1 на ова Решение се обезбедуваат од средствата на Министерството за здравство за 2020 година, **Раздел 19001, сметка 785-K2, програма П1 – Мерки за справување со COVID-19 кризата, ставка 480.**
3. Средствата од точка 1 на ова Решение да се преведат на жиро сметка на добавувачот.
4. Решението стапува во сила со денот на донесување.

Образложение

Согласно објавениот оглас за доделување на Договор за јавна набавка на работи за монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настанатата епидемија во РСМ COVID-19 и Договорот склучен помеѓу Министерството за здравство архивски број 23-3039/26 од 13.04.2020 година со ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Валандово, како и доставената ф-ра бр.30-04/2020 заведена архивски 05-2/494 од 04.05.2020, Записник за примопредавање 23-3039/28 од 29.04.2020 и Изјава за ослободување од ДДВ арх.бр. 23-3039/27 од 28.04.2020 година, Министерството за здравство обезбедува средства на ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Валандово.

Врз основа на горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Доставено до:

- сметководство
- проектна единица
- архива

изготвил: Марија Николовска
контролирал: Ана Ивановска

Елена Иванова
Јован Грповски

одобрил: Љупчо Балкоски
Вања Андонова



Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги
ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ
Маршал Тито бб, ВАЛАНДОВО
с/ка 210 061015770103
депонент: НЛБ банка АД Скопје
ЕДБ: МК 4003006105207
Валандово 30.04.2020

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Ул.Водњанска ББ
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAKEDONIA SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
СКОПЈЕ - SHKUP

Примено E pranuar	04 05 2020		
Орг. Единица Njësia Org.	Број Numër	Прилог Shtojcë	Вредност Vlera
05	-2	1/494	

ФАКТУРА бр.30-04/2020

Р.б. ОПИС ИЗНОС БЕЗ ДДВ

Набавка/изработка, транспорт на следните монтажни објекти: **2.380.000,00**
вкупно 4 тоалети ТИП 1;
2 тоалети ТИП 2;
3 канцеларии и топла врска со апроксимативна
должина од 41м.
-Договор за набавка со наш арх.број 03/20/34 од 13.04.2020 и
со Ваш арх.број 23-3039/26 од 13.04.2020.
-Записник за примопредавање на објект со Ваш арх.број 23-3039/28 од 29.04.2020 (во
Прилог).

ВКУПНО ЗА НАПЛАТА БЕЗ ДДВ: 2.380.000,00

Со зборови : два милиони тирисџа и осумдесет илјади денари.

Вредноста на оваа фактура е ослободена од ДДВ согласно Член 2-б став 1 и Член 2-в од Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на уредбата со законска сила за примена на законот за данок на додадена вредност за време на вонредна состојба (Службен весник на Република Северна Македонија бр.102/20).

И Изјава од Министерство за здравство архивски број 23-3039/27 од 28.04.2020 година.

Фактурирал

Директор



Проверил:

Ана Нисановска



Република Северна Македонија
Министерство за здравство

Арх.бр. 23-3039/27

28-04-2020

Врз основа на одредбите од член 2-б, став 1 и 2 од Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност во време на вонредна состојба (Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 102/20), а во врска со член 3 од Договорот за набавка на работи - монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија во Република Северна Македонија, бр. 23-3039/26 од 13.04.2020 година, Министерот за здравство ја дава следната:

Изјава

Во име на буџетскиот корисник – Министерство за здравство, изјавувам под целосна кривична и материјална одговорност дека прометот по основ на горе наведениот договор се плаќа со донирани финансиски средства и од тие причини потребно е да се ослободи од данок на додадена вредност, затоа што прометот на добра во конкретниов случај е извршен кон Министерството за здравство заради справување со Коронавирусот COVID 19.

Оваа Изјава ја издавам за потребите на економскиот оператор со кој е склучен Договорот за набавка на работи - монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија во Република Северна Македонија, бр. 23-3039/26 од 13.04.2020 година.

Подготвил: Сандра Веловска
Одобрил: Вања Андонова



Министер,
Доц. д-р. Бенко Филипче

05206. MZO

БАРАЊЕ ЗА ПЛАЌАЊЕ

8

Трезорска канцеларија: Скопје

Датум на валута: 26/27.05.2020

Трезорска сметка

100000000063095

Сметка на буџетски корисник

1900100434785K2

Назив на буџетски корисник

Министерство за здравство Донација КОВИД

Единствен даночен број

4030990253804

Сметка на примачот	Назив и седиште на примачот	Сметка на буџетски корисник	Расход но konto	Расх една прог рама	Прихо дно konto	Износ (МКД)	Повикување	Датум на доспевање	Цел на дознаката	Вид обра зец
0061015770103	ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ Валандово	1900100434785K2	480190	Р1		2.380.000,00	23-3039/26	04.06.2020	/ОБ/2050134320/Р/01/ По ф-ра бр.30-04/2020	60
0057898850188	ДПТУ БРАКО ДОО Велес	1900100434785K2	480190	Р1		8.748.000,00	23-3039/25	11.06.2020	/ОБ/2050134220/Р/01/ По ф-ра бр.20-390-000549	60
ВКУПНО						11.128.000,00				

Контролирал

Датум и место на поднесување



Образец за пријавување на обврска во тековна година -

пријава пријава преку ПО1 промена одјава

Вкупен износ
во денари МКД 238000000
во странска валута

Број на О1 2050134320 Број на ПО1 2050134300
Датум на 13042020

назив и седиште на буџетски МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
уплатна сметка
буџетски
ФЗО
назив и седиште на добавувач / ЈБТ-АРИ И ТОМ ДООЕЛ ВАЛАНДОВО

раздел ркб назив и седиште на буџетски
19001 00434
бр. на документ вид на документ опис на обврската
23-3039/26 ДОГОВОР КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА
тип на договор број на согласност

место за потврда на прием
Трезорска канцеларија датум на прием
НОВ СЕРВЕР - ТК - СКОПЈЕ 21052020

датум и место на поднесување
20052020 СКОПЈЕ

сметка поставка програма
1900100434785К2 480190 Р1

Термински план за плаќање
гус бр. реализирана (датум на валута) сметка поставка
1 22052020 1900100434785К2 480190

Врз основа на член 55, став 1 од Законот за организација и работа на државната управа ("Службен Весник на Република Северна Македонија" бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11) и финансискиот план на Министерството за здравство за 2020 година, Министерот за здравство донесе

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

РЕШЕНИЕ

за обезбедување на средства

Бр.-Nr. 23-3950/1

16.05. 20 20 год.-viti

СКОПЈЕ, ШКУП

1. Министерството за здравство обезбедува наменски средства на **ДПТУ БРАКО ДОО Велес, во износ од 8.748.000,00 денари без ДДВ за ф-ра бр.20-390-000549** за Дел 2 и 3 за Набавка/Изработка, транспорт на монтажни контејнери во рамките на Клинички центар Мајка Тереза – Скопје (непосредно до УК за Инфективни болести и фебрилни состојби) за потребите на здравствениот систем според Договор архивски бр.23-3039/25 од 13.04.2020 година.
2. Средствата од точка 1 на ова Решение се обезбедуваат од средствата на Министерството за здравство за 2020 година, **Раздел 19001, сметка 785-K2, програма П1 – Мерки за справување со COVID-19 кризата, ставка 480.**
3. Средствата од точка 1 на ова Решение да се преведат на жиро сметка на добавувачот.
4. Решението стапува во сила со денот на донесување.

Образложение

Согласно објавениот оглас за доделување на Договор за јавна набавка на работи за монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настанатата епидемија во РСМ COVID-19 и Договорот склучен помеѓу Министерството за здравство архивски број 23-3039/25 од 13.04.2020 година со ДПТУ БРАКО ДОО Велес, како и доставената ф-ра бр.20-390-000549 заведена архивски 05-2/539 од 11.05.2020, Записник за примопредавање 23-3039/30 од 05.05.2020 и Изјава за ослободување од ДДВ арх.бр. 23-3039/29 од 05.05.2020 година, Министерството за здравство обезбедува средства на ДПТУ БРАКО ДОО Велес.

Врз основа на горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.



МИНИСТЕР,
Д-р. Венко Филипче

Доставено до:

- сметководство
- проектна единица
- архива

изготвил: Марија Николовска
контролирал: Ана Ивановска

Елена Иванова

Јован Грловски

одобрил: Љупчо Балкоски

Вања Андонова

Образец за пријавување на обврска во тековна година -

пријава пријава преку ПО1 промена одјава

Број на О1

20 501342 20 20

Број на ПО1

20 501342 00

Датум на

13 04 2020

Вкупен износ

во денари МКД 874800000

во странска валута

раздел

19001

рkb

00434

назив и седиште на буџетски

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

бр. на документ

23-3039/25

вид на документ

ДОГОВОР

опис на обврската

КУПУВАЊЕ НА ДРУГА ОПРЕМА

тип на договор

број на согласност

назив и седиште на добавувач /

БРАКО ДОО ВЕЛЕС

уплатна сметка

210057898850188

буџетски

ФЗО

датум и место на поднесување

20 05 2020 СКОПЈЕ

место за потврда на прием

Трезорска канцеларија

НОВ СЕРВЕР - ТК - СКОПЈЕ

датум на прием

21 05 2020

сметка

1900100434785К2

поставка

480190

програма

P1

Термински план за плаќање

тус

реализирана

број

1

(датум на валута)

22052020

(износ)

874800000

програма

МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО

сметка

1900100434785К2

поставка

480190

БРАКО

ДПУ БРАКО ДОО
Раштански пат Бр. 2
Велес

Тел: +389 43 212 560; жичано: 043 551 111
Факс: + 389 43 232 534
www.brako.com.mk; sales@brako.com.mk
с-ка: 210-057898850188 НЛБ Тутунска Банка
с-ка: 300-270000030626 Комерцијална Банка
ЕДБ: МК4004003114759 М.Б:5789885

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
MINISTRIA E SHËNDETËSISË
СКОПЈЕ - ШКУП

Датум 05.05.2020
Датум на промет 05.05.2020
Рок на плаќање 30 денови
Датум на валута 04.06.2020

Примено Е ргачар	11.05.2020		
Орг. Единица Njësia Org.	Број Number	Прилог Shtojcë	Вредност Vlera
05	21	538	

КУПУВАЧ:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
50 ДИВИЗИЈА БР.14
ЕДБ: МК4030990253804

Фактура 20-390-000549



Профактура: 20-094-000038/13.04.2020

Испратница: 20-350-000534/05.05.2020

Вкупно книжени обврски: 0,00 MKD

Вкупно доспееани обврски: 0,00 MKD

Р.Б	Шифра	Назив	Количина	ЕМ	Цена без ДДВ	Р. %	ДДВ %	Износ
1	Д2П1МС-0-001	Монтажен објект сместувачки - Дел2 - Позиција 1	12,000	ПАР	433.438,00	0,00	0,00	5.201.256,00
2	Д2П2МХ-0-001	Монтажен објект ходник 42м- Дел2 - Позиција 2	1,000	ПАР	1.070.276,00	0,00	0,00	1.070.276,00
3	Д2П3ММ-0-001?	Монтажен објект медицински- Дел2 - Позиција 3	1,000	ПАР	152.052,00	0,00	0,00	152.052,00
4	Д2П4ТВ-0-001	Монтажен објект топла врска - Дел2 - Позиција 4	1,000	ПАР	447.900,00	0,00	0,00	447.900,00
5	Д2П5Т1-0-001	Монтажен објект тоалет тип 1 - Дел2 - Позиција 5	4,000	ПАР	238.879,00	0,00	0,00	955.516,00
6	Д3П51ТВ-0-001	Монтажен објект топла врска 34м1 - Дел3 - Позиција 1	1,000	ПАР	921.000,00	0,00	0,00	921.000,00

Врз основа на одредбите од член 2-б став 1 и 2 од Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на уредбата со законска сила за примена на Законот за ДДВ во време на вонредна состојба
Согласно изјавата издадена од примачот на предметот на договорот заведена под број 23-3039/29 од 05.05.2020

Прилог кон фактурата Записник за примопредавање заведен под број
БРАКО 03-94/4 од 05.05.2020
Мин. за Здравство 23-3039/30

Согласно договор за јавна набавка заведен под број 23-3039/25

Со зборови осум милиони седумстотини четириесет и осум илјади MKD 00/100

Основица	8.748.000,00
ДДВ	0,00
Вкупно MKD	8.748.000,00

ДАНОЧНИ СТАПКИ	Основа	ДДВ	Вредност
	8.748.000,00	0,00	8.748.000,00

Рокот за исполнување на паричните обврски започнува да тече од датумот на испратницата.
За ненавремено плаќање пресметуваме законска камата.
Во случај на девалвација се пресметува курсот на еврото на денот на наплатата.

При плаќање со налог за плаќање наведете во повикување 20-390-000549.

Фактурирал



Овластено лице за потпишување
на фактурата:
Zoran Strahilov



ISO 14001
U-C (Certification)



Република Северна Македонија

Министерство за здравство

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Бр.-Nr. 13-3039/25

05.05: 20 20 год.-viti

СКОПЈЕ - SHKUP

Врз основа на одредбите од член 2-б, став 1 и 2 од Уредбата со законска сила за изменување и дополнување на уредбата со законска сила за примена на Законот за данокот на додадена вредност во време на вонредна состојба (Службен Весник на Република Северна Македонија бр. 102/20), а во врска со член 3 од Договорот за набавка на работи - монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија во Република Северна Македонија, бр. 23-3039/25 од 13.04.2020 година, Министерот за здравство ја дава следната:

Изјава

Во име на буџетскиот корисник – Министерство за здравство, изјавувам под целосна кривична и материјална одговорност дека прометот по основ на горе наведениот договор се плаќа со донирани финансиски средства и од тие причини потребно е да се ослободи од данок на додадена вредност, затоа што прометот на добра во конкретниов случај е извршен кон Министерството за здравство заради справување со Коронавирусот COVID 19.

Оваа Изјава ја издавам за потребите на економскиот оператор со кој е склучен Договорот за набавка на работи - монтажни контејнери за потребите на здравствениот систем и согласно планот на Министерство за здравство за справување со состојбата од настаната епидемија во Република Северна Македонија, бр. 23-3039/25 од 13.04.2020 година.

Подготвил: Сандра Веловска
Одобрил: Вања Андонова



Министер,
Д-р. Вања Андонова
СКОПЈЕ - SHKUP

Примил 05.05.2020
Кристијан Јанов
